



REPUBLIKA E SHQIPËRIË  
MINISTRIA E FINANCAVE  
DHE EKONOMISË

**2021**

# Raporti Vjetor i Përmbledhur

*Performanca e Kontratave të Koncesionit dhe të Partneritetit  
Publik Privat*



---

Ky raport përfshin pasqyrimin dhe raportimin e ecurisë dhe performancës financiare dhe jofinanciare të Kontratave të Koncesionit dhe Partneritetit Publik Privat në Republikën e Shqipërisë sipas raportimeve dhe informacionit që përcjellin Autoritetet Kontraktuese për vitin 2021.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

*Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr.3, Tiranë, 1000, Shqipëri*

---

## TABELA

Përmbledhje .....	6
1. Trendi i projekteve të koncesioneve dhe partneritetit publik privat në Shqipëri .....	8
2. Prezantim i ecurisë së Kontratave Koncesionare/PPP në Shqipëri .....	14
• SEKTORI I TRANSPORTIT .....	14
1. Kontrata Koncesionare/PPP “Për ndërtimin, përmirësimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e autostradës Milot-Morinë” .....	14
2. Kontrata Koncesionare/PPP “Për ndërtimin, përmirësimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e Rrugës së Arbrit” .....	14
3. Kontrata e koncesionit/PPP “Për projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e segmentit rrugor “Milot Balldren” .....	17
4. Kontrata e koncesionit/PPP “Për projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugës “Porti i Jahteve- By Pass Orikum Dukat (Ura e Shën Elizës)” .....	17
5. Kontrata Koncesionare/PPP “Ndërtimi, vënia në punë, operimi dhe mirëmbajtja e aeroportit ‘Nënë Tereza’ .....	18
6. Kontratë Koncesioni /PPP “Për rehabilitimin, operimin, transferimin e aeroportit të Kukësit” .....	20
7. Kontratë Koncesionit/PPP “Për Menaxhimin, Operimin dhe Mirëmbajtjen e Terminalit të trageteve të Portit të Durrësit” .....	20
8. Kontratë Koncesioni/PPP “Për operimin, menaxhimin dhe mirëmbajtjen e Terminalit Lindor në Portin e Durrësit” .....	21
9. Kontratë Koncesionit/PPP “Për Rehabilitimin, Operimin dhe Transferimin e Infrastrukturës Hekurudhore Fier-Ballsh, Fier Vlorë” .....	22
• SEKTORI I MJEDISIT .....	23
10. Kontrata Koncesionare/PPP “Për Ndërtimin e Landfillit, Inceneratorit dhe rehabilitimin e Venddepozitimeve ekzistuese, Tiranë” .....	23
11. Kontrata Koncesionare/PPP “Për ndërtimin e administrimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut Fier dhe prodhimin e Energjisë” .....	25
12. Kontrata Koncesionare/PPP “Ndërtimi, operimi dhe transferimi e inceneratorit për përpunimin e mbetjeve urbane të Bashkisë së Elbasanit” .....	26
13. Kontrata Koncesionare/PPP “Për dhënie me koncesion/PPP të shërbimit të pastrimit, grumbullimit, transportimit, dhe seleksionimit të mbetjeve urbane të Bashkisë Kamëz” .....	27
14. Kontratë Koncesioni/PPP “Menaxhimi dhe zhvillimi teknologjik i prodhimit të fidanëve pyjor/arrorë në fidanishten shtetërore të Cërrikut Elbasan” .....	28
15. Kontratë Koncesioni/PPP “Për shfrytëzimin e burimit ujor Sasaj, Bunec” .....	28
• SEKTORI I SHËNDETËSISË .....	29
16. Kontrata Koncesionare/PPP “Për shërbime të integruara për ofrimin e setit të personalizuar të instrumenteve kirurgjikale, furnizimin me material mjekësor steril njëpërdorimësh në sallat kirurgjikale, si dhe trajtimin e mbetjeve me rrezik biologjik dhe dezinfektimin e sallave kirurgjikale” .....	29
17. Kontrata Koncesionare/PPP “Për paketën e shërbimeve të kontrollit mjekësor bazë për grupmoshat 35-70” .....	30
18. Kontratë Koncesioni/PPP “Për ofrimin e shërbimit të hemodializës” .....	31
19. Kontratë Koncesioni/PPP “Për ofrimin e shërbimeve laboratorike mjekësore” .....	32
• SEKTORI I ENERJITIKËS .....	34
20. Kontrata Koncesionare/PPP “Për projektimin, financimin, ndërtimin, pronësinë, shfrytëzimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e Hidrocentralit Ashta” .....	34
21. Kontrata Koncesionare/PPP “Për projektimin financimin, ndërtimin, marrjen në pronësi, shfrytëzimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e projektit të hidrocentralit në lumin Devoll” .....	35
22. Kontratë koncesioni/PPP “Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentraleve Prellë 1 dhe Prellë 2” .....	36
23. Kontratë koncesioni/PPP “Ndërtim, shfrytëzim dhe transferim të Hidrocentraleve Lura 1, 2 dhe 3” .....	37

24. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Bistrica 3 dhe 4” .....	37
25. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Ballenjë” .....	38
26. Kontratë Koncesioni/PPP “Kontratë për ndërtimin, shfrytëzimin dhe transferimin e hidrocentralit Bishnica 1,2” .....	39
27. Kontratë Koncesioni/PPP “Kontratë për ndërtimin, shfrytëzimin dhe transferimin e hidrocentraleve Çekrezë 1 dhe Çekrezë 2” .....	39
28. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi, mirëmbajtja dhe transferimi i hidrocentraleve të kaskadës së lumit Dardhë” .....	40
29. Kontratë koncesioni/PPP “Kontratë për ndërtimin, shfrytëzimin dhe transferimin e hidrocentralit Denas” .....	41
30. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Dobrenje-Tomorrice, në Përroin e Hijes, Skrapar” .....	41
31. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Fterre dhe Fterre 1” .....	42
32. Kontratë Koncesioni/PPP “Kontratë për ndërtimin,shfrytëzimin dhe transferimin e hidrocentralit Hurdhas 1, 2, 3” ....	43
33. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Gavran dhe Gavran 1” .....	43
34. Kontratë koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Kacni” .....	44
35. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Gojan, Gjegjan, Peshqesh, Ura e Fanit, Fangu” .....	45
36. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Kasollet e Selcës” .....	45
37. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Kryezi dhe Kryezi i Epërm” .....	46
38. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi i hidrocentralit, operim dhe transferim i hidrocentralit Lengarica 1 dhe 2” .....	47
39. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi, mirëmbajtja dhe transferimi i hidrocentraleve Murdhar 1 dhe Murdhar 2” .....	47
40. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Rapun 1, Rapun 2” .....	48
41. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Rapun 3, Rapun 3A dhe Rapun 4” ....	49
42. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Sotirë, Sotirë 2” .....	49
43. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Përroi i Trebishit, Bulqizë” .....	50
44. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Vërtop” .....	51
45. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Vlushë” .....	51
46. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Truen” .....	52
47. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Steblevë” .....	53
48. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Shpella Poshtë II dhe Shpella Poshtë III” .....	53
49. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Lumi Zalli i Okshtunit” .....	54
50. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Lumi i Treskës” .....	55
51. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Gostivisht, Langarica 3, Ura e Dashit” ..	55
52. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Shemri dhe Mgullë” .....	56
53. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Sllabinjë” .....	57
54. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Belesova 1 dhe 2” .....	57
55. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Tervol” .....	58
• SEKTORI I KONTROLLIT FISKAL.....	59
56. Kontrata Koncesionare/PPP “Financimi, ngritja dhe operimi i shërbimit të skanimit të konteinerëve e automjeteve të tjera në RSH” .....	59
57. Kontratë Koncesioni/PPP “Për shërbimin e kontrollit ligjor të instrumenteve matëse, nëpërmjet verifikimit të instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe gazit të lëngshëm .....	61
58. Kontrata e Koncesionit/PPP “Për shërbimin e markimit dhe monitorimit të karburanteve” .....	62
59. Kontratë Koncesioni/PPP “Për projektimin, financimin, dizejnimin, prodhimin dhe ngritjen e një sistemi për emetimin, shpërndarjen, gjetjen dhe monitorimin e pullave fiskale e të pullave të kontrollit të barnave” .....	63

• SEKTORI I ZHVILLIMIT URBAN DHE EKONOMIK.....	64
60. KONTRATË KONCESIONI/PPP “PËR PËRMIRËSIMIN E INFRASTRUKTURËS ARSIMORE NË BASHKINË TIRANË –LOTI 1” .....	64
61. Kontratë Koncesioni/PPP “Për përmirësimin e infrastrukturës Arsimore në Bashkinë Tiranë –Loti 4” .....	65
62. Kontratë Koncesioni/PPP “Për dhënien me koncesion të aktivitetit të Regjistrimit të Barrëve Siguruese” .....	65
63. Kontratë Koncesioni/PPP “Për dhënien me koncesion të aktivitetit të prodhimit të kripës në Nartë, Vlorë” .....	66
• SEKTORI I BUQËSISË.....	67
64. Kontratë koncesioni/PPP “Për dhënien me koncesion të sipërfaqes deri në 1000 ha, në komunat Synej, Luz i Vogël, Kryevindh dhe Gosë, Kavajë për kultivimin e ullirit” .....	67
SEKTORI I PUNËVE TË BRENDSHME .....	68
65. Kontratë koncesioni/PPP “Për prodhimin dhe shpërndarjen e kartave të identitetit dhe pasaportave biometrike” .....	68
3. Lista e Kontratave të Koncesionit për vitin 2021 .....	70
Aneks 1- Koncepte dhe Kuadri Ligjor .....	77
1.1 Koncepti i Koncesioneve dhe Partneritetit Publik Privat .....	77
1.2 Kuadri Ligjor i Koncesioneve/PPP në Republikën e Shqipërisë .....	79

## Lista e Figurave

Figura 1:Trendi i projekteve Koncesionare/PPP të nënshkruara ndër vite, 2004-2021.....	8
Figura 2:Pesha kumulative e investimit për projektet me Koncesion/PPP në PBA, 2004-2021 .....	9
Figura 3:Projekte Koncesion/PPP të kerkuara dhe të pakërkuara (%) .....	9
Figura 4:Numri i kontratave koncesionare/PPP të miratuara për perjudhat 2004-2013 dhe 2014-2021 .....	10
Figura 5:Numri i kontratave Koncesionare/PPP sipas Autoritetit Kontraktues që ka nënshkruar kontratën .....	10
Figura 6: Numri dhe vlera totale e investimit (në Lek) të projekteve Koncesionare/PPP aktive sipas sektorve, 2021 .....	11
Figura 7: Përpjesa e pagesave buxhetore ndaj totalit të të ardhurave tatimore të vitit paraardhës buxhetor.....	12
Figura 8: Pagesat buxhetore për kontratat me mbështetje buxhetore .....	13

## Lista e Tabelave

Tabela 1: Pagesat buxhetore për projektin “Milot-Morinë” .....	15
Tabela 2: Të ardhurat nga tarifat e përdoruesve të rrugës “Milot-Morinë” .....	15
Tabela 3: Pagesat buxhetore për projektin “Rruga e Arbrit” .....	16
Tabela 4: Vlera e investimit “Rruga e Arbrit” .....	16
Tabela 5: Pagesat Buxhetore për projektin “Rruga Orikum - Dukat” .....	17
Tabela 6: Vlera e investimit “Rruga Orikum – Dukat” .....	18
Tabela 7: Numri i pasagjerëve ndër vite për projektin “Tirana International Airoport” .....	19
Tabela 8: Volumi fizik i mallrave (në ton) për projektin e Terminalit Lindor në Portin e Durrësit” .....	21
Tabela 9: Pagesat e tarifës për ton mbetje për projektin “Inceneratori i Tiranës <sup>1</sup> ”/MIE/Bashkia Tiranë .....	24
Tabela 10: Pagesat Buxhetore për projektin “Inceneratori i Fierit” .....	25
Tabela 11: Pagesat Buxhetore për projektin “Inceneratori i Elbasani” .....	26
Tabela 12: Pagesat Buxhetore për projektin “Setet Kirugjikale” .....	29
Tabela 13:Nurmri i përfituesve të kontrollit mjeksor bazë – “Check – Up” .....	30
Tabela 14: Pagesat Buxhetore për projektin “Kontrolli mjeksor bazë Check – Up” .....	30
Tabela 15: Pagesat Buxhetore për projektin “Shërbimi hemodializës” .....	31
Tabela 16: Numri i përfituesve dhe seancave të realizuara nga projekti “Shërbimi hemodializës” .....	32
Tabela 17:Pagesat buxhetore për projektin “Për ofrimin e shërbimeve laboratorike mjeksore” .....	33
Tabela 18: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit) .....	35
Tabela 19: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit) .....	35
Tabela 20: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit) .....	36

<sup>1</sup> Burimi: Ministria e Financës dhe Ekonomisë nëpërmjet Drejtorisë së Buxhetit si dhe raportimeve nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Bashkia Tiranë

<i>Tabela 21: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit) .....</i>	<i>37</i>
<i>Tabela 22: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit) .....</i>	<i>38</i>
<i>Tabela 23: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit) .....</i>	<i>38</i>
<i>Tabela 24: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit) .....</i>	<i>39</i>
<i>Tabela 25: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit) .....</i>	<i>40</i>
<i>Tabela 26: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit) .....</i>	<i>40</i>
<i>Tabela 27: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit) .....</i>	<i>41</i>
<i>Tabela 28: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit) .....</i>	<i>42</i>
<i>Tabela 29: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit) .....</i>	<i>42</i>
<i>Tabela 30: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit) .....</i>	<i>43</i>
<i>Tabela 31: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit) .....</i>	<i>44</i>
<i>Tabela 32: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit) .....</i>	<i>44</i>
<i>Tabela 33: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit) .....</i>	<i>45</i>
<i>Tabela 34: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit) .....</i>	<i>46</i>
<i>Tabela 35: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/vit).....</i>	<i>46</i>
<i>Tabela 36: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit) .....</i>	<i>47</i>
<i>Tabela 37: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit) .....</i>	<i>48</i>
<i>Tabela 38: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit) .....</i>	<i>48</i>
<i>Tabela 39: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit) .....</i>	<i>49</i>
<i>Tabela 40: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit) .....</i>	<i>50</i>
<i>Tabela 41: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit) .....</i>	<i>50</i>
<i>Tabela 42: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit) .....</i>	<i>51</i>
<i>Tabela 43: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit) .....</i>	<i>52</i>
<i>Tabela 44: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit) .....</i>	<i>52</i>
<i>Tabela 45: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit) .....</i>	<i>53</i>
<i>Tabela 46: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit) .....</i>	<i>54</i>
<i>Tabela 47: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit) .....</i>	<i>54</i>
<i>Tabela 48: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit) .....</i>	<i>55</i>
<i>Tabela 49: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit) .....</i>	<i>56</i>
<i>Tabela 50: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit) .....</i>	<i>56</i>
<i>Tabela 51: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit) .....</i>	<i>57</i>
<i>Tabela 52: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit) .....</i>	<i>58</i>
<i>Tabela 53: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit) .....</i>	<i>58</i>
<i>Tabela 54: Pagesat buxhetore për projektin “Skanimi i Doganave” .....</i>	<i>59</i>
<i>Tabela 55: Numri i skanimeve ndër vite.....</i>	<i>60</i>
<i>Tabela 56: Numri i inspektimeve të instrumentave matës .....</i>	<i>61</i>

## Përmbledhje

Raporti Vjetor i Përmbledhur është një dokument që hartohet çdo vit nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë nëpërmjet Drejtorisë së Koncesioneve dhe paraqet një pamje të përgjithshme të performancës dhe ecurisë financiare dhe jo financiare ndër vite të kontratave koncesionare/PPP sipas sektorëve specifikë si: transporti, shëndetësia, energjika, mjedisi dhe kontrolli fiskal.

Qëllimi i këtij raporti është të sigurojë një informacion të përmbledhur në lidhje me ecurinë dhe performancën e kontratave të Koncesioneve/PPP-ve në Republikën e Shqipërisë, në kuadër të përmirësimit të transparencës me publikun dhe publikohet në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr. 125/2013 *“Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”*, i ndryshuar.

Me qëllim rritjen e transparencës mbi zbatimin e koncesioneve/PPP, forcimin e disiplinës financiare, monitorimin e risqeve fiskale dhe buxhetore që burojnë nga kontratat e koncesionit/PPP, me anë të Ligjit Nr.50 datë 18.07.2019 *“Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 125/2013 “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”* i ndryshuar, u miratuan disa ndryshime të cilat kanë përforcuar rolin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë në monitorimin e zbatueshmërisë së projekteve të Koncesionit/PPP në këndvështrimin e implikimeve financiare. Në këtë kuadër, përpara miratimit të këtyre ndryshimeve nga ana e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë në muajin Mars të vitit 2019, filloi për herë të parë procesi i monitorimit të kontratave të koncesionit/PPP dhe raportimit nga Autoritetet Kontraktuese, në zbatim të paragrafit të dytë të pikës 121, seksioni IV të Udhëzimit plotësues nr. 1 datë 17.01.2019 *“Për zbatimin e Buxhetit të vitit 2019”*. Me miratimin e ndryshimeve të ligjit *“Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”*, raportimi në lidhje me ecurinë e zbatimit të kontratave koncesionare/PPP nga Autoritetet Kontraktuese bëhet në zbatim dhe sipas formateve të përcaktuara në Udhëzimin e Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 35, datë 12.12.2019.

Bazuar në pikën 7 të nenit 10 të Ligjit Nr. 125/2013 *“Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”* i ndryshuar, Raporti Vjetor i Përmbledhur përgatitet dhe publikohet një herë në vit dhe është pjesë si aneks i raportit vjetor të zbatimit të buxhetit, në përputhje me legjislacionin në fuqi për menaxhimin e sistemit buxhetor dhe kuadrin ligjor për koncesionet/PPP. Raporti Vjetor i Përmbledhur për vitin 2021 do të paraqesë një pamje të përgjithshme të portofolit aktual të Koncesioneve/PPP, performancën e kontratave koncesionare, informacion në lidhje me ecurinë e investimit dhe zbatimit, ecurinë e pagesave buxhetore të parashikuara dhe të realizuara, si dhe risqet që rrjedhin nga këto kontrata koncesioni/PPP, nëse janë materializuar apo jo, ndikimin në buxhetin e shtetit dhe probabilitetin që kanë për të ndodhur.

Njësitë përgjegjëse të cilat janë edhe aktorët kryesorë në monitorimin dhe raportimin e ecurisë së zbatimit të kontratave të koncesionit/PPP-ve janë: Autoritetet Kontraktuese dhe njësitë brenda Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, përgjegjëse për përgatitjen e raportit vjetor të përmbledhur mbi ecurinë e zbatimit të kontratave të koncesionit/PPP, si dhe ATRAKO. Nisur nga kompleksiteti i kontratave të koncesionit/PPP, forcimi i kuadrit ligjor të monitorimit të të gjitha kontratave të koncesionit/PPP dhe forcimit të kapaciteteve monitoruese, në vijim ky raport mund të pësojë ndryshime me qëllim përmirësimin e përmbajtjes së tij.

Për vitin 2021 në Republikën e Shqipërisë rezultojnë 228 kontrata koncesioni/PPP të nënshkruara. Në bazë të raportimeve të bëra deri tani nga Autoritetet Kontraktuese në këtë raport janë përshkruar 65 Kontrata Koncesioni/PPP, të cilat përfshihen në sektorin e Transportit, Energjisë, Zhvillimit Urban, Zhvillimit Ekonomik, Kontrollit Fiskal, Mjedisit dhe Shëndetësisë.

## Hyrje

Ky raport prezanton një informacion të përmbledhur mbi ecurinë dhe zbatueshmërinë e kontratave të koncesionit/PPP në Republikën e Shqipërisë, bazuar në raportimet periodike të Autoriteteve Kontraktuese pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë lidhur me risqet fiskale dhe implikimet buxhetore për vitin 2021. Këto raportime janë realizuar duke u bazuar në/dhe sipas formateve të përcaktuara në Udhëzimin e Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 35, datë 12.12.2019, i cili është një Udhëzim që përcakton rregullat standarde, procedurat, afatet që duhet të ndiqen në procesin e raportimit dhe monitorimit të ecurisë dhe performancës financiare dhe jo financiare të kontratave të koncesionit/PPP nga të gjitha Autoritetet Kontraktuese.

Objekt i RVP-së janë të gjitha kontratat e koncesionit/PPP të lidhura në bazë të Ligjit nr. 7973, datë 26.7.1995 “Për koncesionet dhe pjesëmarrjen e sektorit privat në shërbimet publike dhe infrastrukturë”, Ligjit nr. 9663, datë 18.12.2006, “Për Koncesionet”, Ligji nr. 125/2013, “Për Koncesionet dhe Partneritetin Publik Privat”, si dhe të gjitha kontratat e tjera të publikuara në Regjistrin e Koncesioneve në faqen zyrtare të ATRAKO-s. Në total, në Shqipëri deri në vitin 2021 rezultojnë të nënshkruara 228 kontrata koncesionare, nga të cilat 214 janë pa mbështetje buxhetore dhe 14 me mbështetje buxhetore.

Megjithatë, duke qenë se procesi i monitorimit është ende në fillimet e tij, numri dhe kompleksiteti i kontratave të koncesionit/PPP të lidhura në Republikën e Shqipërisë është i lartë, si dhe jo çdo kontratë ka të përcaktuar Njësi Zbatimi Projekti përgjegjëse për monitorimin e saj, mbledhja e informacionit ka hasur vazhdimisht vështirësi dhe për rrjedhojë ky raport do të përcjellë informacion për 65 kontrata koncesioni/PPP.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë po punon në mënyrë të vazhdueshme dhe këmbëngulëse duke u kërkuar Autoriteteve Kontraktuese angazhim dhe përgjegjshmëri maksimale me qëllim sigurimin e një procesi monitorimi sa më efektiv, gjithëpërfshirës dhe transparent, në përputhje me përcaktimet e ligjit nr. 125/2013 “Për Koncesionet dhe Partneritetin Publik Privat”, i ndryshuar.

Në këtë kuadër, si dhe në zbatim të përcaktimeve të pikës 5 të nenit 10 të ligjit nr. 125/2013 “Për Koncesionet dhe Partneritetin Publik Privat”, i ndryshuar, Ministria e Financave dhe Ekonomisë gjatë vitit 2021 ka dhënë rekomandime për Autoritetet Kontraktuese me qëllim marrjen e masave nga ana e tyre për përmirësimin e performancës në ofrimin e shërbimeve dhe punëve publike, objekt i kontratave të koncesionit fushë e tyre e përgjegjësisë, si dhe për minimizimin apo eliminimin e risqeve të drejtpërdrejta e të tërthorta që ndikojnë në buxhetin e shtetit.

Gjithashtu, i është kërkuar çdo Autoriteti Kontraktues që të ngrëjë struktura monitoruese për çdo kontratë koncesioni edhe kur kontrata specifike nuk e përcakton një strukturë të tillë, me qëllim që informacioni i raportuar pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë të jetë i plotë, gjithëpërfshirës dhe në përputhje me përcaktimet ligjore.


## 1. Trendi i projekteve të koncesioneve dhe partneritetit publik privat në Shqipëri.

Pas viteve 2000, pati një kërkesë të madhe të aplikimit të koncesioneve dhe partneritetit publik privat nga qeveria shqiptare, me qëllim financimin e investimeve publike dhe ndërtimin e infrastrukturës publike.

Në figurën 1, është paraqitur ecuria ndër vite e kontratave koncesionare/PPP të miratuara në R.Sh, që nga viti 2004. Një ndër projektet më të rëndësishme me impakt të gjerë të kësaj periudhe konsiderohet projekti i koncesionit “Për ndërtimin e terminalit të ri në Aeroportin ‘Nënë Tereza’”, i miratuar në vitin 2004.

Më pas, gjatë viteve 2005-2013, në kuadër të privatizimit të HEC-eve vendore<sup>2</sup>, një numër hidrocentralesh të vegjël u privatizuan dhe disa të tjerë iu dhanë kompanive të huaja dhe vendase përmes kontratave koncesionare të llojit ROT, BOT dhe BOO. Këto kontrata kanë pasur si qëllim rehabilitimin e HEC-eve ekzistuese, operimin e tyre dhe më pas transferimin tek shteti. Njëkohësisht, me synim rritjen e kapacitetit prodhues energjistik të ekonomisë shqiptare janë nënshkruar një numër i konsiderueshëm kontratash për ndërtimin e HEC-eve të reja në burime hidrike të pashfrytëzuara. Pas vitit 2013, janë nënshkruar në total 52 kontrata koncesionare/PPP në sektorë me impakt të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik dhe në sigurimin e rritjes së qëndrueshme ekonomike si në sektorin e arsimit, shëndetësisë, mjedisit dhe në kontrollin fiskal.

❖ **Figura 1: Trendi i projekteve me Koncesioneve/PPP të nënshkruara ndër vite, 2004-2021**

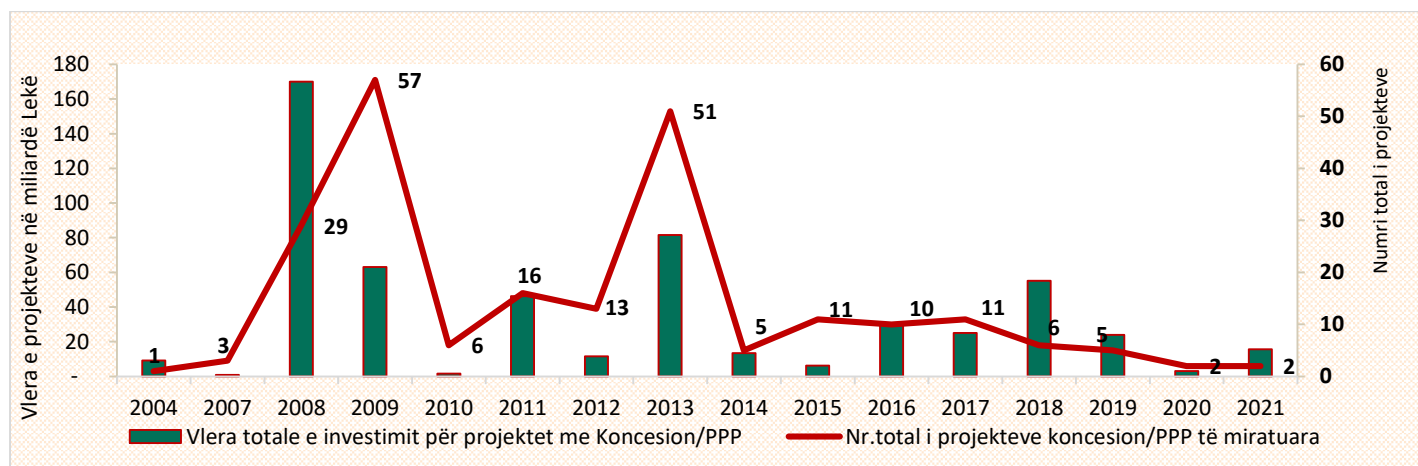


❖ **Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, ATRAKO (2022)**

Sikurse është paraqitur në figurën 2, pesha kumulative e investimit për projektet me koncesion/PPP ndaj PBB-së ka patur tendencë rritëse ndër vite, e cila kulmon në vitin 2020 me një peshë kumulative prej 34% ndaj PBB. Për vitin 2021 ky portofol ka pësuar ulje dhe përbën rreth 31% të PBB-së dhe kjo vjen si pasojë e rritjes së vlerës së PBB nominal paraprak për vitin 2021.

<sup>2</sup> Ligji nr.8527, datë 23.9.1999 “Për privatizimin e hidrocentraleve vendore”.

❖ **Figura 2: Peshë kumulative e investimit për projektet me koncesion/PPP në PBB, 2004-2021**

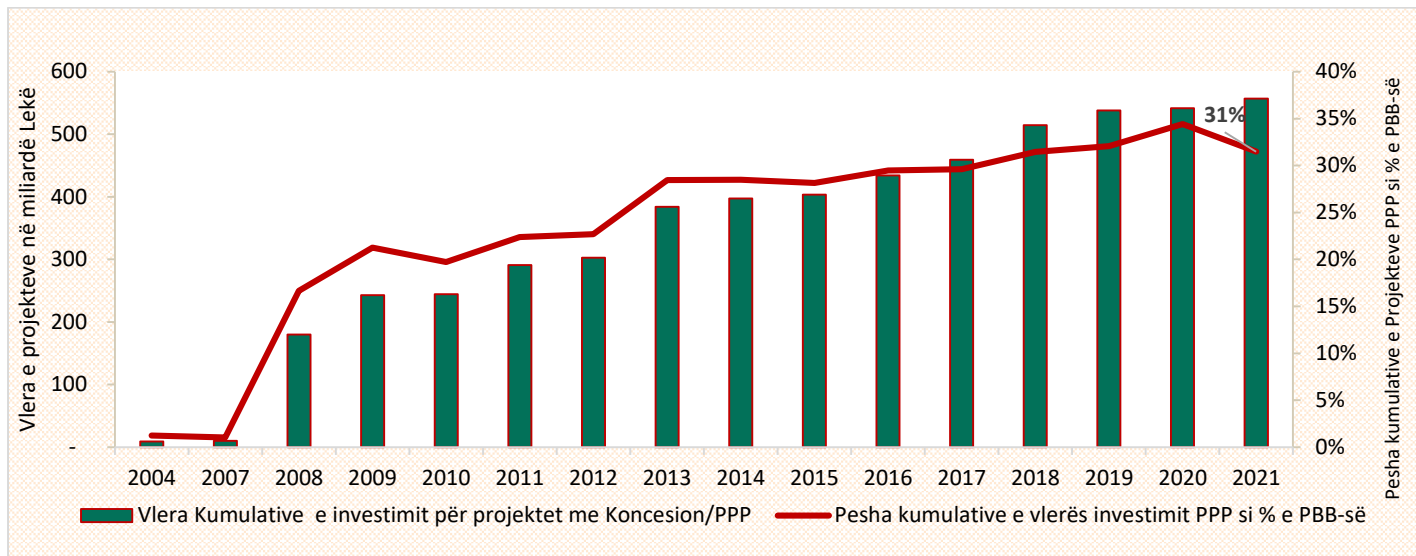


\*Për vitin 2021 është marrë në konsideratë vlera e PBB nominale paraprake

**Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, ATRAKO (2022)**

Për sa i përket formës së kërkuar të koncesioneve dhe partneritetit publik privat (shih figura 3), 13 % e kontratave të miratuara në total janë propozime të kërkuara nga autoritetet kontraktuese, në kuadër të një procedure përzgjedhëse konkurruese. Ndërsa pjesa tjetër e kontratave të miratuara janë propozime të pakërkuara që u janë ofruar autoriteteve kontraktuese në fusha të ndryshme me qëllim ofrimin e një shërbimi/pune nëpërmjet një teknologjie të avancuar.

❖ **Figura 3: Projekte Koncesion/PPP të kërkuara dhe të pakërkuara (%)**

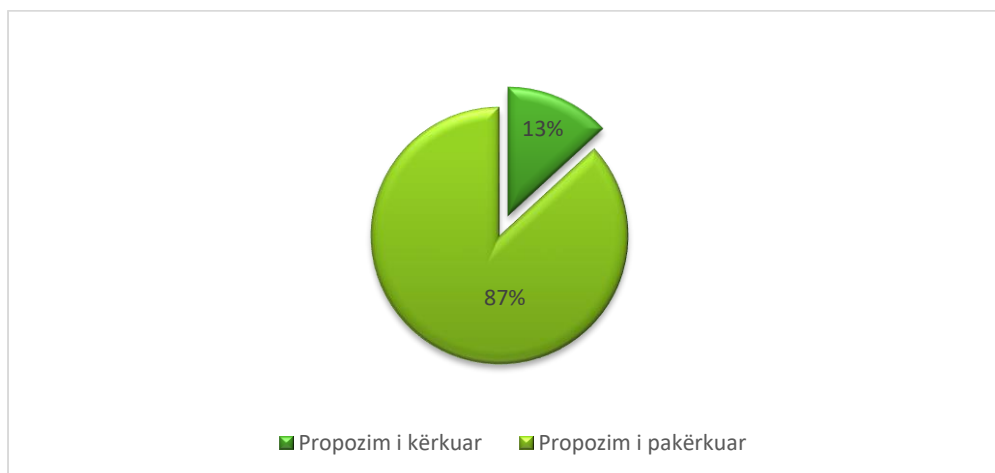


**Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, ATRAKO (2022)**

Nga viti 2013, numri i projekteve të kërkuara nga autoritetet kontraktuese është rritur, tregues ky i fundit i rregullimit të pjesëmarrjes së sektorit privat në ofrimin e shërbimeve/punëve publike. Gjithashtu, me hyrjen në fuqi të Ligjit Nr. 50 datë 18.07.2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 125/2013 “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, është kufizuar pranimi i propozimeve të pakërkuara vetëm në porte, aeroporte dhe sektorin e energjisë dhe janë hequr propozimet e pakërkuara në të gjitha fushat e tjera të dhënies me koncesion/PPP që përcakton Ligji Nr. 125/2013, i ndryshuar.

Referuar figurës 4, numri total i kontratave koncesionare/PPP të miratuara për periudhën 2004-2013 shënon vlerën 176 në total, ndërsa gjatë periudhës 2014-2021 janë miratuar 52 kontrata koncesionare/PPP ose 70 % më pak krahasuar me periudhën 2004-2013.


❖ **Figura 4: Numri total i kontratave koncesionare/PPP të miratuara për periudhat 2004-2013 dhe 2014-2021**

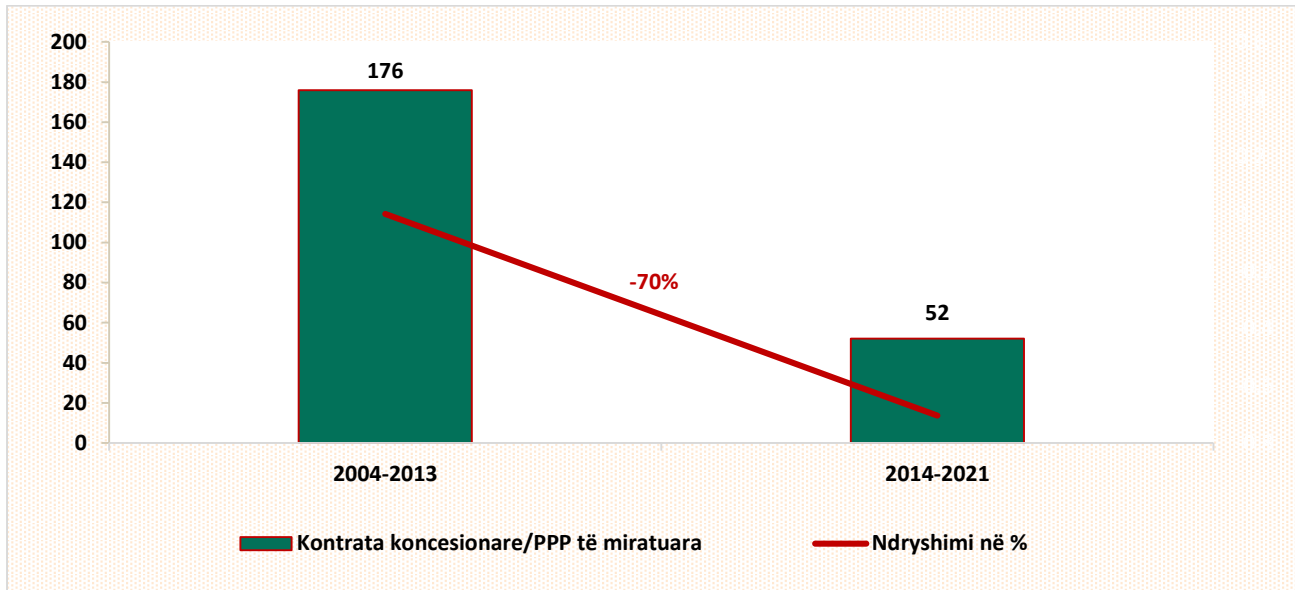

❖ **Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, ATRAKO, (2022)**

Në total, numri i kontratave të koncesioneve/PPP të miratuara në R.Sh deri në vitin 2021 shënon 228 kontrata, por 5 prej tyre janë zgjidhur, si rezultat numri aktual i kontratave të koncesionit/PPP është 223. Numri më i madh i tyre ka si Autoritet Kontraktues Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, me 206 kontrata koncesionare/PPP (shih Figura 5). Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale është Autoritet Kontraktues në 4 kontrata koncesionare në fushën e shëndetësisë, Ministria e Financave dhe Ekonomisë është Autoritet Kontraktues në 6 kontrata koncesionare në fushën e kontrollit fiskal dhe në fushën e zhvillimit ekonomik, Bashkia e Tiranës është Autoritet Kontraktues në 3 kontrata koncesionare, ndërsa Ministrinë e tjera të linjës dhe Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore kanë në fushën e tyre të përgjegjësisë nga 1 kontratë koncesioni/PPP respektivisht secila, sipas figurës së mëposhtme.


❖ **Figura 5: Numri i kontratave Koncesionare/PPP sipas Autoritetit Kontraktues që ka nënshkruar kontratën**

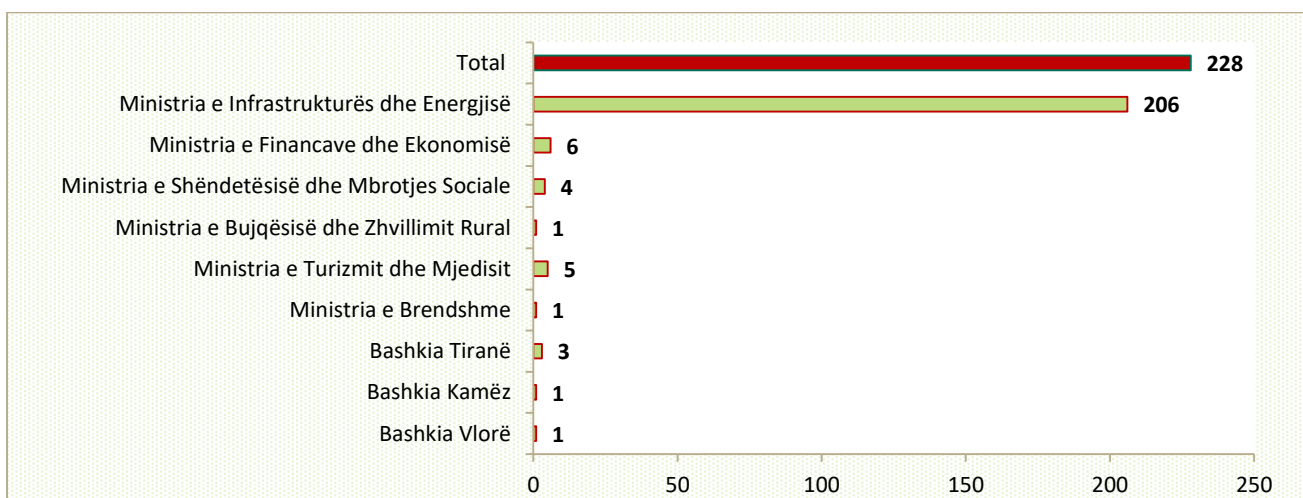

❖ **Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, ATRAKO, (2022)**

Referuar figurës 6, sektori që ka peshën më të madhe të kontratave në numër dhe në vlerë është sektori i energjisë me 186 kontrata nga të cilat 3 janë zgjidhur dhe kanë një vlerë totale prej 415,2 miliardë Lekësh.

❖ **Figura 6: Numri dhe vlera totale e investimit (në Lekë) të projekteve Koncesionare/PPP aktive sipas sektorëve, 2021**

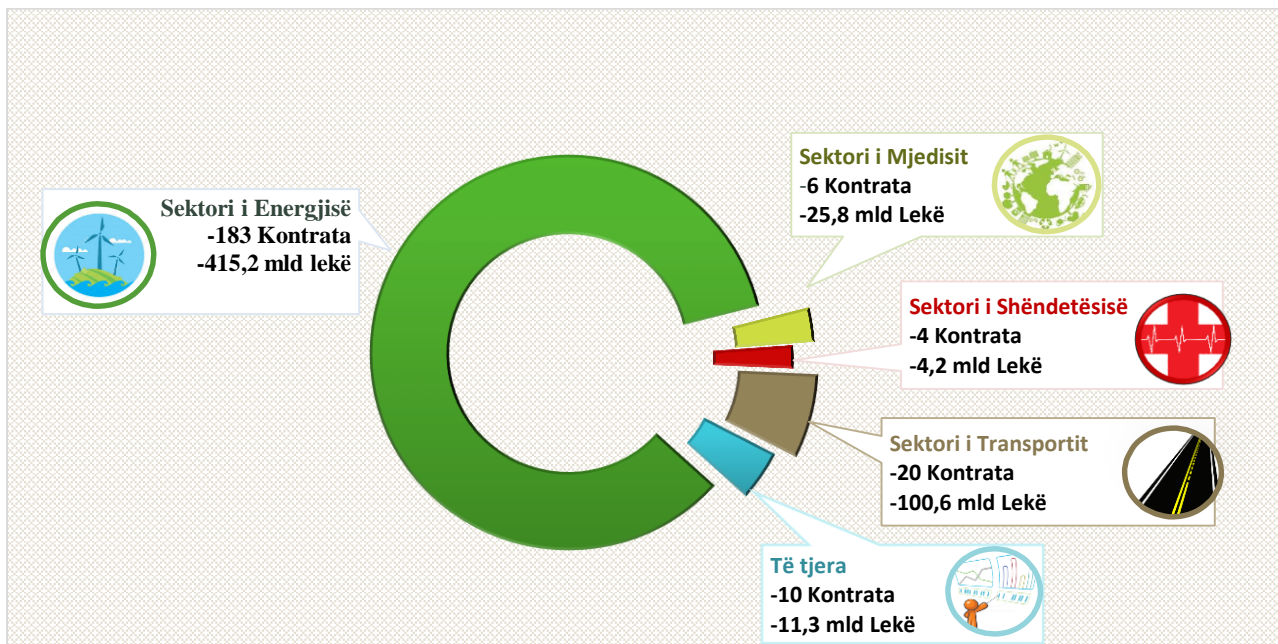


*Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, ATRAKO, (2022)*

Sektori i dytë me peshë më të madhe përta i përket vlerës së kontratave është sektori i transportit, me 20 kontrata gjithsej me vlerë totale 100.6 miliardë Lekë. Ndërkohë sektori i mjedisit ka në total 6 kontrata me vlerë 25.8 miliardë Lekësh të cilat konsistojnë në ngritjen e sistemit të përpunimit të mbetjeve, menaxhimin e pyjeve, si dhe shfrytëzimin e burimeve ujore. Përta i përket sektorit të shëndetësisë, në total janë miratuar 4 kontrata koncesionare/PPP me vlerë prej 4.2 miliardë Lekësh. Ndërsa, në kategorinë 'Të tjera', janë përfshirë në total 10 kontrata koncesionare me vlerë 11.3 miliardë Lekë të shpërndara në sektorin e bujqësisë, sektorin e kontrollit fiskal, sektorin e zhvillimit ekonomik dhe urban.

Përta i përket llojit të mbështetjes financiare nga sektori publik në total janë 14 kontrata koncesionare/PPP me mbështetje buxhetore apo rreth 6% e totalit të kontratave. Ndërsa kontratat pa mbështetje buxhetore janë në total 214 të tilla.

Referuar figurës 7 përpjesa e pagesave buxhetore ndaj totalit të të ardhurave tatimore të vitit paraardhës buxhetor, ka rezultuar 2.9 % për vitin 2021 nën kufirin maksimal të rregullit fiskal prej 5%. Gjithashtu në bazë të pagesave buxhetore të planifikuara ky tregues parashikohet të jetë në rënie edhe për vitet në vijim nën kufirin maksimal të rregullit fiskal.


**Figura 7: Përpjesa e pagesave buxhetore ndaj totalit të të ardhurave tatimore të vitit paraardhës buxhetor**

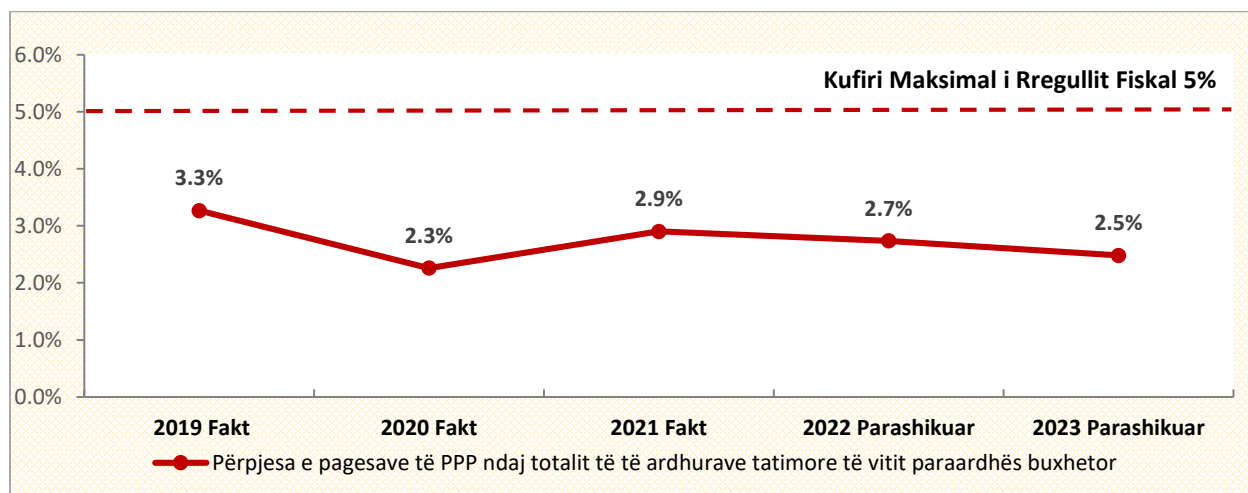

*Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë (2022)*

Ndërsa nëse i referohemi, figurës 8 mbi pagesat buxhetore për kontratat koncesionare/PPP me mbështetje buxhetore, në vitin 2021 vihet re se janë realizuar rreth 11.4 miliardë Lekë pagesa buxhetore.

**Figura 8: Pagesat buxhetore për kontratat me mbështetje buxhetore**

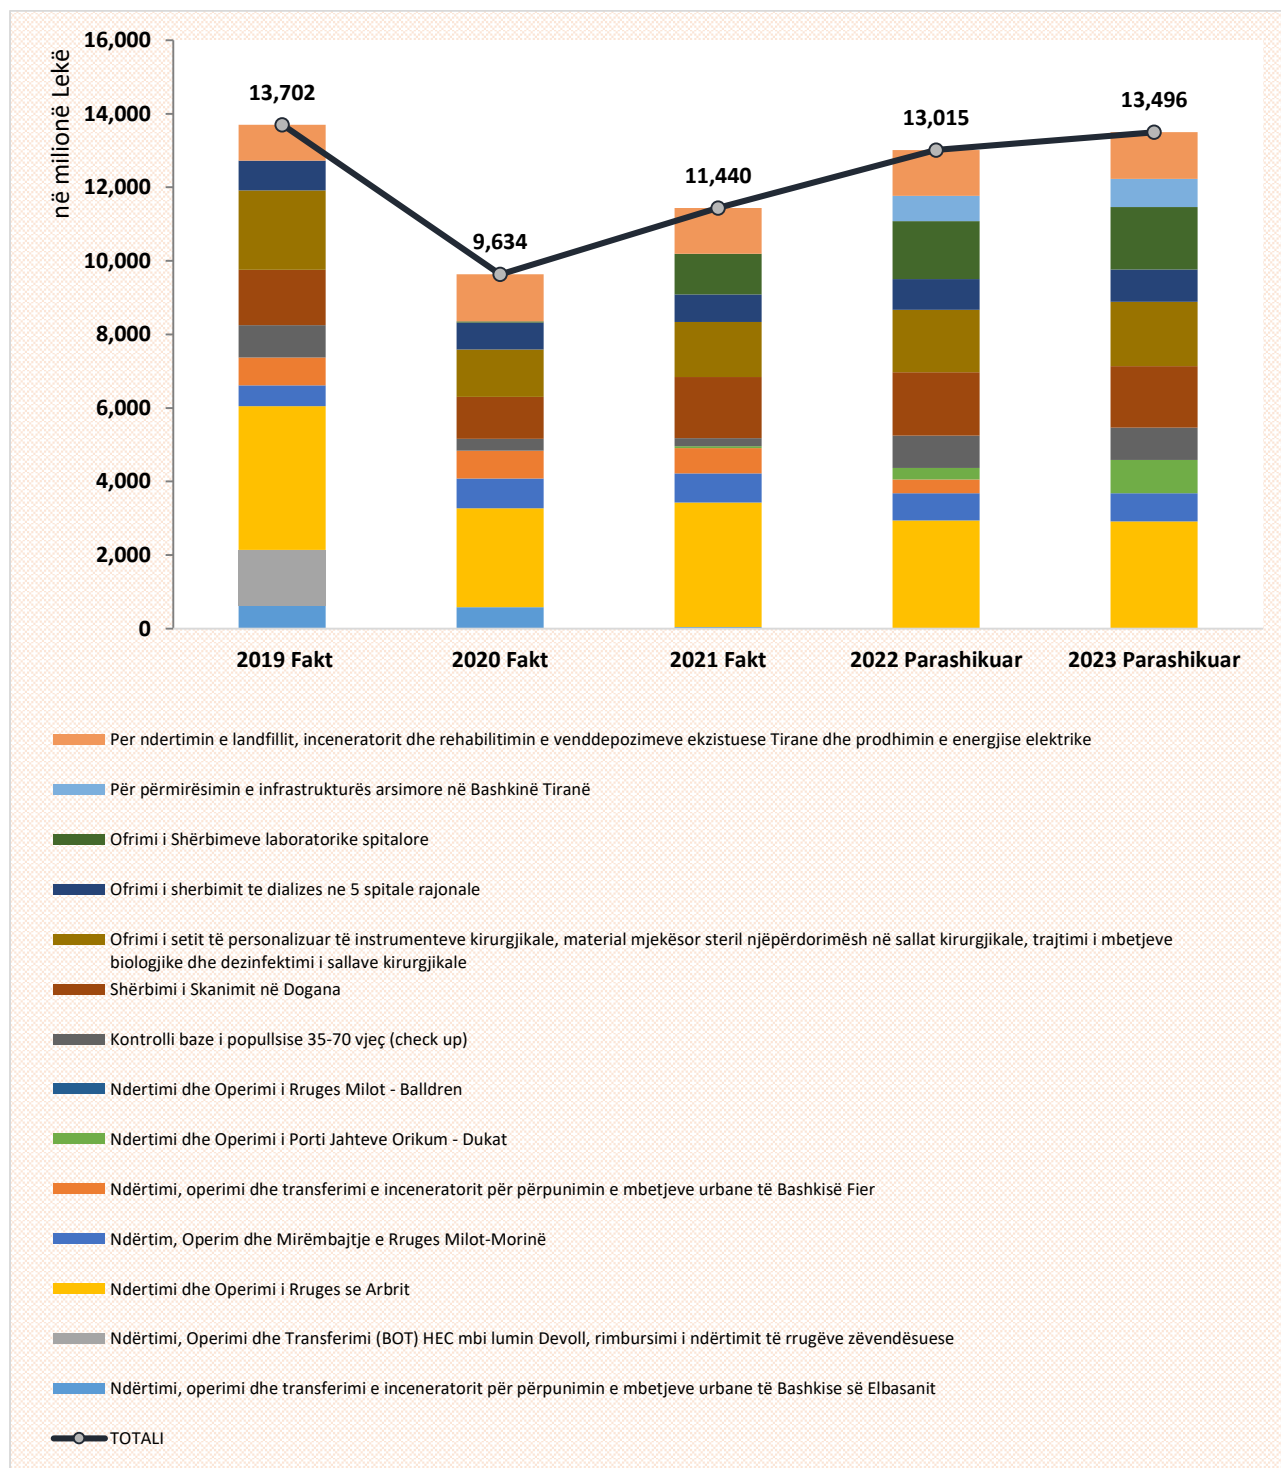

*Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë (2022)*

## 2. Prezantim i ecurisë së Kontratave Koncesionare/PPP në Shqipëri

Në total në Shqipëri deri në vitin 2021 rezultojnë 223 kontrata koncesionare aktive në sektorin e transportit, energjisë dhe gazit, mjedisit, zhvillimit urban, zhvillimit ekonomik, shëndetësisë dhe kontrollit fiskal. Në vijim të këtij materiali jepet përshkrimi për ecurinë e kontratave të klasifikuara sipas sektorëve.

### SEKTORI I TRANSPORTIT

Ky sektor është një nga sektorët që zë një pjesë të rëndësishme përsa u përket kontratave të koncesionit/PPP, si në fushën e transportit rrugor ashtu edhe në fushën e transportit ajror dhe detar, ku një pjesë e konsiderueshme e tyre aktualisht ndodhen në fazën e operimit. Megjithatë vlen të theksohet se Qeveria e Shqipërisë me qëllim rritjen dhe zhvillimin e mëtejshëm të ekonomisë kombëtare, në vitin 2017 inicioi programin ‘*One Billion Project Financing Program*’ i cili u fokusua në implementimin e projekteve në infrastrukturë dhe turizëm me impakt të madh social dhe ekonomik. Në kuadër të këtij programi është investuar në ndërtimin e akseve rrugore me rëndësi kombëtare për zhvillimin ekonomik, nga të cilat në këtë raport referuar informacioneve të përcjella nga autoriteti përgjegjës, janë përzgjedhur për t’u prezantuar kontratat si më poshtë:

#### 1. Kontrata Koncesionare/PPP “Për ndërtimin, përmirësimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e autostradës Milot-Morinë”<sup>3</sup>

Objekti i kontratës koncesionare/PPP është përmirësimi i Autostradës “Milot-Morinë”, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja efikase e saj nga ana e shoqërisë koncesionare, sipas një pakete të paracaktuar të standardeve të performancës. Data efektive e kontratës është data 09.09.2017.

Sipas raportimeve dhe konfirmimit të Autoritetit Kontraktues, aktualisht projekti është në fazën e ndërtimit dhe të operimit. Deri në fund të vitit 2021 janë realizuar 105.9% të investimeve kapitale. Sipas raportimeve shoqëria koncesionare vazhdon të realizojë punimet e mirëmbajtjes së autostradës “Milot-Morinë”, si dhe punime përmirësuese të komponentëve të ndryshëm përgjatë autostradës me qëllim rritjen e nivelit të sigurisë.

- **Autoriteti Kontraktues:** Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë.
- **SPV:** “Albania Highway Concession Company”
- **Vlera e Investimit:** 5,3 miliardë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 09 Mars 2017
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 30 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Ndërtim dhe Operim
- **Forma :** Propozim i kërkuar

Kjo kontratë koncesionare referuar mënyrës së shpërblimit të koncesionarit, realizimin e të ardhurave e ka të parashikuar në formën e tarifave për kalim nga përdoruesit e rrugës ndaj koncesionarit. Gjithashtu, kontrata parashikon garantimit nga ana e autoritetit kontraktues e një pragu të të ardhurave nga trafiku të përcaktuar në kontratë si dhe ndarjen e tyre midis koncesionarit dhe Autoritetit Kontraktues në rast të tejkalimit të këtij pragu. Ndërkohë për realizimin e veprave të artit të përcaktuara në kontratë një pjesë e kostos së tyre mbulohet nëpërmjet subvencionimit nga buxheti i shtetit.

Në tabelën 1 janë dhënë vlerat e pagesave nga buxheti i shtetit të realizuara dhe planifikuara ndër vite. Për vitin 2021 sipas raportimit nga Autoriteti Kontraktues, financimi nga buxheti i shtetit ka qenë në vlerën 738.5 milion Lekë, me një realizim prej 100% nga plani vjetor 2021.

<sup>3</sup> Informacion i hartuar në bazën e raportimeve të Autoritetit Kontraktues.

❖ **Tabela 1: Pagesat buxhetore për projektin objekt kontrate “Milot-Morinë”**

Viti	2018		2019		2020		2021 <sup>4</sup>		2022
	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan
Pagesat Buxhetore (në mijë Lekë)	310,000	308,183	575,753	570,642	813,259	811,734	740,259	790,027	743,000

Ndërkohë në tabelën e mëposhtme janë paraqitur të dhëna mbi të ardhurat e realizuara nga tarifat e përdoruesve të rrugës. Për vitin 2021 janë realizuar 1,74 miliardë Lekë të ardhura.

❖ **Tabela 2: Të ardhurat nga tarifat e përdoruesve të rrugës “Milot-Morinë”<sup>5</sup>**

Viti	2018		2019		2020		2021	
	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt
Niveli i të ardhurave (në mijë Lekë)	1,251,019	413,473	1,279,030	1,811,813	1,307,315	1,474,044	1,359,988	1,736,257

### ❖ Risqet

Nga 12 risqe të identifikuara, Autoriteti Kontraktues ka mbajtur 3 risqe: riskun politik, riskun e qeverisjes dhe riskun e ndryshimeve ligjore, ndërsa tek Partneri Privat janë transferuar risku i ndërtimit, risku i transferimit të asetëve, risku i operimit dhe performancës dhe risku i ribalancimit të ekuilibrit financiar. Ndërkohë, risku i kërkesës, risku financiar, risku i forcës madhore, risku i rinegociimit dhe risku i ndërprerjes së kontratës janë ndarë mes palës private dhe publike.

Në vitin 2018, për shkak të kundërshtimeve mbi tarifën e rrugës nga përdoruesit e rrugës si dhe nga banorët e qytetit të Kukësit, Sheshi i Pagesës (Toll Plaza) qëndroi për 6 muaj jashtë funksionit. Megjithatë, për muajt operativ të ardhurat ishin më të larta se ato të parashikuara. Për vitin 2021 nuk është raportuar materializimi i ndonjë risku, por risku financiar, risku i forcës madhore, risku i rinegociimit dhe risku i veprimeve negative të qeverisë (MAGA) janë klasifikuar si risqe të mesme dhe për riskun MAGA. Autoriteti Kontraktues shprehet se mundësia e materializimit të tij është e mundur në uljen e tarifës së kalimit në Sheshin e pagesës.

## 2. Kontrata Koncesionare/PPP “Për ndërtimin, përmirësimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e Rrugës së Arbrit”<sup>6</sup>

Objekti i kësaj kontrate koncesioni/PPP është ndërtimi, përmirësimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e “Rrugës së Arbrit” nga ana e shoqërisë koncesionare për 13 vite, duke u nisur nga data efektive e saj 04.07.2018.

Sipas raportimeve dhe konfirmimit të Autoriteti Kontraktues, aktualisht kanë përfunduar 49 km trup rrugë në stadin e punimeve të avancuara, kanë përfunduar 5 Tunelet e rinj, me të gjitha elementet (përfshi edhe ndriçimin), ka përfunduar ndërtimi i 2 urave beton - arme, përkatësisht mbi Lumin e Zallit të Bulqizës (144 m e gjatë) dhe mbi lumin Drin (260 m e

- **Autoriteti Kontraktues:** Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë.
- **SPV:** “Gjoka 87 sh.p.k”
- **Vlera e Investimit:** 26.5 miliardë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 11 Korrik 2018
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 13 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Ndërtim dhe operim
- **Forma :** Propozim i pakërkuar

<sup>4</sup> Burimi: “Tabela 18 Koncesionet/PPP-të aktive me mbështetje nga buxheti i shtetit në Raportin për Zbatimin e Buxhetit Vjetor situatën makroekonomike dhe fiskale gjatë vitit 2021 final KBFP 2021”

<https://financa.gov.al/paketa-e-projektligjit-te-buxhetit-faktik-2021/>

<sup>5</sup> Informacion i hartuar në bazën e raportimeve të Autoritetit Kontraktues.

<sup>6</sup> Informacion i hartuar në bazën e raportimeve të Autoritetit Kontraktues.

gjatë), ka përfunduar Ura e Vashës dhe Ura e Fshatit Fshat, si dhe është përfunduar By Pass-i i Murrizit, një gjatësi prej 9.6 km. Në vijim, është edhe ndërtimi i Tunelit të Murrizit me ecuri realizimi 76%. Për shkak të kushteve gjeologjike të terrenit, ritmi i punimeve në vitin 2021 ishte i vazhdueshëm por me intesitet më të ulët.

Përsa i përket llojit të financimit ky projekt koncesionar/PPP është me mbështetje buxhetore, pagesat e të cilit kanë filluar në vitin 2019 (shih tabela 3). Autoriteti Kontraktues ka përmbytur detyrimin e pagesës për realizimin e punimeve të ndërtimit mbi 25% të ecurisë së punimeve dhe pagesat kanë filluar të kryhen sipas Modelin Financiar të kontratës. Pagesat faktike të vitit 2021 janë në masën rreth 3.3 miliardë lekë, duke rezultuar me një realizim 100% nga plani vjetor i buxhetit për vitin 2021, të cilat konsistojnë në "Ndërtim, Operim, Mirëmbajtje" dhe "Supervizion i punimeve të Kontrates" dhe "Oponencë Teknike".

❖ **Tabela 3: Pagesat buxhetore për projektin objekt kontrate "Rruga e Arbrit"**

Viti	2018		2019		2020		2021 <sup>7</sup>		2022
	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan
Pagesat Buxhetore (në mijë Lekë)	1,000	0	3,913,800	3,910,860	2,689,110	2,689,054	3,393,000	3,392,727	2,940,000

Në tabelën 4 janë paraqitur të dhënat mbi vlerën e investimit kapital të realizuar nga viti 2018 e deri në fund të vitit 2021. Për vitin 2021, janë realizuar rreth 78% e realizimit fizik të punimeve ndërtimore, 69.7% të realizimit financiar të këtyre punimeve, 95% të realizimit kohor, 100% performancë të cilësisë.

❖ **Tabela 4: Vlera e investimit "Rruga e Arbrit"**

Viti	2018		2019		2020		2021		2022
	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan
Investimi Kapital (në mijë Lekë)	2,587,500	5,785,005	5,623,827	5,617,734	6,376,171	5,845,991	5,824,061	3,899,631	2,689,000

#### ❖ **Risqet**

Autoriteti Kontraktues ka raportuar në lidhje me risqet e kontratës sipas formatit të përcaktuar, duke specifikuar përcaktimin e palës që merr përsipër riskun. Autoriteti Kontraktues ka mbajtur 3 prej tyre: riskun politik, riskun e aksesit në zonën e projektit dhe riskun e ndryshimeve ligjore, ndërsa tek Partneri Privat janë transferuar 5 risqet kryesore si: risku i projektimit, ndërtimit, disponueshmërisë, risku i operimit dhe mirëmbajtjes, risku i transferimit të aseteve dhe risku i ribalancimit të ekuilibrit financiar. Ndërkohë, risku i forcës madhore, risku i rinegociimit dhe risku i ndërprerjes së kontratës janë ndarë mes palës private dhe publike.

<sup>7</sup> Burimi: "Tabela 18 Koncesionet/PPP-të aktive me mbështetje nga buxheti i shtetit në Raportin për Zbatimin e Buxhetit Vjetor situatën makroekonomike dhe fiskale gjatë vitit 2021 final KBFP 2021", në linkun: <https://financa.gov.al/paketa-e-projektligjit-te-buxhetit-faktik-2021/>.

### 3. Kontrata e koncesionit/PPP “Për projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e segmentit rrugor “Milot Balldren”<sup>8</sup>

Objekti i kësaj kontrate koncesioni/PPP është projektimi, ndërtimi dhe mirëmbajtja e rrugës “Milot Balldren”.

Referuar raportimeve të Autoritetit Kontraktues rezultojnë se, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë në cilësinë e Autoritetit Kontraktues me shkresën nr. 1069/3 datë 16.12.2021, i ka dërguar shoqërisë “ANK” sh.p.k., si Koncesionari, dhe shoqërisë “Bardh Konstruksion” sh.p.k., si Shoqëria Koncesionare, njoftimin për zgjidhjen e kontratës së Koncesionit/PPP “Për projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e segmentit rrugor “Milot–Balldren”, si rezultat i mospërmbushjes së kushteve të kontratës së koncesionit/PPP nga ana e Shoqërisë Koncesionare dhe Koncesionarit, të parashikuara në nenin 7 “Mospërmbushja e Kushteve Paraprake” si dhe në pikën 4.2 të nenit 21 “Përmbyllja Financiare”.

- **Autoriteti Kontraktues:** Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë.
- **SPV:** Bardh Konstruksion sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 17.7 miliardë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 27.03.2019
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 13 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Në fazën e plotësimit të kushteve paraprake për zbatimin e projektit

### 4. Kontrata e koncesionit/PPP “Për projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugës “Porti i Jahteve- By Pass Orikum Dukat (Ura e Shën Elizës)”<sup>9</sup>

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është projektimi, ndërtimi dhe mirëmbajtja e Rrugës “Porti i Jahteve-Bypass Orikum- Dukat (Ura e Shën Elizës)”. Me përmbushjen e kushteve paraprake të kontratës dhe dorëzimit të sheshit të Territorit të projektit nga autoriteti kontraktor në muajin shkurt 2021, Shoqëria Koncesionare filloi zbatimin e punimeve ndërtimore sipas projektit të miratuar, punime të cilat do të implementohen për 36 muaj.

- **Autoriteti Kontraktues:** Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë.
- **SPV:** ‘Rruga Orikum-Llogara’ sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 5.81 miliardë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 18.07.2019
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 13 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Ndërtim
- **Forma:** Propozim i pakërkuar

Sipas raportimeve nga ana e Autoritetit Kontraktues, gjatë vitit 2021 punimet e zbatimit kanë ecur me ritëm, sipas grafikut të punimeve të cilat janë monitoruar dhe certifikuar nga inxhinieri i pavarur i kontratës. Gjithashtu, në kuadër të zbatimit të kontratës, janë marrë masat nga autoriteti kontraktor dhe institucionet përgjegjëse, për kryerjen dhe ndjekjen e procedurave ligjore për shpronësimet për pronarët e pasurive të paluajshme që preken nga ndërtimi i rrugës. Përsa i përket llojit të financimit ky projekt koncesionar/PPP është me mbështetje buxhetore, Pagesat faktike të vitit 2021 janë në masën rreth 47 milion lekë, duke rezultuar me një realizim 98% nga plani vjetor i buxhetit për vitin 2021, të cilat konsistojnë në zërat "Supervizion i punimeve të Kontrates" dhe "Oponence teknike".

❖ **Tabela 5: Pagesat buxhetore për projektin objekt kontrate “Rruga Orikum-Dukat”**

Viti	2021		2022
	Plan	Fakt	Plan
Pagesat Buxhetore (në mijë Lekë)	48,029	47,069	312,000

<sup>8</sup> Informacion i hartuar në bazën e raportimeve të Autoritetit Kontraktues.

<sup>9</sup> Informacion i hartuar në bazën e raportimeve të Autoritetit Kontraktues.

Në tabelën 6, janë paraqitur të dhënat mbi vlerën e investimit kapital të realizuar për vitin 2021, realizimi fizik i punimeve ndërtimore për vitin 2021, është rreth 26%.

❖ **Tabela 6: Vlera e investimit “Rruga Orikum - Dukat”**

Viti	2021		2022
	Plan	Fakt	Plan
Investimi Kapital (në mijë Lekë)	810,556	1,477,618	1,758,140

❖ **Risqet**

Autoriteti ka raportuar në lidhje me risqet e kontratës duke specifikuar përcaktimin e palës që merr përsipër riskun. Autoriteti Kontraktues ka mbajtur riskun e aksesit në zonën e projektit, kurse Partneri Privat janë transferuar risku i truallit, risku i projektimit, ndërtimit, etj.

**5. Kontrata Koncesionare/PPP “Ndërtimi, vënia në punë, operimi dhe mirëmbajtja e Aeroportit ‘Nënë Tereza’<sup>10</sup>**

Objekti i kësaj kontrate koncesioni/PPP konsiston në zhvillimin e dy fazave A dhe B ku përfshihet projektimi, financimi, operimi, ndërtimi, vënia në punë, mirëmbajtja dhe administrimi/zhvillimi i terminalit të ri të aeroportit, duke lejuar zgjerimin e tij në të ardhmen.

Sipas raportimeve dhe konfirmimit të Njësisë së Zbatimit të Projektit, aktualisht projekti është në fazën e operimit. Shoqëria koncesionare “TIA” sh.p.k, ka dorëzuar Masterplanin e përditësuar të Aeroportit në përputhje me kërkesat e vendosura në marrëveshjen koncesionare (Master Plani dhe Planifikimi i Mjediseve). Përgjatë dy fazave është realizuar ripërtëritja, vënia në punë dhe mirëmbajtja e terminalit ekzistues, ka përfunduar ndërtimi dhe vënia në punë e qendrës së re së kargos, si dhe është realizuar mirëmbajtja e Perimetrit të Rrethimit të sigurisë së Aeroportit në përputhje me detyrimet e marrëveshjes koncesionare.

- **Autoriteti Kontraktues: OSHA**  
(Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë)
- **SPV: Tirana International Airport sh.p.k**
- **Vlera e Investimit: 9.1 miliardë Lekë**
- **Data e fillimit të kontratës: 23 Prill 2005**
- **Kohëzgjatja e kontratës: 35 vite**
- **Faza aktuale e projektit: Operim dhe Ndërtim**
- **Forma: Propozim i Kërkuar**

Kjo kontratë koncesionare është rinegociuar në vitin 2021, procesi i rinegociimit mes palëve nisi që prej konstatimit të disbalancës ekonomike në raportin e BDO Albania dhe BDO Consulting në Janar 2019, raport ky i kërkuar dhe i kontraktuar nga qeveria shqiptare për të analizuar pozitën ekonomike të shoqërisë koncesionare të aeroportit “Nënë Tereza”. Me zhvillimet e ndodhura nga momenti i përfundimit të Konsulentit të Pavarur, duke marrë në konsideratë impaktin e pandemisë Covid-19 si dhe ndryshimit të aksionerit të shoqërisë koncesionare, palët kanë dakordësuar si më poshtë:

- Investime të reja në një shumë totale 99,350,000 Euro për të përmirësuar kapacitetet dhe cilësinë e shërbimit.
- Zgjatjen e afatit të koncensionit për 13 vite shtesë.
- Vendosjen e pagesës bazë (tarifës për pasagjerë) në 10 Euro për personat mbi 12 vjeç dhe 3 Euro për fëmijë nga 2 deri në 12 vjeç.

Procesi i negociimit mes palëve u finalizua me miratimin e Ligjit nr.16, datë 08.02.2021.

<sup>10</sup> Informacion i hartuar në bazën e raportimeve të Autoritetit Kontraktues.

Gjithashtu, shoqëria koncesionare ka përfunduar fazën e parë të projektit ‘Airfield 2020’, ndërkohë rehabilitimi i pistës dhe rrugëve lidhëse që mundësojnë lëvizjen e avionëve në zonën ajrore ka vijuar gjatë vitit 2021.

Realizueshmëria e disa nga treguesit e performancës gjatë vitit 2021 ka qënë si më poshtë:

Indikatorët kryesorë të performancës	Realizueshmëria për vitin 2021
Kriteret e Përbushjes së performancës në zbatim të shtojcës 36 të Marrëveshjes së Koncesionit	100%
Shtojca 24 e marrëveshjes së koncesionit, Pajisjet e Aerodromit, funksionimi dhe mirëmbajtja e pasjisjeve	100%
Shtojca 28 Ndryshimi tokësor i Aerodromit	95%
Shtojca 29 Mjetet kundra zjarrit, shpëtimit dhe kontrollet përkatëse	100%
Shtojca 37 Administrimi Operacional i sigurisë së aeroportit	90%
Shtojca 38 Manuali Operacional i Aeroportit	100%
Shtojca 39 Implementimi i plotë i sistemit të Menaxhimit të Sigurisë nga koncesionari	95%
Shtojca 42 Administrimi Mjedisor	100%
Shtojca 48 Impianti i ri i karburantit	100%

Një tjetër tregues i performancës së këtij projekti është trendi në rritje ndër vite i numrit të pasagjerëve që kanë përdorur shërbimin e ofruar nga ky koncesion. Statistikat që nga viti 2012 janë të paraqitura në tabelën 7.

❖ **Tabela 7: Numri i pasagjerëve ndër vite**

Viti	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Nr.i Pasagjerëve</i>	1,665,331	1,757,342	1,810,305	1,977,044	2,195,100	2,630,338	2,947,172	3,338,147	1,310,614	2,923,533

#### ❖ Risqet

Në lidhje me këtë kontratë koncesioni, është raportuar probabilitet i ulët për riskun e qeverisjes, riskun e ndërtimit, riskun e kërkesës, riskun financiar, riskun e rinegociimit dhe riskun e ndërprerjes së kontratës. Ndërkohë Autoriteti Kontraktues ka raportuar për një probabilitet të mesëm për riskun e operimit dhe performancës. Sipas raportimit është hartuar një material udhëzues nga AAC në lidhje me hartimin dhe implementimin e SMS. Gjithashtu, janë zhvilluar auditime dhe inspektime ku janë lënë gjetjet përkatëse dhe priten masat korrigjuese për mbylljen e tyre në kohë. Risku material nga vendimet politike dhe risku i ndryshimeve ligjore është vlerësuar me probabilitet mesatar për të ndodhur.

## 6. Kontratë Koncesioni /PPP “Për rehabilitimin, operimin, transferimin e aeroportit të Kukësit”<sup>11</sup>

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është rehabilitimi, operimi dhe transferimi i “Aeroportit të Kukësit”. Referuar raportimeve të Autoritetit Kontraktues aktualisht ky projekt ndodhet në fazën e operimit si dhe gjatë vitit 2021 janë realizuar një pjesë e konsiderueshme e punimeve ndërtimore në masën 97 % dhe në muajin mars të vitit 2021 ky aeroport ka filluar operimin e tij. Autoriteti raporton se nuk janë përmbushur 100% kushtet paraprake për shkak se rruga që lidh Aeroportin me Autostradën nuk është përfunduar totalisht nga ana e Autoritetit Kontraktues, kusht i cili, nuk cënon operimin e aeroportit.

- **Autoriteti Kontraktues:** Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë.
- **SPV:** “Kukës International Airport”
- **Vlera e Investimit:** 987,9 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 20 Mars 2019
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Përmbushje e kushteve paraprake kontraktuale për zbatimin e projektit
- **Forma:** Propozim i Kërkuar

### ❖ Risqet

Në bazë të raportimeve, konstatohet se risqet e alokuara tek koncesionari janë risku i kërkesës, risku i qeverisjes, risku i ndërtimit, risku i operimit dhe të performancës, risku i ndryshimeve ligjore dhe risku i ribalancimit të ekuilibrit financiar, ndërsa risqet e ndara mes autoritetit kontraktues dhe shoqërisë koncesionare janë risku financiar, risku i forcës madhore, risku i rinegociimit dhe risku i ndërprerjes së kontratës. Autoriteti ka raportuar probabiliteti që risku operacional të materializohet është i lartë, por nuk ka përcjellë informacion lidhur me masat e marra në këtë drejtim.

## 7. Kontratë Koncesionit/PPP “Për Menaxhimin, Operimin dhe Mirëmbajtjen e Terminalit të trageteve të Portit të Durrësit”<sup>12</sup>

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është investimi, menaxhimi, operimi, mirëmbajtja dhe përmirësimi teknik, si dhe adaptimi për të përmbushur kërkesat aktuale dhe të ardhshme të trafikut në Terminalin e Trageteve dhe Krocerave Durrës. Referuar raportimeve të Autoritetit Kontraktues, aktualisht ky projekt është në fazën e zbatimit. Për vitin 2021 nuk ka pasur raportime për investime.

- **Autoriteti Kontraktues:** Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë.
- **SPV:** “Albania Ferry Terminal Operator” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 581 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 11 Shtator 2013
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 25 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i Pakërkuar

Niveli i kërkesës së arritur gjatë vitit 2021 është **937,069** volume (pasagjerë dhe mjete), nga 1,440,000 volume të planifikuara gjatë kësaj periudhe. Specifikisht treguesit e performancës kanë patur ecurinë e mëposhtme:

- *Volumi i Pasagjerëve*- Gjatë kësaj periudhe volumi ka qënë **688,069** pasagjerë nga 1,100,000 të parashikuar për këtë periudhë.
- *Volumi i mjeteve*- Gjatë kësaj periudhe kanë kaluar **249,000** mjete, nga 340,000 të parashikuar për këtë periudhë.

### ❖ Risqet

Autoriteti ka raportuar edhe në lidhje me risqet e kontratës, duke e konsideruar me probabilitet të mesëm për të ndodhur riskun e ndërtimit, riskun e operimit dhe performancës dhe riskun e kërkesës (mosrealizimi i kërkesave

<sup>11</sup> Informacion i hartuar në bazën e raportimeve të Autoritetit Kontraktues.

<sup>12</sup> Informacion i hartuar në bazën e raportimeve të Autoritetit Kontraktues.

aktuale dhe të ardhshme të trafikut), risqe të cilat janë alokuar tek koncesionari në rast materializimi. Gjithashtu edhe risku financiar është alokuar tek koncesionari. Ndërkohë risqet e alokuara Autoritetit Kontraktues janë risku i qeverisjes, risku i ndryshimeve ligjore dhe risku material nga vendimet politike. Ndërsa risku i negocimit dhe risku i ndërprerjes së kontratës janë ndarë mes Autoritetit Kontraktues dhe Koncesionarit.

## 8. Kontratë Koncesioni/PPP “Për operimin, menaxhimin dhe mirëmbajtjen e Terminalit Lindor në Portin e Durrësit”<sup>13</sup>

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është menaxhimi, operimi, ndërtimi, mirëmbajtja dhe përmirësimi teknik dhe adaptimi nga ana e shoqërisë koncesionare për të përmbushur kërkesat aktuale dhe të ardhshme të trafikut në Terminalin Lindor Durrës. Operimi i Terminalit do të përfshijë ngarkimin dhe shkarkimin kryesisht të anijeve me ngarkesa rifuxho, minerale qymyr etj., por edhe të anijeve me ngarkesa të përgjithshme dhe për ngarkesa për projekte sipas rastit.

Referuar raportimeve të Autoritetit Kontraktues, aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Në lidhje

me vlerën e investimit, për periudhën 2013-2017 raportohet se vlera e investimit është në masën 903.9 milionë Lekë, investime të cilat janë në proces certifikimi nga grupi i punës së Njësisë Zbatuese të Projektit. Tregues performance për këtë projekt është realizimi i volumit fizik të mallrave, ku për vitin 2021 janë realizuar 1,025,133 ton nga 1,475,189 ton të planifikuara për këtë periudhë nga ku përqindja e realizimit rezulton në masën 80.38%.

- **Autoriteti Kontraktues:** Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë.
- **SPV:** “EMS Albanian Port Operator” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 2,06 miliardë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 15 Korrik 2013
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i Pakërkuar

### ❖ *Tabela 8: Volumi fizik i mallrave (në ton)*

Viti	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vlera Fakt	279,339	876,685	530,960	421,205	738,762	539,093	656,760	733,487	1,025,133

### ❖ **Risqet**

Autoriteti ka raportuar edhe në lidhje me risqet e kontratës, duke e konsideruar me probabilitet të lartë për të ndodhur riskun e ndërtimit, risku i performancës dhe risku i kërkesës (Mospërballimi i kërkesave aktuale dhe të ardhshme të trafikut në Terminalin Lindor, në lidhje me ngarkimin e anijeve rifuxho, minerale qymyr, si dhe ngarkesa të përgjithshme dhe për ngarkesa për projekte sipas rastit), risqe të cilat janë alokuar tek koncesionari në rast materializimi. Risqe të tjera të alokuara koncesionarit janë risku i ndërtimit, risku i operimit dhe performancës dhe risku financiar. Ndërkohë risqet e alokuara Autoritetit Kontraktues janë risku i qeverisjes dhe risku i ndryshimeve ligjore. Ndërsa risku i negocimit, risku i ndërprerjes së kontratës dhe forca madhore janë ndarë mes Autoritetit Kontraktues dhe Koncesionarit. Autoriteti ka raportuar se janë materializuar risku i ndërtimit, risku i operimit dhe performancës, risku financiar dhe risku i forcës madhore, për të cilat janë marrë masa nga Autoriteti Portual i Durrësit dhe Autoriteti Kontraktues.

<sup>13</sup> Informacion i hartuar në bazën e raportimeve të Autoritetit Kontraktues.

## 9. Kontratë Koncesionit/PPP “Për Rehabilitimin, Operimin dhe Transferimin e Infrastrukturës Hekurudhore Fier-Ballsh, Fier Vlorë”<sup>14</sup>

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është rehabilitimi i infrastrukturës hekurudhore, operimi si administrues infrastrukture dhe transportues hekurudhor i integruar, te rrjetit të transportit hekurudhor Fier-Ballsh dhe Fier-Vlorë dhe transferimi i tyre nga shoqëria koncesionare tek Autoriteti Kontraktues.

Referuar raportimeve dhe konfirmimit të Autoritetit Kontraktues, aktualisht ky projekt është në fazën e zbatimit. Për vitin 2021 nuk janë zhvilluar investime të rëndësishme që lidhen me rehabilitimin e infrastrukturës

hekurudhore. Bazuar në raportimin e Autoritetit Kontraktues progresi i punimeve është në masën 44%.

Gjithashtu, Shoqëria Koncesionare ka raportuar se nuk ka arritur të sigurojë financim nga Bankat për rehabilitimin e infrastrukturës hekurudhore Fier-Ballsh, për shkak të riskut që paraqet ky projekt, i cili lidhet kryesisht me mos funksionimin e vazhdueshëm të rafinerisë së Ballshit (në proces demolimi).

Shoqëria Koncesionare ka kërkuar shtyrjen e periudhës së rehabilitimit, për çështje që lidhen edhe me forcën madhore, okupimet e pronave si dhe zënien e trasesë hekurudhore nga vagonët e “HSH” Sh.a në Ballsh. Kërkesë e cila është duke u shqyrtuar nga ana e Autoritetit Kontraktor.

### ❖ Risqet

Në bazë të raportimeve, konstatohet se risqet e alokuara tek koncesionari janë risku i kërkesës, risku i ndërtimit, risku i operimit dhe të performancës, dhe risqet financiare, ndërsa risqet e ndara mes autoritetit kontraktues dhe shoqërisë koncesionare janë risku i forcës madhore, risku i rinegocimit, risku i veprimeve negative të qeverisë dhe i ndryshimit të ligjit si dhe risku i ndërprerjes së kontratës. Autoriteti ka raportuar se probabiliteti që risku i kërkesës dhe risku i forcës madhore të materializohet është i mesëm, ndërsa risqet e tjera kanë probabilitet të ulët për tu matërializuar.

- **Autoriteti Kontraktues:** Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë.
- **SPV:** “ALBRAIL” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 2.4 miliard Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 11 Prill 2017
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 25 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i Pakërkuar

<sup>14</sup> Informacion i hartuar në bazën e raportimeve të Autoritetit Kontraktues.

## SEKTORI I MJEDISIT

Në sektorin e mjedisit janë miratuar projektet si: Inceneratori i Tiranës, Inceneratori i Fierit dhe Inceneratori i Elbasanit, të cilat konsistojnë në ndërtimin e impianteve të përpunimit të mbetjeve urbane, si dhe synojnë gjenerimin e energjisë elektrike për popullsinë në të ardhmen, dhe Landfill-i Kamzës, i cili ka si qëllim menaxhimin e mbetjeve për Bashkinë e Kamzës. Këto projekte janë në linjë me politikën e Qeverisë dhe Strategjinë Kombëtare të Menaxhimit të Mbetjeve, e cila përcakton një hierarki për parandalimin dhe administrimin e tyre që janë: parandalimi, përgatitja për ripërdorim, riciklimi, rikuperime të tjera dhe asgjësimi<sup>15</sup>. Gjithashtu në sektorin e mjedisit përfshihen edhe shfrytëzimi i burimit ujor në Sasaj, Bunec dhe kontrata e fidanishtes së Cërrikut.

### 10. Kontrata Koncesionare/PPP “Për Ndërtim Landfilli, Inceneratori dhe Rehabilitim i Venddepozitimeve Ekzistuese Tiranë dhe Prodhimin e Energjisë Elektrike”

Kontrata e koncesionit lidhur midis Ministrisë së Mjedisit dhe shoqërisë “Integrated Energy BV SPV” sh.p.k, e lidhur në 31 gusht 2017 ka për objekt dhënie me koncesion të formës BOT (ndërtim, operim dhe transferim i të drejtës së pronësisë dhe operimit, në përfundim të kontratës koncesionare), financimin, projektimin, rehabilitimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, operimin dhe mirëmbajtjen e Veprave dhe të Veprave Plotësuese për Mbetjet e Qarkut Tiranë, si dhe prodhimin e energjisë elektrike, për periudhën e koncesionit (ashtu siç definohet në nenin 4 të kontratës koncesionare), si dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës nga Koncesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve kontraktuale.

- **Autoriteti Kontraktues:** Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë/Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
- **Autoriteti i Përfshirë:** Bashkia e Tiranës dhe Njësitë e Qeverisjes Vendore Qarku Tiranë
- **SPV:** “Integrated Energy BV SPV”
- **Vlera e Investimit:** 17,1 miliardë Lekë
- **Data e fillimit të kontratës:** 31 Gusht 2017
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 30 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Ndërtim & Operim

Pas dorëzimit të objektit të kontratës koncesionare nga Koncesionari tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të periudhës së koncesionit, ky i fundit do t’ia transferojë si aset në pronësi të Bashkisë Tiranë për administrim të mëtejshëm.

Me Projekt objekt i kontratës nënkuptohen ndërtimi/ rehabilitimi i të gjitha Veprave dhe Veprave Plotësuese, sikundër parashikohen në mënyrë të detajuar në Aneksat përkatëse të kontratës koncesionare; operimi ekskluziv nga Koncesionari i të gjitha Veprave përgjatë periudhës së koncesionit dhe transferimi tek autoriteti Kontraktues në përfundim të periudhës së koncesionit. Periudha e koncesionit është për një periudhë 30 (tridhjetë) vitesh duke filluar nga Data Efektive dhe përfundon në ditën e përvjetorit të tridhjetë të kësaj date.

Përsa i përket llojit të financimit, sipas kontratës koncesionare ky projekt koncesionar/PPP është me pagesa të formës “pay për use” ose pagesa e një tarife fikse për çdo ton mbetjesh të depozituara, e cila paguhet nga Njësitë e Qeverisjes Vendore Qarku Tiranë për mbetjet që depozitohen.

Për vitin 2021, informacioni që është raportuar dhe konfirmuar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë në lidhje me ecurinë dhe performancën financiare dhe jofinanciare të kësaj kontrate koncesioni/PPP, në zbatim të nenit 10 pika 4, të ligjit nr. 125/2013 “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, i ndryshuar dhe Udhëzimit nr. 35, datë 12.12.2019, është si më poshtë:

<sup>15</sup> VKM nr. 175, datë 19.01.2011 “Për miratimin e strategjisë kombëtare të menaxhimit të mbetjeve dhe Planit kombëtar të menaxhimit të mbetjeve”.

❖ **Tabela 9: Pagesat vjetore të realizuara (faktike) për projektin objekt i kësaj kontrate – Bashkia Tiranë**

Viti	2018		2019		2020		2021 <sup>16</sup>		2022
	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan
Pagesat buxhetore (në mijë Lekë)	977,000	977,000	977,125	977,125	1,280,000	1,280,000	1,300,000	1,249,399	1,246,762

Gjithashtu, kjo kontratë ka të përcaktuar si tregues performance elementët si më poshtë:

- ❖ *Kapsulimi i mbetjeve në landfillin ekzistues;*
  - ❖ *Sasia e përpunuar e mbetjeve nga ndërtimi i inceneratorit;*
  - ❖ *Sasia e mbetjeve urbane rikuperuar përdorur si lëndë djegëse për prodhim energjie.*
- ❖ Pagesat e ekzekutuara nga Bashkia e Tiranës dhe bashkitë e tjera përmes Drejtorisë së Përgjithshme të Thesarit për përfituesin ekonomik Integrated Energy BV (ALL) për vitin 2021<sup>17</sup>

Bashkia	Viti 2021
	Pagesat për përfituesin ekonomik Integrated Energy BV (ALL)
Tiranë	1,249,398,879
Durrës	15,486,123
Kavajë	46,799,336

- ❖ Sasia e Mbetjeve (ton) e depozituar nga Bashkia Tiranë në Veprat dhe Veprat Plotësuese për Mbetjet e Qarkut Tiranë, sipas kategorive për vitin 2021<sup>18</sup>

Muaj	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qeshor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor	Total
Mbetje Urbane (ton)	21,047.9	18,860.36	20,474.12	19,824.35	21,147.2	20,393.06	21,985.66	21,126.85	19,982.5	20,856.59	20,640.03	21,236.52	247,548.24
Mbetje Dhe (ton)	2,244.71	5,845.74	27,109.09	10,990.76	3,212.82	1,878.98	1,763.28	2,309.59	6,777.83	5,275.69	6,026.51	3,293.68	49,619.59
Mbetje Inerte (ton)	1,921.56	3,500.12	2762.37	1,884.28	2,587.97	2,033.23	4,368.18	1,817.07	4,027.07	2,708.3	1,342.94	449.37	29,402.46

- ❖ Sasia e Mbetjeve (ton) e depozituar nga Bashkia Durrës dhe Bashkia Kavajë në Veprat dhe Veprat Plotësuese për Mbetjet e Qarkut Tiranë, për vitin 2021, në zbatim të kontratave respektive të lidhura mes palëve<sup>19</sup>

Bashkia	Sasia në ton
Bashkia Durrës	12,854.03
Bashkia Kavajë	13,036.23

### ❖ Risqet

Autoriteti ka raportuar në lidhje me risqet e kontratës sipas formatit të përcaktuar, duke specifikuar përcaktimin e palës që merr përsipër riskun, impaktin fiskal nëse është materializuar, probabilitetin e ndodhjes në të ardhmen dhe impaktin e pritshëm nëse ndodh. Nga risqet e identifikuar, Autoriteti Kontraktues ka mbajtur riskun e vendodhjes, riskun politik dhe riskun ekonomik, ndërsa partneri privat ka mbajtur riskun financiar, riskun e projektimit dhe riskun e transferimit të aseteve. Ndërkohë, risku i lejeve dhe licensave, risku i forcës madhore,

<sup>16</sup> Burimi: “Tabela 18 Koncesionet/PPP-të aktive me mbështetje nga buxheti i shtetit në Raportin për Zbatimin e Buxhetit Vjetor situatën makroekonomike dhe fiskale gjatë vitit 2021 final KBFP 2021”

<https://financa.gov.al/paketa-e-projektligjit-te-buxhetit-faktik-2021/> .

<sup>17</sup> Burimi: Konfirmim zyrtar nga Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit.

<sup>18</sup> Burimi: Konfirmim zyrtar nga Bashkia e Tiranës.

<sup>19</sup> Burimi: Informacion zyrtar i përcjellë dhe i konfirmuar nga menaxheri projektit në Veprat dhe Veprat Plotësuese për Mbetjet e Qarkut Tiranë.

risku i rinegociimit dhe risku i ndërprerjes së kontratës janë ndarë mes të dyja palëve. Lidhur me zgjatjen e afateve të ndërtimit që përfshihet si element i riskut të ndërtimit, raportohet se kjo zgjatje afati është shkaktuar si rrjedhojë e vonesave në dhënien e lejeve.

### 11. Kontrata Koncesionare/PPP “Për Ndërtimin e Administrimin e Impjantit të Trajtimin të Mbetjeve Urbane të Qarkut Fier dhe Prodhimin e Energjisë”<sup>20</sup>

Objekti i kontratës së koncesionit është financimi projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi dhe mirëmbajtja e impiantit të përpunimit të mbetjeve të Qarkut Fier dhe prodhimi i energjisë elektrike. Data efektive e kësaj kontrate është data 30 Nëntor 2016.

Referuar raportimeve të Autoritetit Kontraktues, në lidhje me disbursimet, ato kanë vazhduar sipas parashikimeve të kontratës.

Me vendimin nr.134, datë 28.03.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, shoqëria “Integrated Technology Services” sh.p.k dhe shoqëria “Integrated Technology Waste Treatment Fier” sh.p.k janë vendosur në masë sigurimi pasuror “sekuestro preventive”, së bashku me të gjitha pasuritë e paluajtshme dhe të luajtshme, në pronësi të tyre dhe administrohen nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara.

- **Autoriteti Kontraktues:** Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë/Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
- **SPV:** “Integrated Technology Waste Treatment Fier” Sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 3.72 miliardë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 30 Nëntor 2016
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 6 vjet
- **Forma:** Propozim i pakërkuar

#### ❖ Tabela 10: Pagesat vjetore të realizuara (faktike) për projektin objekt i kësaj kontrate

Viti	2018		2019		2020		2021 <sup>21</sup>		2022
	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Projektuar
Pagesat buxhetore (në mijë Lekë)	752,772	752,771	752,772	725,770	755,500	752,770	752,770	690,040	376,400

#### ❖ Të dhënat e raportuara të mbetjeve urbane dhe inerteve për vitin 2021<sup>22</sup>

Qarku Fier	Sasia Vjetore e Mbetjeve Urbane e depozituar, Incenerator/Landfill/Venddepozitim (Ton)
Bashkia Fier	35.2
Bashkia Lushnje	3,357.9
Bashkia Divjak	18,997.7
Bashkia Patos	13,182
Bashkia Reskovec	5,584
Bashkia Mallakastër	8,400
Total	43,972.8

#### ❖ Risqet

Autoriteti ka raportuar në lidhje me risqet e kontratës sipas formatit të përcaktuar, duke specifikuar përcaktimin e palës që merr përsipër riskun, impaktin fiskal nëse është materializuar, probabilitetin e ndodhjes në të ardhmen

<sup>20</sup> Informacion i hartuar në bazën e raportimeve të Autoritetit Kontraktues si dhe referuar “Tabela 18 Koncesionet/PPP-të aktive me mbështetje nga buxheti i shtetit në Raportin për Zbatimin e Buxhetit Vjetor situatën makroekonomike dhe fiskale gjatë vitit 2021 final KBFP 2021”

<https://financa.gov.al/paketa-e-projektligjit-te-buxhetit-faktik-2021/>

<sup>21</sup> Burimi: Autoriteti Kontraktues MIE dhe si dhe referuar “Tabela 18 Koncesionet/PPP-të aktive me mbështetje nga buxheti i shtetit në Raportin për Zbatimin e Buxhetit Vjetor situatën makroekonomike dhe fiskale gjatë vitit 2021 final KBFP 2021”

<https://financa.gov.al/paketa-e-projektligjit-te-buxhetit-faktik-2021/>

<sup>22</sup> Burimi: Autoriteti Kontraktues MIE bazuar në informacionin e komunikuar nga Agjencia Kombëtare e Ujësjellës - Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve (AKUM).

dhe impaktin e pritshëm nëse ndodh. Sipas raportimeve, Autoriteti Kontraktues ka mbajtur riskun e qeverisjes, riskun politik dhe riskun e ndryshimeve ligjore, ndërsa partneri privat ka mbajtur riskun financiar, riskun e vendodhjes, riskun e operimit (menaxhimi i impiantit, menaxhimi i mbetjeve) dhe riskun e transferimit të aseteve. Ndërkohë risku i forcës madhore, risku i rinegocimit, risku i ndërprerjes së kontratës, risku i kërkesës dhe risku i ndërtimit janë ndarë mes të dyja palëve.

## 12. Kontrata Koncesionare/PPP “Për Ndërtimin dhe Administrimin e Impiantit të Përpunimit të Mbetjeve Urbane të Qarkut të Elbasanit”<sup>23</sup>

Objekti i kësaj kontrate është projektimi, ndërtimi dhe vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja dhe transferimi në përfundim të afatit të kontratës i inceneratorit të Bashkia Elbasan.

Në lidhje me veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektike janë miratuar:

Vendimi Nr. 39 Prot., datë 28.04.2022 i Entit Rregullator të Energjisë (ERE) “Mbi licencimin e shoqërisë “Eco – Elb” sh.a në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektike nga centrali i përpunimit të mbetjeve urbane, me kapacitet 2850 kW”, Fletore Zyrtare me nr. 84 datë 06.06, 2022, si dhe Vendimi nr.159, datë 17.06.2022, i Entit Rregullator të Energjisë (ERE) “Mbi kërkesën e shoqërisë “Albtek Energy” sh.p.k. për përcaktimin e çmimit të energjisë elektrike të prodhuar nga impianti i trajtimit të mbetjeve urbane në qytetin e Elbasanit”, Fletore Zyrtare me nr.103, datë 12.07 2022.

Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara ka në administrim Shoqërinë “AlbTek Energy” sh.p.k, sekuestruar me vendim nr.484 datë 13.12.2021 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

- **Autoriteti Kontraktues:** Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë/Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (zbatues Bashkia Elbasan).
- **SPV:** “AlbTek Energy” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 3 miliardë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 16 dhjetor 2014
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 7 vjet

### ❖ Tabela 11: Pagesat vjetore të realizuara (faktike) për projektin objekt i kësaj kontrate

Viti	2018		2019		2020		2021 <sup>24</sup>	
	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt
Pagesat buxhetore (në mijë Lekë)	661,500	601,429	661,500	631,317	586,770	582,720	50,000	40,292

### ❖ Të dhënat e raportuara të mbetjeve urbane dhe inerteve për vitin 2021<sup>25</sup>

Qarku Elbasan	Sasia Vjetore e Mbetjeve Urbane e depozituar, Incenerator/Landfill/Venddepozitim (Ton)
Bashkia Elbasan	23,316
Bashkia Librazhd	3,022
Bashkia Prenjas	3,740.8
Bashkia Gramsh	2,980
Bashkia Cërrik	3,395.8
Bashkia Belsh	2,159.9
Bashkia Peqin	2,904.2
Total	41,518.7

<sup>23</sup> Informacion i hartuar në bazën e raportimeve të Autoritetit Kontraktues si dhe referuar “Tabela 18 Koncesionet/PPP-të aktive me mbështetje nga buxheti i shtetit në Raportin për Zbatimin e Buxhetit Vjetor situatën makroekonomike dhe fiskale gjatë vitit 2021 final KBFP 2021”

<https://financa.gov.al/paketa-e-projektligjit-te-buxhetit-faktik-2021/>.

<sup>24</sup> Po aty: <https://financa.gov.al/paketa-e-projektligjit-te-buxhetit-faktik-2021/>.

<sup>25</sup> Burimi: Autoriteti Kontraktues MIE bazuar në informacionin e komunikuar nga Agjencia Kombëtare e Ujësllës - Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve (AKUM).

### ❖ *Risqet*

Sipas raportimeve, Autoriteti Kontraktues ka mbajtur riskun e qeverisjes, riskun politik dhe riskun e ndryshimeve ligjore, ndërsa partneri privat ka mbajtur, riskun e ndërtimit, riskun e vendodhjes dhe riskun e operimit (menaxhimi i impiantit, menaxhimi i mbetjeve). Ndërkohë risku i forcës madhore dhe risku i kërkesës janë ndarë mes të dyja palëve. Probabiliteti i materializimit të këtyre risqeve është vlerësuar i ulët.

### **13. Kontrata Koncesionare/PPP “Për dhënien me koncesion/PPP të shërbimit të pastrimit, grumbullimit, transportimit, dhe seleksionimit të mbetjeve urbane të Bashkisë Kamëz”<sup>26</sup>**

Objekti i kësaj kontrate koncesioni/PPP është grumbullimi, transportimi, dhe seleksionimi të mbetjeve urbane të Bashkisë Kamëz". Data efektive e kontratës është data 24.05.2018.

Referuar raportimeve dhe Konfirmimeve të Autoritetit Kontraktues, aktualisht kjo kontratë ndodhet në fazë ndërtimi dhe operimi. Për vitin 2021 janë realizuar objektivat si: grumbullimi dhe transportimi i mbetjeve urbane dhe tregjeve; Larje dhe dezinfektimi i kontejnereve; Mirëmbajtje të vendgrumbullimeve të mbetjeve gjatë ditës; Grumbullimi i mbetjeve ndërtimore dhe të vëllimshme; Fshirja e rrugëve dhe trotuareve me krahë; Fshirje e rrugëve me makineri; Larje e rrugëve njëherë në ditë; Transportimi dhe depozitimi i mbetjeve në vendet përkatëse të miratuara nga autoritetet përkatëse.

- **Autoriteti Kontraktues:** Bashkia Kamëz
- **SPV:** “Eco Cleaning” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 1.35 miliardë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 12 Maj 2018
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 12 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Ndërtim dhe operim

### ❖ *Risqet*

Sipas raportimeve, Autoriteti Kontraktues ka mbajtur riskun e qeverisjes, riskun material nga vendimet politike, riskun e ndryshimeve ligjore dhe riskun e rinegociimit, ndërsa partneri privat ka mbajtur riskun e ndërtimit, riskun e operimit (menaxhimi i impiantit, menaxhimi i mbetjeve), riskun e ribalancimit të ekuilibrit financiar dhe riskun e transferimit të asetëve. Ndërkohë risku i forcës madhore, risku i ndërprerjes së kontratës, risku financiar janë ndarë mes të dyja palëve. Autoriteti ka raportuar materializim të riskut të lejeve, pasi nuk nuk është realizuar pajisja me leje mjedisore për ndërtimin e stacionit të transferimit. Koncesionari është në proces gjyqësor me Agjencinë Rajonale Mjedisore përse i përket mosdhënies së lejes mjedisore, si dhe është në proces negociimi me koncesionarin e Landfillit të Sharrës për lidhjen e një marrëveshjeje që të zgjidhë çështjen e marrjes së lejes mjedisore për ndërtimin e stacionit të transferimit.

<sup>26</sup> Informacion i hartuar në bazën e raportimeve dhe i konfirmuar nga Autoriteti Kontraktues.

#### 14. Kontratë Koncesioni/PPP “Menaxhimi dhe zhvillimi teknologjik i prodhimit të fidanëve pyjor/arrorë në fidanishten shtetërore të Cërrikut Elbasan”<sup>27</sup>

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është menaxhimi dhe zhvillimi teknologjik i prodhimit të fidanëve pyjor/arrorë në fidanishten shtetërore të Cërrikut, Elbasan nga ana e shoqërisë koncesionare dhe transferimi i saj shtetit shqiptar në fund të periudhës së koncesionit. Referuar raportimeve dhe konfirmimeve të Autoritetit Kontraktues, aktualisht ky projekt është në fazë operimi, dhe ky projekt ka një progres të ngadaltë bazuar në objektivat e përcaktuara në Planin e Biznesit.

Shoqëria Koncesionare ka realizuar investime në makineri dhe investime në mbjellje parcelash me bimë. Raportimi i Autoritetit Kontraktor për vitin 2021 është i njëjtë si raportimi i përcjellë për vitin 2020.

#### ❖ Risqet

Ndarja e risqeve është bërë sipas metodës së alokimit të risqeve mbi palën që është më e aftë për t’i menaxhuar, si rrjedhojë risku i ndërtimit, risku i kërkesës, risku operacional, risku financiar i janë alokuar koncesionarit. Ndër këto risqe, risku i forcës madhore është vlerësuar me impakt të lartë për të ndodhur, si dhe gjithashtu raportohet se është materializuar në vitin 2016 për shkak të përmbytjeve, duke penguar kështu realizimin e objektit brenda afateve. Ndërsa risku i veprimeve materiale negative të qeverisë, risku i ndryshimeve ligjore, si dhe risku i përfundimit parakohe i kontratës janë të ndara mes palëve dhe janë vlerësuar me probabilitet të ulët për të ndodhur. Për riskun e përfundimit para kohe të kontratës Autoriteti ka raportuar se ka probabilitet që të anulohet kontrata koncesionare.

#### 15. Kontratë Koncesioni/PPP “Për shfrytëzimin e burimit ujor Sasaj, Bunec”<sup>28</sup>

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është shfrytëzimi nga ana e shoqërisë koncesionare të burimit ujor “Sasaj” në fshtatin Bunec, Komuna Lukovë, Sarandë, nëpërmjet financimit, projektimit, ndërtimit, vënies në punë, administrimit, mirëmbajtjes së veprës si dhe transferimin e tij në përfundim të periudhës së koncesionit tek Autoriteti Kontraktues. Me VKM nr.775, datë 04.12.2019, është përcaktuar MBZHR, si i vetmi Autoritet Kontraktues përgjegjës për ndjekjen dhe zbatimin e kësaj kontrate koncesionare. Sipas raportimit, ky projekt nuk ka nisur akoma zbatimin pasi nuk është dorëzuar akoma sipërfaqja e tokës tek koncesionari, sipas detyrimeve kontraktuale. Nga Ministria e Bujqësisë dhe

Zhvillimit Rural është aplikuar në Drejtorinë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Sarandë për informacion për statusin juridik të pasurive që preken nga ky koncesion, për të bërë të mundur dorëzimin e sipërfaqes të Koncesionari, me qëllim fillimin e këtij koncesioni. Nga informacioni i ardhur nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Sarandë, rezulton se disa pasuri objekt të koncesionit janë në pronësi të personave private, për të cilat konsiderohet i nevojshëm shpronësimi i tokës.

- **Autoriteti Kontraktues:** Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
- **SPV:** “Almex Greenwood” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 49.6 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 07 Tetor 2014
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i Pakërkuar

<sup>27</sup> Informacion i hartuar në bazën e raportimeve të Autoritetit Kontraktues.

<sup>28</sup> Informacion i hartuar në bazën e raportimeve të Autoritetit Kontraktues.

## SEKTORI I SHËNDETËSISË<sup>29</sup>

Në sektorin e shëndetësisë janë miratuar 4 kontrata koncesionare/PPP që kanë si Autoritet Kontraktues Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, dhe kanë si qëllim ofrimin e një shërbimi sa më cilësor, më të shpejtë dhe efektiv në lidhje me shëndetin e qytetarëve.

### 16. Kontrata Koncesionare/PPP “Për shërbime të integruara për ofrimin e setit të personalizuar të instrumenteve kirurgjikale, furnizimin me material mjekësor steril njëpërdorimësh në sallat kirurgjikale, si dhe trajtimin e mbetjeve me rrezik biologjik dhe dezinfektimin e sallave kirurgjikale”<sup>30</sup>

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është menaxhimi i qendrës së sterilizimit, ofrimi i instrumenteve kirurgjikale sterile sipas setit të personalizuar, veshjet në sallat kirurgjikale, trajtimi i mbetjeve mjekësore me rrezik biologjik dhe dezinfektimin e sallave kirurgjikale ku do të ofrohet ky shërbim. Projekti shtrihet në të gjitha spitalet universitare, rajonale dhe spitalet bashkiakë. Referuar raportimeve dhe konfirmimit të Autoritetit Kontraktues, aktualisht ky projekt është në fazën e operimit.

Ky projekt financohet tërësisht me fonde publike sipas metodës (pay x use) në varësi të numrit të pacientëve të cilët do të duhet të marrin shërbimin.

- **Autoriteti Kontraktues:** Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
- **SPV:** Sani Service sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 1.5 miliardë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 10 Dhjetor 2015
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 10 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i Kërkuar

Gjatë vitit 2021 nga të dhënat e raportuara nga Autoriteti Kontraktues evidentohet se shërbimi i sterilizimit është planifikuar për t’u ofruar për 63,600 ndërhyrje kirurgjikale. Për vitin 2021 është realizuar një shërbim prej 55,452 ndërhyrje kirurgjikale të kompleteteve të ndryshme, si dhe 74,642 paketime me avull dhe 3,061 paketime me temperaturë të ulët. E shprehur në terma financiare të dhënat tregojnë se për mbulimin e këtij shërbimi, Qeveria Shqiptare kishte planifikuar një shumë prej 1,564,982 lekë me TVSh, nga të cilat janë paguar në total 1,500,924 me TVSh.

#### ❖ Tabela 12: Pagesat Buxhetore për projektin objekt kontrate “Setet Kirurgjikale”

Viti	2018		2019		2020		2021	
	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt
Pagesat Buxhetore (në mijë)	1,627,151	1,625,581	2,168,827	2,163,282	1,300,700	1,288,269	1,564,982	1,500,924

#### ❖ Risqet

Në lidhje me risqet e kontratës tek pala private janë transferuar risku i projektimit, ndërtimit, i operimit dhe performancës, si dhe risku i transferimit të asetëve, ndërsa risku i ndryshimeve ligjore, risku material nga vendimet politike dhe risku financiar i janë alokuar palës publike. Ndërkohë janë ndarë mes palëve risku i lejeve dhe licencave, risku i kërkesës, risku i forcës madhore, risku i rinegociimit dhe risku i ndërprerjes së kontratës.

<sup>29</sup> Informacioni për ecurinë vjetore të kontratave koncesionare/PPP për vitin 2021 të sektorit të shëndetësisë është raportuar dhe konfirmuar nga ana e Autoritetit Kontraktues, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

<sup>30</sup> Informacioni për ecurinë vjetore të kontratave koncesionare/PPP për vitin 2021 të sektorit të shëndetësisë është raportuar dhe konfirmuar nga ana e Autoritetit Kontraktues, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

## 17. Kontrata Koncesionare/PPP “Për paketën e shërbimeve të kontrollit mjekësor bazë për grupmoshat 35-70”<sup>31</sup>

Objekti i kësaj kontrate koncesioni/PPP është ofrimi i paketës së shërbimeve të kontrollit mjekësor bazë për grupmoshat 35-70 vjeç. Në bazë të kësaj kontrate, shoqëria koncesionare ka marrë përsipër të ndërtojë, pajisë me aparaturat mjekësore të nevojshme, operojë dhe menaxhojë 20 laboratore. Ky shërbim përfitohet falas nga të gjithë shtetasit e grupmoshës 35-70 vjeç me qëndrim të përhershëm në Republikën e Shqipërisë.

Referuar raportimeve dhe konfirmimit të Autoritetit Kontraktor: Për sa i përket detyrimeve kontraktuale, konkretisht aneksit 7 të kontratës koncesionare, “Çështje

financiare”, çmimi i pranuar për njësi (pa TVSH) do të jetë në vlerën 1,537 lekë, duke patur parasysh se vlera minimale e pagueshme nga Autoriteti për shërbimet e ofruara nga Koncesionari do të jetë 730,075,000 lekë (pa TVSH) për çdo vit të plotë. Kjo vlerë ngelet e pandryshueshme pavarësisht faktit nëse numri i analizave vjetore arrin shifrën 475,000 apo jo. Në fund të vitit 2016 është shtuar pika, që në rast se në një vit të plotë të zbatimit të kontratës së Koncesionit kryhen më shumë se 475.000 analiza, vlera financiare e analizave të kryera më tepër se 475.000, të kompensohet me vlerën financiare të analizave të pakryera në vitet e mëparshme të zbatimit të kontratës.

Programi i Kontrollit Shëndetësor Bazë ka mundësuar nëpërmjet kabineteve të tij, që të ketë standardizim të cilësisë së shërbimit të ofruar në të gjithë Shqipërinë. Qytetarët e qendrave shëndetësore urbane dhe rurale marrin të njëjtën cilësi shërbimi. Ky është i pari program që adreson reduktimin e pabarazive në shëndet, të cilat në vendin tonë kanë një ndarje të qartë urbane/rurale. Ky program është mjeti më efektiv për të bërë një screening të faktorëve të rrezikut për sëmundjet kronike, të cilat zënë 90% të barrës së sëmundshmërisë në vend.

Kjo kontratë ka qenë e ndërprerë për më shumë se një vit për shkak të situatës së krijuar nga pandemia, rifillimi i veprimtarisë daton më 1 shtator 2021. Referuar treguesve të performancës të raportuara nga Autoriteti Kontraktues rezulton se për vitin 2021 parashikimet lidhur me numrin e kontrolleve kanë qenë 158,333 (4 muaj \*39, 583 kontrolle në muaj) ndërkohë që numri i përfituesve për 4 mujorin e funksionimit të kontratës është 164,982.

### ❖ Tabela 13: Numri i Përfituesve të kontrollit mjekësor bazë “Check-Up”

Viti	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nr.i Përfituesve	244,420	329,555	316,601	428,891	482,716	101,426	164,982

### ❖ Tabela 14: Pagesat Buxhetore për projektin objekt kontrate “Kontrolli Mjekësor Bazë Check-Up”

Viti	2018		2019		2020		2021	
	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan <sup>32</sup>	Fakt	Plan	Fakt
Pagesat Buxhetore (në mijë Lekë)	876,083	876,083	876,083	876,083	352,083	322,322	366,090	219,021

<sup>31</sup> Informacioni për ecurinë vjetore të kontratave koncesionare/PPP për vitin 2021 të sektorit të shëndetësisë është raportuar dhe konfirmuar nga ana e Autoritetit Kontraktues, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

<sup>32</sup> Plan i ndryshuar.

- **Autoriteti Kontraktues:** Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
- **SPV:** “3P Life Logistic” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 172 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 7 Janar 2015
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 10 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i Kërkuar

### ❖ *Risqet*

Në lidhje me risqet që rrjedhin nga zbatimi i kontratës koncesionare, tek pala private janë transferuar risku i ndërtimit, risku i operimit dhe performancës, risku i transferimit të asetëve, ndërsa risku i ndryshimeve ligjore, risku material nga vendimet politike, risku financiar i janë alokuar palës publike. Ndërkohë janë ndarë mes palëve risku i kërkesës, risku i forcës madhore, risku i rinegocimit, risku i ndërprerjes së kontratës dhe risku i lejeve dhe licencave. Duke qene se gjatë vitit 2020, u materializua risku i forcës madhore si rezultat i pandemisë Covid-19, palët vendosën pezullimin e shërbimit për një periudhë kohe. Ky shërbim rifilloi serisht në Shtator të vitit 2021. Lidhur me adresimin e riskut të kërkesës, Autoriteti Kontraktues ka ndërmarrë iniciativën për ndryshimin e kontratës në lidhje me moshën e përfituesve duke e zgjeruar fashën e mbulimit nga 40-65 vjeç në fashën 35-70 vjeç.

### 18. Kontratë Koncesioni/PPP “Për ofrimin e shërbimit të hemodializës”<sup>33</sup>

Objekti i kësaj kontrate koncesioni/PPP është ofrimi nga ana e shoqërisë koncesionare i të gjitha mjeteve, pajisjeve dhe materialeve mjekësore dhe jo-mjekësore për ofrimin e shërbimit të hemodializës pranë spitaleve rajonale Shkodër, Lezhë, Elbasan, Vlorë, Korçë; rehabilitimi i hapësirave ekzistuese dhe ndërtimi i hapësirave të reja; pajisja me poste për kryerjen e hemodializës në të pesë qendrat e sipërmendura, si dhe me pajisje laboratorike për testet mujore laboratorike.

Referuar raportimeve dhe konfirmimit të Autoritetit Kontraktues, aktualisht kjo kontratë është në fazën e operimit. Duke qënë se shërbimi i hemodializës është jetësor për pacientët, Autoriteti Kontraktues nuk ka marrë masa për pezullimin në kuadër të situatës së krijuar nga Pandemia Covid-19. Ecuria e pagesave buxhetore për këtë kontratë koncesioni është si më poshtë:

- **Autoriteti Kontraktues:** Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
- **SPV:** “Dia Vita” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 1,17 miliardë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 10 Shkurt 2016
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 10 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i Kërkuar

### ❖ *Tabela 15: Pagesat Buxhetore për projektin “Shërbimi hemodializës”*

Viti	2018		2019		2020		2021	
	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt
Pagesat Buxhetore (në mijë Lekë)	742,849	738,911	807,448	804,388	733,300	733,203	754,000	747,195

Autoriteti Kontraktor, gjatë vitit 2021, ka raportuar: Bazuar në kontratën koncesionare evidentohet se shërbimi i dializës është planifikuar për t’u ofruar për 420 pacientë nga të cilët mesatarisht 411 pacientët kanë marrë këtë shërbim. Ndërsa për sa i përket numrit të seancave të shërbimit të dializës nga të dhënat evidentojmë se janë ofruar 60,719 seanca dialize nga 65,520 seanca që ishte parashikuar si projeksion për vitin 2021. E shprehur në terma financiare të dhënat tregojnë se për mbulimin e këtij shërbimi ishte planifikuar një shumë prej 754,000,000 lekësh me TVSH, nga të cilat janë paguar në total 747,195,290 lekë me TVSH. Nga raporti del se ofrimi i këtij shërbimi me Koncesion ka sjellë një sërë përfitimesh për qytetarët shqiptarë. Duhet theksuar se para vitit 2016, 65% e shërbimit ofrohej në spitalet jopublike dhe vetëm 35% e shërbimit në spitalet publike me një tarifë 90 Euro për seancë, ku shteti paguante edhe transportin. Për një pacient nga Korça që kishte nevojë për këtë shërbim kostoja që duhet të paguante shteti vetëm për transportin ishte 8 Euro në ditë ose 1,250 Euro në vit. Ndërkohë që sot falë këtij ndërveprimi shteti paguan një tarifë unike 80 Euro dhe e ofron shërbimin për

<sup>33</sup> Informacioni për ecurinë vjetore të kontratave koncesionare/PPP për vitin 2021 të sektorit të shëndetësisë është raportuar dhe konfirmuar nga ana e Autoritetit Kontraktues, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

qytetarët afër vendbanimit në kohë dhe cilësi maksimale. Numri i pacientëve përfitues të paketës së dializës në spitalet publike, jo publike dhe falë partneritetit publik privat të hemodializës është rreth 1,340 pacientë.

❖ **Tabela 16: Numri i përfituesve dhe seancave të realizuara**

Viti	2019		2020		2021	
	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt
Nr. Përfituesve (përfitues /muaj)	370	398	394	420	420	411
Nr.Seancave	57,720	57,809	61,464	62,020	65,520	60,719

❖ **Risqet**

Kjo kontratë koncesioni ka alokuar riskun sipas parimit të palës që menaxhon më mirë. Tek pala private janë alokuar risku i ndërtimit, risku i operimit dhe performancës dhe risku i transferimit të aseteve, ndërsa palës publike i janë alokuar risku financiar, risku i ndryshimeve ligjore, risku material nga vendimet politike dhe riskun e ribalancimit të ekuilibrit financiar. Ndërkohë janë ndarë mes palëve risku i rinegocimit, risku i përfundimit të kontratës, risku i lejeve dhe licencave, forca madhore dhe risku i kërkesës. Gjithashtu, pavarësisht materializimit të riskut të forcës madhore, si rezultat i Pandemisë Covid-19, kjo kontratë koncesioni ka vijuar normalisht ofrimin e shërbimit të hemodializës.

**19. Kontratë Koncesioni/PPP “Për ofrimin e shërbimeve laboratorike mjekësore”<sup>34</sup>**

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, rinovimi, pajisja, riorganizimi dhe funksionimi i shoqërisë koncesionare për ofrimin e shërbimit laboratorik të spitaleve universitare, rajonale, dhe atyre bashkiake. Kjo kontratë ka nisur funksionimin e saj më datë 2 Nëntor 2020 në Qendrën Universitare Spitalore “Nënë Tereza”. Referuar raportimeve dhe konfirmimit të Autoritetit Kontraktues, aktualisht ka filluar shërbimi në të gjitha spitalet universitare në vend, në spitalet rajonale të Durrësit, elbabsanit, Shkodrës, Fierit, Beratit, Korçës, Lezhës dhe spitalin bashkiak Lushnjë.

- **Autoriteti Kontraktues:** Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
- **SPV:** “Labopharma” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 1,31 miliardë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 10 Prill 2019
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 10 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i Kërkuar

Gjatë vitit 2021 nga të dhënat e raportuara nga Autoriteti Kontraktues:

Shërbimi i laboratorëve është ofruar për 14 Spitale Referuese. E shprehur në terma financiare të dhënat tregojnë se për mbulimin e këtij shërbimi Qeveria Shqiptare kishte planifikuar një shumë prej 1,137,845 lekësh me TVSH, nga të cilat janë paguar në total 1,103,199 lekë me TVSH. Përfitimet e marra nga ky shërbim janë të shumta pasi kur shërbimi ofrohej nga spitalet gama e analizave në spitalet universitare ishte deri në 100, ndërsa sot janë 164 ekzaminime. Sa i takon spitaleve rajonale, kjo gamë ishte akoma më e ulët, një paketë bazë me rreth 50-70 ekzaminime, ndërsa sot janë 164 ekzaminime. Kjo kontratë koncesioni ka sjellë një standard të ri në digjitalizimin e informacionit nëpërmjet ngritjes për herë të parë të sistemit të kompjuterizuar të të gjithë analizave laboratorike, sistem ky që do të jetë i shtrirë në të 18 spitalet publike që janë pjesë e rrjetit të shërbimit të ri të laboratorit. Përfshirja e këtij sistemi, krijon më shumë lehtësi për të certifikuar analizat dhe garanton ofrimin e këtij shërbimi në nivel terciar në të 11 spitalet rajonale dhe 2 spitalet bashkiake atë të Sarandës dhe Lushnjës, duke çrrënjësuar te qytetarët idenë se vetëm në spitale terciare apo ato private merret shërbim cilësor dhe duke e sjellë shërbimin e një cilësie sipas standardeve më të mira ndërkombëtare pranë qytetarëve.

<sup>34</sup> Informacioni për ecurinë vjetore të kontratave koncesionare/PPP për vitin 2021 të sektorit të shëndetësisë është raportuar dhe konfirmuar nga ana e Autoritetit Kontraktues, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

❖ **Tabela 17: Pagesat Buxhetore për projektin “Për ofrimin e shërbimeve laboratorike mjekësore”**

<i>Viti</i>	<i>2021</i>	
	<i>Plan</i>	<i>Fakt</i>
<i>Pagesat Buxhetore (në mijë Lekë)</i>	<i>1,137,845</i>	<i>1,103,199</i>

❖ **Risqet**

Në lidhje me risqet që rrjedhin nga zbatimi i kontratës koncesionare, tek pala private janë transferuar risku i ndërtimit, risku i operimit dhe performancës, risku i transferimit të aseteve, ndërsa risku i ndryshimeve ligjore, risku material nga vendimet politike, risku financiar i janë alokuar palës publike. Ndërkohë janë ndarë mes palëve risku i kërkesës, risku i forcës madhore, risku i rinegocimit, risku i ndërprerjes së kontratës dhe risku i lejeve dhe licencave.

## SEKTORI I ENERJITIKËS<sup>35</sup>

Gjatë viteve 2005-2013, në kuadër të privatizimit të HEC-eve vendore një numër hidrocentralësh të vegjël u privatizuan dhe disa të tjerë iu dhanë kompanive të huaja dhe vendase përmes kontratave koncesionare të tipit ROT, BOT dhe BOO. Qëllimi i këtyre kontratave ishte rehabilitimin i HEC-eve ekzistuese, operimi i tyre dhe më pas transferimi tek shteti. Sipas raportimeve periodike të përcjella dhe të konfirmuara nga Autoriteti Kontraktues, aktualisht janë 183 kontrata koncesionare në fushën e hidroenergjisë, ku rreth 66% e tyre janë aktive, respektivisht 24 prej tyre janë në fazën e investimit, 99 kontrata koncesioni/PPP janë në fazën e prodhimit. Dy kontratat më të mëdha koncesionare të miratuara janë “Hidrocentrali i Ashtës” dhe “Kaskada e hidrocentralit të Devollit”. Duke qënë se sektori i hidroenergjisë përmban një portofol të madh të kontratave koncesionare, në këtë raport për vitin 2021 është paraqitur informacion për kontratat për të cilat informacioni i raportuar është më i plotë nga Autoriteti Kontraktues. Në vijim synohet paraqitja e informacionit për të gjitha kontratat e koncesionit në këtë sektor.

### 20. Kontrata Koncesionare/PPP “Për projektimin, financimin, ndërtimin, pronësinë, shfrytëzimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e Hidrocentralit Ashta”<sup>36</sup>

Objekti i kontratës së koncesionit/PPP është projektimi, financimi, ndërtimi, marrja në pronësi, shfrytëzimi, mirëmbajtja dhe transferimi i Hidrocentralit të Ashtës. Kontrata koncesionare ka parashikuar ndërtimin e 2 hidrocentraleve dhe konkretisht Ashta 1 dhe Ashta 2.

Referuar raportimeve dhe Konfirmimit të Autoritetit Kontraktues, aktualisht ky projekt është në fazën e operimit që prej fundit të vitit 2012. Realizimi i investimit të këtij projekti është finalizuar brenda afateve kohore të parashikuara në marrëveshjen mes palëve, përkatësisht ndërtimi është realizuar në

periudhën kohore 2010-2012. Prodhimi i energjisë elektrike nga HEC Ashta 1,2, bëhet me planifikim dhe sipas regjimit të shkarkimit nga KESH sh.a. Për këtë projekt është nënshkruar fillimisht me KESH më pas me OSHEE, një marrëveshje për shitjen e energjisë elektrike. Kjo marrëveshje është nënshkruar në 2016, pas ndryshimeve ligjore dhe nënligjore në sektorin e energjisë elektrike, ku detyrimi për blerjen e energjisë elektrike nga prodhuesit me përparësi kaloi nga KESH sh.a. tek OSHEE sh.a. (pika G e kësaj marrëveshje). Kjo marrëveshje vjen në vijim të marrëveshjes së nënshkruar më datë 28.03.2013 (pika F), dhe do të jetë e vlefshme për një periudhë 15 vjeçare nga momenti i nënshkrimit (28.03.2028) (pika E).

Në bazë të marrëveshjes koncesionare, energjia e prodhuar nga Hidrocentral Ashta 1, 2 nuk duhet të jetë më pak se 165,000,000 KWH/vit, ndërkohë ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si më poshtë:

- **Autoriteti Kontraktues:** METE (sot MIE)
- **SPV:** “Energji Ashta” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 19,5 miliardë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 22 Tetor 2008
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i pakërkuar

<sup>35</sup> Informacioni për ecurinë e kontratave koncesionare/PPP të sektorit të energjitikës është hartuar sipas raportimeve të Autoritetit Kontraktues bazuar në informacionin e konfirmuar të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Ujore (AKBN), e cila sqaron Autoritetin Kontraktues se AKBN përcjell informacionin e raportuar bazuar në informacionet dhe dokumentacionet e raportuara nga shoqëritë koncesionare për atë periudhë. Raportimi nga ana e shoqërive koncesionare në përgjithësi përditësohet në vijimësi për periudhat kohore të mëparshme, prandaj sqaron AKBN se, nëse do të ketë përditësime dhe rishikime të informacionit të konfirmuar zyrtarisht në këtë Raport Vjetor të Përmbledhur për vitin 2021, do të përcillet prej tyre në raportimet e mëvonshme të Autoritetit Kontraktues për reflektim të informacionit.

<sup>36</sup> Informacioni për ecurinë e kontratave koncesionare/PPP të sektorit të energjitikës është hartuar sipas raportimeve të Autoritetit Kontraktues bazuar në informacionin e konfirmuar të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Ujore (AKBN).

❖ *Tabela 18: Sasia e energjisë së prodhuar (në KWh/Vit)*

Viti	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sasia e energjisë	200,992,000	235,604,000	276,604,000	174,526,000	298,107,000	191,495,000	187,222,000	295,245,000

❖ **Risqet**

Në lidhje me risqet që rrjedhin nga zbatimi i kontratës koncesionare, tek pala private janë transferuar: risku i ndërtimit, risku financiar, risku i operimit dhe performancës dhe risku i transferimit të asetëve, ndërsa risku i qeverisjes, risku i ndryshimeve ligjore dhe risku material nga vendimet politike i janë alokuar palës publike. Ndërkohë janë ndarë mes palëve risku i forcës madhore, risku i rinegocimit dhe risku i ndërprerjes së kontratës. Gjatë zbatimit të kontratës nuk ka patur materializim të risqeve, dhe aktualisht Autoriteti përgjegjës për monitorimin e kësaj kontrate ka raportuar probabilitetet të ulët të ndodhjes së risqeve.

### 21. Kontrata Koncesionare/PPP “Për projektimin financimin, ndërtimin, marrjen në pronësi, shfrytëzimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e projektit të hidrocentralit në lumin Devoll”<sup>37</sup>

Objekti i kësaj kontrate koncesioni/PPP është projektimi financimi, ndërtimi, marrja në pronësi, shfrytëzimi, mirëmbajtja dhe transferimi i projektit të hidrocentralit në lumin Devoll. Ky projekt synon ndërtimin, shfrytëzimin, mirëmbajtjen dhe transferimin në fund tek Autoriteti Kontraktues të hidrocentraleve HEC Banjë dhe HEC Moglicë. Në këtë kontratë koncesioni është bërë një shtesë më datë 18.12.2014 “Për projektimin dhe ndërtimin e infrastrukturës zëvendësuese të Moglicës”, me anën e së cilës koncesionari ka marrë përsipër të projektojë, ndërtojë infrastrukturën zëvendësuese kundrejt një kompensimi nga buxheti i shtetit. Ndërtimi i

- **Autoriteti Kontraktues:** METE (sot MIE)
- **SPV:** Devoll Hydropower sh.a
- **Vlera e Investimit:** 130 miliardë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 17 Mars 2009
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i Pakërkuar

infrastrukturës zëvendësuese është realizuar plotësisht dhe pagesat buxhetore për këtë shtesë kanë përfunduar në Shtator 2019. Gjatë vitit 2019-2020 është realizuar 100% e vlerës totale të investimit. Referuar raportimeve dhe konfirmimit të Autoritetit Kontraktues, aktualisht janë në fazën e prodhimit të energjisë të dy HEC-et. Referuar kontratës së koncesionit/PPP shteti shqiptar nuk e ka detyrim blerjen e energjisë elektrike të prodhuar nga shoqëria koncesionare Devoll Hydropower sh.a. Në bazë të marrëveshjes koncesionare, energjia e prodhuar nga Hec Banja nuk duhet të jetë më pak se 255,000,000 KWh/vit. Në bazë të marrëveshjes koncesionare, energjia e prodhuar nga HEC Moglica nuk duhet të jetë më pak se 534,000,000 KWh/vit.

Ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga dy Hec-et që nga viti i fillimit të prodhimit është si më poshtë:

❖ *Tabela 19: Sasia e energjisë së prodhuar (në KWh/Vit)*

Viti	2017	2018	2019	2020	2021
Benje	140,866,000	292,561,000	132,699,000	134,044,000	249,476,000
Moglice	-	-	-	160,110,000	408,435,000

<sup>37</sup> Informacioni për ecurinë e kontratave koncesionare/PPP të sektorit të energjitikës është hartuar sipas raportimeve të Autoritetit Kontraktues bazuar në informacionin e konfirmuar të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Ujore (AKBN).

## ❖ Risqet

Autoriteti ka raportuar në lidhje me risqet e kontratës sipas formatit të përcaktuar, duke specifikuar përcaktimin e palës që merr përsipër riskun, impaktin fiskal nëse është materializuar, probabilitetin e ndodhjes në të ardhmen dhe impaktin e pritshëm nëse ndodh. Në lidhje me risqet që rrjedhin nga zbatimi i kontratës koncesionare, tek pala private janë transferuar risku i ndërtimit, risku financiar, risku i operimit dhe performancës dhe risku i transferimit të aseteve, ndërsa risku i qeverisjes, risku i ndryshimeve ligjore dhe risku material nga vendimet politike i janë alokuar palës publike, të cilat Autoriteti i ka kategorizuar si risqe me probabilitet të ulët për tu materializuar në të ardhmen. Ndërkohë janë ndarë mes palëve risku i forcës madhore, risku i rinegociimit dhe risku i ndërprerjes së kontratës.

## 22. Kontratë koncesioni/PPP “Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentraleve Prellë 1 dhe Prellë 2”<sup>38</sup>

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve ‘Prellë 1’ dhe ‘Prellë 2’, si dhe transferimi nga shoqëria koncesionare tek Autoriteti Kontraktues. Kjo kontratë koncesioni është në fazën e zbatimit që prej vitit 2017. Deri në fund të vitit 2016, realizimi i investimeve nga ana e shoqërisë koncesionare ka qenë në masën 55% të vlerës totale të parashikuar në kontratë. Në bazë të marrëveshjes koncesionare, energjia e prodhuar nga hidrocentralet nuk duhet të jetë më pak se 48,900,000 kWh/vit, ndërkohë ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si më poshtë:

- **Autoriteti Kontraktues:** METE (sot MIE)
- **SPV:** Prell Energy sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 1.51 miliardë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 4 Gusht 2008
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i pakërkuar

### ❖ Tabela 20: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)

Viti	2017	2018	2019	2020	2021
Sasia e energjisë	24,794,958	41,956,588	31,596,853	22,279,817.36	43,066,375

## ❖ Risqet

Lidhur me risqet e kësaj kontrate Autoriteti Kontraktues në raportimet e tij të dërguara periodikisht pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, nuk ka përcjellë informacion apo evidentuar për materializimin e ndonjë risku të mundshëm. Megjithatë Autoriteti Kontraktues ka vlerësuar pozitivisht ecurinë e kësaj kontrate koncesioni në përputhje me detyrimet kontraktuale.

<sup>38</sup> Informacioni për ecurinë e kontratave koncesionare/PPP të sektorit të energjitikës është hartuar sipas raportimeve të Autoritetit Kontraktues bazuar në informacionin e konfirmuar të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Ujore (AKBN).

### 23. Kontratë koncesioni/PPP “Ndërtim, shfrytëzim dhe transferim të Hidrocentraleve Lura 1, 2 dhe 3”

Objekti i kontratës së koncesionit është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja, prodhimi dhe shitja e energjisë elektrike në hidrocentralet Lura 1, Lura 2, Lura 3, si dhe transferimi tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të kohëzgjatjes së kontratës. Referuar raportimeve dhe konfirmimit të Autoritetit Kontraktues, aktualisht kjo kontratë koncesioni është në zbatim. Pas përfundimit të punimeve ndërtimore në vitin 2012 sipas parashikimeve kontraktuale, në vitin 2013 shoqëria koncesionare vendosi në funksionim hidrocentralin për prodhimin e energjisë elektrike.

Në bazë të marrëveshjes koncesionare, energjia e prodhuar nga hidrocentralet nuk duhet të jetë më pak se 53,308,264 kWh/vit, ndërkohë ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si më poshtë:

❖ *Tabela 21: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)*

Viti	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sasia e energjisë	53,296,000	41,625,890	39,960,936	49,252,118	29,182,802	48,079,191	34,265,264	28,275,308	48,247,511

#### ❖ *Risqet*

Lidhur me risqet e kësaj kontrate Autoriteti Kontraktues në raportimet e tij të dërguara periodikisht pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, nuk ka përcjellë informacion apo evidentuar për materializimin e ndonjë risku të mundshëm. Megjithatë Autoriteti Kontraktues ka vlerësuar pozitivisht ecurinë e kësaj kontrate koncesioni në përputhje me detyrimet kontraktuale.

### 24. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Bistrice 3 dhe 4”<sup>39</sup>

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve Bistrice 3 dhe 4 mbi lumin Bistrice, fshati Krane, rrethi Sarandë. Në fund të periudhës koncesionare objekti do të transferohet tek Autoriteti Kontraktues.

Referuar raportimeve dhe konfirmimit të Autoritetit Kontraktues, aktualisht vetëm hidrocentrali Bistrice 3 është në fazë shfrytëzimi (prodhimi energjie elektrike) që prej vitit 2016, ndërsa hidrocentrali Bistrice 4 nuk është

ndërtuar ende. Deri në vitin 2015, nga ana e shoqërisë koncesionare janë realizuar 57% e vlerës totale të investimit. Në bazë të marrëveshjes koncesionare, energjia e prodhuar nga hidrocentral Bistrice 3 duhet të jetë 12,750,000 kWh/vit, ndërsa hidrocentral Bistrice 4 duhet të prodhojë 10,902,000 kWh/vit. Ndërkohë ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga hidrocentral Bistrice 3 ndër vite është si më poshtë:

- **Autoriteti Kontraktues:** METE (sot MIE)
- **SPV:** “Erdat” Lura sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 1.3 miliardë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 09 Maj 2008
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i pakërkuar

- **Autoriteti Kontraktues:** METE (sot MIE)
- **SPV:** ‘Bistrice 3’ sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 756.4 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 19 Maj 2008
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i pakërkuar

<sup>39</sup> Informacioni për ecurinë e kontratave koncesionare/PPP të sektorit të energjitikës është hartuar sipas raportimeve të Autoritetit Kontraktues bazuar në informacionin e konfirmuar të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Ujore (AKBN).

❖ *Tabela 22: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)*

Viti	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sasia e energjisë	10,104,204	8,3446,166	9,357,579	8,081,232	7,281,864.00	9,061,830

❖ **Risqet**

Lidhur me risqet e kësaj kontrate Autoriteti Kontraktues në raportimet e tij të dërguara periodikisht pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, nuk ka përcjellë informacion apo evidentuar për materializimin e ndonjë risku të mundshëm. Megjithatë Autoriteti Kontraktues ka vlerësuar pozitivisht ecurinë e kësaj kontrate koncesioni në përputhje me detyrimet kontraktuale.

**25. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Ballenjë”<sup>40</sup>**

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentralit dhe transferimi i tij nga Koncesionari tek Autoriteti Kontraktues.

Referuar raportimeve dhe konfirmimit të Autoritetit Kontraktues, aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentrali është në fazë prodhimi energjie që nga viti 2016, pas përfundimit të investimeve nga ana e shoqërisë koncesionare.

Në bazë të marrëveshjes koncesionare, energjia e prodhuar nga hidrocentralet duhet të jetë mesatarisht 4,197,824 kWh/vit, ndërkohë ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si më poshtë:

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** “Ballenja Power Martanesh” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 138.3 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 03 Shtator 2013
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i pakërkuar

❖ *Tabela 23: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)*

Viti	2017	2018	2019	2020	2021
Sasia e energjisë	1,943,354	4,025,458	3,618,526	2,380,560	3,943,401

❖ **Risqet**

Lidhur me risqet e kësaj kontrate Autoriteti Kontraktues në raportimet e tij të dërguara periodikisht pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, nuk ka përcjellë informacion apo evidentuar për materializimin e ndonjë risku të mundshëm. Megjithatë Autoriteti Kontraktues ka vlerësuar pozitivisht ecurinë e kësaj kontrate koncesioni në përputhje me detyrimet kontraktuale.

<sup>40</sup> Informacioni për ecurinë e kontratave koncesionare/PPP të sektorit të energjitikës është hartuar sipas raportimeve të Autoritetit Kontraktues bazuar në informacionin e konfirmuar të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Ujore (AKBN).

## 26. Kontratë Koncesioni/PPP “Kontratë për ndërtimin, shfrytëzimin dhe transferimin e hidrocentralit Bishnica 1,2”<sup>41</sup>

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve Bishnica 1 dhe Bishnica 2 dhe transferimi i tij nga Koncesionari tek Autoriteti Kontraktues.

Referuar raportimeve dhe konfirmimit të Autoritetit Kontraktues, aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentrali ndodhet në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2010.

Në bazë të marrëveshjes koncesionare, energjia e prodhuar nga hidrocentralet duhet të jetë 12,910,000 kWh/vit, ndërkohë ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si më poshtë:

❖ *Tabela 24: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)*

Viti	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sasia e energjisë	11,336,056	10,608,056	11,256,592	12,677,681	8,165,089	10,739,180	9,044,954	7,751,171	11,845,233

### ❖ Risqet

Lidhur me risqet e kësaj kontrate Autoriteti Kontraktues në raportimet e tij të dërguara periodikisht pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, nuk ka përcjellë informacion apo evidentuar për materializimin e ndonjë risku të mundshëm. Megjithatë Autoriteti Kontraktues ka vlerësuar pozitivisht ecurinë e kësaj kontrate koncesioni në përputhje me detyrimet kontraktuale.

## 27. Kontratë Koncesioni/PPP “Kontratë për ndërtimin, shfrytëzimin dhe transferimin e hidrocentraleve Çekrezë 1 dhe Çekrezë 2”<sup>42</sup>

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve si dhe transferimi i tij nga Koncesionari tek Autoriteti Kontraktues.

Referuar raportimeve dhe konfirmimit të Autoritetit Kontraktues, aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentrali ndodhet në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2014.

Në bazë të marrëveshjes koncesionare, energjia e prodhuar nga hidrocentralet duhet të jetë 2,667,137 kWh/vit, ndërkohë ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si më poshtë:

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** “Bishnica 1,2” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 250 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 06 Tetor 2008
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i pakërkuar

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** “Zall Herr Energji 2011” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 123.8 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 27 Dhjetor 2011
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i Pakërkuar

<sup>41</sup> Informacioni për ecurinë e kontratave koncesionare/PPP të sektorit të energjistikës është hartuar sipas raportimeve të Autoritetit Kontraktues bazuar në informacionin e konfirmuar të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Ujore (AKBN).

<sup>42</sup> Informacioni për ecurinë e kontratave koncesionare/PPP të sektorit të energjistikës është hartuar sipas raportimeve të Autoritetit Kontraktues bazuar në informacionin e konfirmuar të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Ujore (AKBN).

❖ *Tabela 25: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)*

Viti	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sasia e energjisë	4,283,160	12,314,097	4,223,727	4,259,037	4,280,935	4,305,772.00	4,329,466

❖ **Risqet**

Lidhur me risqet e kësaj kontrate Autoriteti Kontraktues në raportimet e tij të dërguara periodikisht pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, nuk ka përcjellë informacion apo evidentuar për materializimin e ndonjë risku të mundshëm. Megjithatë Autoriteti Kontraktues ka vlerësuar pozitivisht ecurinë e kësaj kontrate koncesioni në përputhje me detyrimet kontraktuale.

### 28. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi, mirëmbajtja dhe transferimi i hidrocentraleve të kaskadës së lumit Dardhë.”<sup>43</sup>

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve dhe transferimi i tij nga Koncesionari tek Autoriteti Kontraktues.

Referuar raportimeve dhe konfirmimit të Autoritetit Kontraktues, aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentrali ndodhet në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2012.

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** WEnerg sh.a.
- **Vlera e Investimit:** 907,6 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 18 Gusht 2009
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i Pakërkuar

Në bazë të marrëveshjes koncesionare, energjia e prodhuar nga hidrocentralet duhet të jetë 21,690,000 kWh/vit, ndërkohë ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si më poshtë:

❖ *Tabela 26: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)*

Viti	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sasia e energjisë	15,763,807	14,967,741	9,293,436	13,207,710	11,328,690	9,809,794	8,838,463	7,588,643	11,872,459

❖ **Risqet**

Lidhur me risqet e kësaj kontrate Autoriteti Kontraktues në raportimet e tij të dërguara periodikisht pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, nuk ka përcjellë informacion apo evidentuar për materializimin e ndonjë risku të mundshëm. Megjithatë Autoriteti Kontraktues ka vlerësuar pozitivisht ecurinë e kësaj kontrate koncesioni në përputhje me detyrimet kontraktuale.

<sup>43</sup> Informacioni për ecurinë e kontratave koncesionare/PPP të sektorit të energjitikës është hartuar sipas raportimeve të Autoritetit Kontraktues bazuar në informacionin e konfirmuar të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Ujore (AKBN).

## 29. Kontratë koncesioni/PPP “Kontratë për ndërtimin, shfrytëzimin dhe transferimin e hidrocentralit Denas”<sup>44</sup>

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentralit dhe transferimi i tij nga Koncesionari tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të kontratës koncesionare.

Referuar raportimeve dhe konfirmimit të Autoritetit Kontraktues, aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentrali ndodhet në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2018.

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** “Denas Power” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 936 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 03 Prill 2013
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i Pakërkuar

Në bazë të marrëveshjes koncesionare, energjia e prodhuar nga hidrocentralet duhet të jetë 52,674,144 kWh/vit, ndërkohë ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si më poshtë:

❖ *Tabela 27: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)*

Viti	2018	2019	2020	2021
Sasia e energjisë	7,459,271	30,258,408	20,890,595	43,701,597

### ❖ Risqet

Lidhur me risqet e kësaj kontrate Autoriteti Kontraktues në raportimet e tij të dërguara periodikisht pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, nuk ka përcjellë informacion apo evidentuar për materializimin e ndonjë risku të mundshëm. Megjithatë Autoriteti Kontraktues ka vlerësuar pozitivisht ecurinë e kësaj kontrate koncesioni në përputhje me detyrimet kontraktuale.

## 30. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Dobrenje-Tomorrice, në Përroin e Hijes, Skrapar”<sup>45</sup>

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentralit dhe transferimi i tij nga Koncesionari tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të kontratës koncesionare, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Referuar raportimeve dhe konfirmimit të Autoritetit Kontraktues, aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentrali ndodhet në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2018.

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** “Daab Energy Group” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 106.7 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 06 Shtator 2013
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Në prodhim
- **Forma:** Propozim i Pakërkuar

Në bazë të marrëveshjes koncesionare, energjia e prodhuar nga hidrocentralet duhet të jetë 7,479,080 kWh/vit, ndërkohë ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si më poshtë:

<sup>44</sup> Informacioni për ecurinë e kontratave koncesionare/PPP të sektorit të energjitikës është hartuar sipas raportimeve të Autoritetit Kontraktues bazuar në informacionin e konfirmuar të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Ujore (AKBN).

<sup>45</sup> Informacioni për ecurinë e kontratave koncesionare/PPP të sektorit të energjitikës është hartuar sipas raportimeve të Autoritetit Kontraktues bazuar në informacionin e konfirmuar të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Ujore (AKBN).

❖ *Tabela 28: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)*

Viti	2018	2019	2020	2021
Sasia e energjisë	581,000	3,293,500	3,223,500	4,781,000

❖ **Risqet**

Lidhur me risqet e kësaj kontrate Autoriteti Kontraktues në raportimet e tij të dërguara periodikisht pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, nuk ka përcjellë informacion apo evidentuar për materializimin e ndonjë risku të mundshëm. Megjithatë Autoriteti Kontraktues ka vlerësuar pozitivisht ecurinë e kësaj kontrate koncesioni në përputhje me detyrimet kontraktuale.

**31. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Fterre dhe Fterre 1”<sup>46</sup>**

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, planifikimi, ndërtimi, testimi, kolaudimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e kaskadës së hidrocentraleve në lumin Borsh dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga shoqëria koncesionare tek Autoriteti Kontraktues.

Referuar raportimeve dhe konfirmimit të Autoritetit Kontraktues, aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentrali ndodhet në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2012. Gjatë periudhës 2010-2014 janë realizuar 97% e punimeve nga ana e shoqërisë koncesionare.

Në bazë të marrëveshjes koncesionare, energjia e prodhuar nga hidrocentralet duhet të jetë 19,300,000 kWh/vit, ndërkohë ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si më poshtë:

❖ *Tabela 29: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)*

Viti	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sasia e energjisë	13,842,150	11,486,475	10,599,697	31,645,343	6,069,181	11,015,411	7,480,667	7,252,108	10,096,242

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** “HydroBorsh” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 650.5 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 31 Gusht 2009
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i Pakërkuar

❖ **Risqet**

Lidhur me risqet e kësaj kontrate Autoriteti Kontraktues në raportimet e tij të dërguara periodikisht pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, nuk ka përcjellë informacion apo evidentuar për materializimin e ndonjë risku të mundshëm. Megjithatë Autoriteti Kontraktues ka vlerësuar pozitivisht ecurinë e kësaj kontrate koncesioni në përputhje me detyrimet kontraktuale.

<sup>46</sup> Informacioni për ecurinë e kontratave koncesionare/PPP të sektorit të energjitikës është hartuar sipas raportimeve të Autoritetit Kontraktues bazuar në informacionin e konfirmuar të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Ujore (AKBN).

### 32. Kontratë Koncesioni/PPP “Kontratë për ndërtimin,shfrytëzimin dhe transferimin e hidrocentralit Hurdhas 1, 2, 3”<sup>47</sup>

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve ‘Hurdhas 1’, ‘Hurdhas 2’ dhe ‘Hurdhas 3’, si dhe transferimi i tyre nga ana e shoqërisë koncesionare tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të afatit të kontratës.

Referuar raportimeve dhe konfirmimit të Autoritetit Kontraktues, aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentrali ndodhet në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2015. Gjatë periudhës 2011-2019 janë realizuar rreth 50% e punimeve nga ana e shoqërisë koncesionare. Në bazë të marrëveshjes koncesionare, energjia e prodhuar nga hidrocentralet duhet të jetë 13,350,792 kWh/vit, ndërkohë ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si më poshtë:

- **Autoriteti Kontraktues:** METE (sot MIE)
- **SPV:** “Hydro Power Plant Construction” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 200 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 1 Shtator 2009
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i Pakërkuar

❖ **Tabela 30: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)**

Viti	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sasia e energjisë	2,821,694	4,988,801	3,063,191	7,241,365	5,987,867	6,015,674	8,718,129

#### ❖ Risqet

Raportimi në lidhje me risqet e kësaj kontrate koncesioni nuk është i plotë. Ndikimi i forcave madhore në kontratat e koncesionit për ndërtimin e veprave hidroenergjitike, justifikon palët ndaj çdo lloj përgjegjësie. Ndikimi i këtij risku në realizimin e shërbimit parashikohet në kontratat e koncesionit dhe nuk sjell kosto për qeverinë. Autoriteti Kontraktues ka vlerësuar pozitivisht ecurinë e kësaj kontrate koncesioni.

### 33. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Gavran dhe Gavran 1”<sup>48</sup>

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve ‘Gavran’ dhe ‘Gavran 1’, si dhe transferimi i tyre nga ana e shoqërisë koncesionare tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të afatit të kontratës.

Referuar raportimeve dhe konfirmimit të Autoritetit Kontraktues, aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentrali ndodhet në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2017. Në bazë të marrëveshjes koncesionare, energjia e prodhuar nga

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** “Gavran Energy”
- sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 164,3 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 05 Gusht 2013
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i Pakërkuar

<sup>47</sup> Informacioni për ecurinë e kontratave koncesionare/PPP të sektorit të energjitikës është hartuar sipas raportimeve të Autoritetit Kontraktues bazuar në informacionin e konfirmuar të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Ujore (AKBN).

<sup>48</sup> Informacioni për ecurinë e kontratave koncesionare/PPP të sektorit të energjitikës është hartuar sipas raportimeve të Autoritetit Kontraktues bazuar në informacionin e konfirmuar të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Ujore (AKBN).

hidrocentralet duhet të jetë 9,275,797 kWh/vit, ndërkohë ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si më poshtë:

❖ *Tabela 31: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)*

Viti	2017	2018	2019	2020	2021
Sasia e energjisë	2,895,017	5,523,766	4,167,219	3,251,339	5,772,543

#### ❖ Risqet

Raportimi në lidhje me risqet e kësaj kontrate koncesioni nuk është i plotë. Ndikimi i forcave madhore në kontratat e koncesionit për ndërtimin e veprave hidroenergjitike, justifikon palët ndaj çdo lloj përgjegjësie. Ndikimi i këtij risku në realizimin e shërbimit parashikohet në kontratat e koncesionit dhe nuk sjell kosto për qeverinë. Autoriteti Kontraktues ka vlerësuar pozitivisht ecurinë e kësaj kontrate koncesioni.

### 34. Kontratë koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Kacni”<sup>49</sup>

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentralit Kacni, rrethi Dibër, si dhe transferimi i tij nga ana e shoqërisë koncesionare tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të afatit të kontratës.

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** “Kisi Bioenergji” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 133,1 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 05 Maj 2008
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim

Referuar raportimeve dhe konfirmimit të Autoritetit Kontraktues, aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentrali ndodhet në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2015. Gjatë periudhës

2013-2015 janë realizuar 100% e punimeve nga ana e shoqërisë koncesionare. Në bazë të marrëveshjes koncesionare, energjia e prodhuar nga hidrocentralet duhet të jetë 16,823,283 kWh/vit, ndërkohë ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si më poshtë:

❖ *Tabela 32: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)*

Viti	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sasia e energjisë	6,900,390	3,737,340	7,319,400	3,938,730	3,824,460	6,423,810

#### ❖ Risqet

Raportimi në lidhje me risqet e kësaj kontrate koncesioni nuk është i plotë. Ndikimi i forcave madhore në kontratat e koncesionit për ndërtimin e veprave hidroenergjitike, justifikon palët ndaj çdo lloj përgjegjësie. Ndikimi i këtij risku në realizimin e shërbimit parashikohet në kontratat e koncesionit dhe nuk sjell kosto për qeverinë. Autoriteti Kontraktues ka vlerësuar pozitivisht ecurinë e kësaj kontrate koncesioni.

<sup>49</sup> Informacioni për ecurinë e kontratave koncesionare/PPP të sektorit të energjitikës është hartuar sipas raportimeve të Autoritetit Kontraktues bazuar në informacionin e konfirmuar të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Ujore (AKBN).

### 35. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Gojan, Gjegjan, Peshqesh, Ura e Fanit, Fangu”<sup>50</sup>

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve Gojan, Gjegjan, Peshqesh, Ura e Fanit dhe Fangu në rrethin e Pukës dhe Matit, si dhe transferimi i tyre nga ana e shoqërisë koncesionare tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të afatit të kontratës. Referuar raportimeve dhe konfirmimit të Autoritetit Kontraktues, aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentralet ndodhen në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2017.

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** “Ayen As Energy” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 16.3 miliardë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 02 Maj 2011
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i pakërkuar

Në bazë të marrëveshjes koncesionare, energjia e prodhuar nga hidrocentralet duhet të jetë 347,246,000 kWh/vit, ndërkohë ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si më poshtë:

❖ **Tabela 33: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)**

Viti	2017	2018	2019	2020	2021
Sasia e energjisë	126,626,343	342,302,601	262,401,050	189,769,620	341,693,250

#### ❖ Risqet

Raportimi në lidhje me risqet e kësaj kontrate koncesioni nuk është i plotë. Ndikimi i forcave madhore në kontratat e koncesionit për ndërtimin e veprave hidroenergjitike, justifikon palët ndaj çdo lloj përgjegjësie. Ndikimi i këtij risku në realizimin e shërbimit parashikohet në kontratat e koncesionit dhe nuk sjell kosto për qeverinë. Autoriteti Kontraktues ka vlerësuar pozitivisht ecurinë e kësaj kontrate koncesioni.

### 36. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Kasollet e Selcës”<sup>51</sup>

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve me vendodhje në pellgun ujëmbledhës të lumit Selcë, si dhe transferimi i tyre nga ana e shoqërisë koncesionare tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të afatit të kontratës.

Referuar raportimeve dhe konfirmimit të Autoritetit Kontraktues, aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentralet ndodhen në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2017.

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** Xhengo Energji sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 526.3 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 29 Gusht 2013
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i pakërkuar

Gjatë periudhës 2016-2017 janë realizuar rreth 97% e punimeve nga ana e shoqërisë koncesionare. Në bazë të

<sup>50</sup> Informacioni për ecurinë e kontratave koncesionare/PPP të sektorit të energjitikës është hartuar sipas raportimeve të Autoritetit Kontraktues bazuar në informacionin e konfirmuar të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Ujore (AKBN).

<sup>51</sup> Informacioni për ecurinë e kontratave koncesionare/PPP të sektorit të energjitikës është hartuar sipas raportimeve të Autoritetit Kontraktues bazuar në informacionin e konfirmuar të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Ujore (AKBN).

marrëveshjes koncesionare, energjia e prodhuar nga hidrocentralet duhet të jetë 17,471,887 kWh/vit, ndërkohë ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si më poshtë:

❖ *Tabela 34: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)*

Viti	2017	2018	2019	2020	2021
Sasia e energjisë	1,145,000	10,881,817	8,590,908	7,114,089.80	11,454,544

### ❖ Risqet

Raportimi në lidhje me risqet e kësaj kontrate koncesioni nuk është i plotë. Ndikimi i forcave madhore në kontratat e koncesionit për ndërtimin e veprave hidroenergjitike, justifikon palët ndaj çdo lloj përgjegjësie. Ndikimi i këtij risku në realizimin e shërbimit parashikohet në kontratat e koncesionit dhe nuk sjell kosto për qeverinë. Autoriteti Kontraktues ka vlerësuar pozitivisht ecurinë e kësaj kontrate koncesioni.

### 37. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Kryezi dhe Kryezi i Epërm”<sup>52</sup>

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve në Kryezi dhe Kryezi i Epërm, si dhe transferimi i tyre nga ana e shoqërisë koncesionare tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të afatit të kontratës.

Referuar raportimeve dhe konfirmimit të Autoritetit Kontraktues, aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentralet ndodhen në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2013.

Në bazë të marrëveshjes koncesionare, energjia e prodhuar nga hidrocentralet duhet të jetë 3,431,782 kWh/vit, ndërkohë ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si më poshtë:

❖ *Tabela 35: Sasia e energjisë së prodhuar (në KWh/Vit)*

Viti	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sasia e energjisë	1,720,359	3,393,717	2,981,079	4,094,646	2,400,934	3,395,730	3,088,167	2,456,964	3,687,321

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** “Bekim Energjitik” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 50,4 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 16 Qershor 2009
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i pakërkuar

### ❖ Risqet

Raportimi në lidhje me risqet e kësaj kontrate koncesioni nuk është i plotë. Ndikimi i forcave madhore në kontratat e koncesionit për ndërtimin e veprave hidroenergjitike, justifikon palët ndaj çdo lloj përgjegjësie. Ndikimi i këtij risku në realizimin e shërbimit parashikohet në kontratat e koncesionit dhe nuk sjell kosto për qeverinë. Autoriteti Kontraktues ka vlerësuar pozitivisht ecurinë e kësaj kontrate koncesioni.

<sup>52</sup> Informacioni për ecurinë e kontratave koncesionare/PPP të sektorit të energjitikës është hartuar sipas raportimeve të Autoritetit Kontraktues bazuar në informacionin e konfirmuar të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Ujore (AKBN).

### 38. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi i hidrocentralit, operim dhe transferim i hidrocentralit Lengarica 1 dhe 2”<sup>53</sup>

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve ‘Lengarica 1’ dhe ‘Lengarica 2’ dhe transferimi i tyre nga ana e shoqërisë koncesionare tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të afatit të kontratës.

Referuar raportimeve dhe konfirmimit të Autoritetit Kontraktues, aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentrali ndodhet në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2017.

Në bazë të marrëveshjes koncesionare, energjia e prodhuar nga hidrocentralet duhet të jetë 35,700,000 kWh/vit, ndërkohë ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si më poshtë:

❖ *Tabela 36: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)*

Viti	2017	2018	2019	2020	2021
Sasia e energjisë	12,164,514	27,074,979	26,597,038	15,408,480	31,583,472

#### ❖ Risqet

Raportimi në lidhje me risqet e kësaj kontrate koncesioni nuk është i plotë. Ndikimi i forcave madhore në kontratat e koncesionit për ndërtimin e veprave hidroenergjitike, justifikon palët ndaj çdo lloj përgjegjësie. Ndikimi i këtij risku në realizimin e shërbimit parashikohet në kontratat e koncesionit dhe nuk sjell kosto për qeverinë. Autoriteti Kontraktues ka vlerësuar pozitivisht ecurinë e kësaj kontrate koncesioni.

### 39. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi, mirëmbajtja dhe transferimi i hidrocentraleve Murdhar 1 dhe Murdhar 2”<sup>54</sup>

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve ‘Murdhar 1’ dhe ‘Murdhar 2’, si dhe transferimi i tyre nga ana e shoqërisë koncesionare tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të afatit të kontratës.

Referuar raportimeve dhe konfirmimit të Autoritetit Kontraktues, aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentrali ndodhet në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2014, pas përfundimit

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** “Lengarica & Energy” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 1.98 miliardë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 17 Prill 2008
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i pakërkuar

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** “Hydroenergy” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 501,4 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 09 Mars 2009
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i Pakërkuar

<sup>53</sup> Informacioni për ecurinë e kontratave koncesionare/PPP të sektorit të energjitikës është hartuar sipas raportimeve të Autoritetit Kontraktues bazuar në informacionin e konfirmuar të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Ujore (AKBN).

<sup>54</sup> Informacioni për ecurinë e kontratave koncesionare/PPP të sektorit të energjitikës është hartuar sipas raportimeve të Autoritetit Kontraktues bazuar në informacionin e konfirmuar të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Ujore (AKBN).

të investimeve. Në bazë të marrëveshjes koncesionare, energjia e prodhuar nga hidrocentralet duhet të jetë 14,761,970 kWh/vit, ndërkohë ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si më poshtë:

❖ **Tabela 37: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)**

Viti	2014	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sasia e energjisë	11,285,588	18,434,382	22,574,898	11,819,000	17,998,555	15,620,640	12,649,440	17,670,960

#### ❖ Risqet

Raportimi në lidhje me risqet e kësaj kontrate koncesioni nuk është i plotë. Ndikimi i forcave madhore në kontratat e koncesionit për ndërtimin e veprave hidroenergjitike, justifikon palët ndaj çdo lloj përgjegjësie. Ndikimi i këtij risku në realizimin e shërbimit parashikohet në kontratat e koncesionit dhe nuk sjell kosto për qeverinë. Autoriteti Kontraktues ka vlerësuar pozitivisht ecurinë e kësaj kontrate koncesioni.

#### 40. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Rapun 1, Rapun 2”<sup>55</sup>

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve ‘Rapun 1’ dhe ‘Rapun 2’, si dhe transferimi i tyre nga ana e shoqërisë koncesionare tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të afatit të kontratës.

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** C&S Construction Energy sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 749,4 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 12 Maj 2008
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i pakërkuar

Referuar raportimeve dhe konfirmimit të Autoritetit Kontraktues, aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentrali ndodhet në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2013.

Në bazë të marrëveshjes koncesionare, energjia e prodhuar nga hidrocentralet duhet të jetë 44,650,000 kWh/vit, ndërkohë ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si më poshtë:

❖ **Tabela 38: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)**

Viti	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sasia e energjisë	10,538,340	33,957,651	31,188,918	37,494,836	24,368,196	33,392,165	28,406,175	23,748,354	33,361,878

#### ❖ Risqet

Raportimi në lidhje me risqet e kësaj kontrate koncesioni nuk është i plotë. Ndikimi i forcave madhore në kontratat e koncesionit për ndërtimin e veprave hidroenergjitike, justifikon palët ndaj çdo lloj përgjegjësie. Ndikimi i këtij risku në realizimin e shërbimit parashikohet në kontratat e koncesionit dhe nuk sjell kosto për qeverinë. Autoriteti Kontraktues ka vlerësuar pozitivisht ecurinë e kësaj kontrate koncesioni.

<sup>55</sup> Informacioni për ecurinë e kontratave koncesionare/PPP të sektorit të energjitikës është hartuar sipas raportimeve të Autoritetit Kontraktues bazuar në informacionin e konfirmuar të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Ujore (AKBN).

#### 41. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Rapun 3, Rapun 3A dhe Rapun 4”<sup>56</sup>

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve ‘Rapun 3’, ‘Rapun 3A’ dhe ‘Rapun 4’, si dhe transferimi i tyre nga ana e shoqërisë koncesionare tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të afatit të kontratës.

Referuar raportimeve dhe konfirmimit të Autoritetit Kontraktues, aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentrali ndodhet në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2016, pas përfundimit të investimit nga ana e shoqërisë koncesionare. Në bazë të marrëveshjes koncesionare, energjia e prodhuar nga hidrocentralet duhet të jetë 55,876,000 kWh/vit, ndërkohë ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si më poshtë:

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** “C&S Energy” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 749,4 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 12 Maj 2008
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i pakërkuar

#### ❖ *Tabela 39: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)*

Viti	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sasia e energjisë	8,453,357	22,734,991	35,807,857	26,298,516	24,090,870	33,157,106

#### ❖ **Risqet**

Raportimi në lidhje me risqet e kësaj kontrate koncesioni nuk është i plotë. Ndikimi i forcave madhore në kontratat e koncesionit për ndërtimin e veprave hidroenergjitike, justifikon palët ndaj çdo lloj përgjegjësie. Ndikimi i këtij risku në realizimin e shërbimit parashikohet në kontratat e koncesionit dhe nuk sjell kosto për qeverinë. Autoriteti Kontraktues ka vlerësuar pozitivisht ecurinë e kësaj kontrate koncesioni.

#### 42. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Sotirë, Sotirë 2”<sup>57</sup>

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve ‘Sotirë 1’ dhe ‘Sotirë 2’, si dhe transferimi i tyre nga ana e shoqërisë koncesionare tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të afatit të kontratës.

Referuar raportimeve dhe konfirmimit të Autoritetit Kontraktues, aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentrali ndodhet në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2014, pas përfundimit të investimit nga ana e shoqërisë koncesionare në periudhën 2013. Në bazë të marrëveshjes koncesionare, energjia e prodhuar nga hidrocentralet duhet të jetë 8,578,429 kWh/vit, ndërkohë ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si më poshtë:

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** “Hydro Energy Sotira” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 144,5 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 11 Shtator 2009
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i pakërkuar

<sup>56</sup> Informacioni për ecurinë e kontratave koncesionare/PPP të sektorit të energjitikës është hartuar sipas raportimeve të Autoritetit Kontraktues bazuar në informacionin e konfirmuar të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Ujore (AKBN).

<sup>57</sup> Informacioni për ecurinë e kontratave koncesionare/PPP të sektorit të energjitikës është hartuar sipas raportimeve të Autoritetit Kontraktues bazuar në informacionin e konfirmuar të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Ujore (AKBN).

❖ *Tabela 40: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)*

Viti	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sasia e energjisë	4,490,874	5,936,598	15,631,476	2,968,090	8,495,334	5,102,064	3,443,004	6,526,980

❖ **Risqet**

Raportimi në lidhje me risqet e kësaj kontrate koncesioni nuk është i plotë. Ndikimi i forcave madhore në kontratat e koncesionit për ndërtimin e veprave hidroenergjitike, justifikon palët ndaj çdo lloj përgjegjësie. Ndikimi i këtij risku në realizimin e shërbimit parashikohet në kontratat e koncesionit dhe nuk sjell kosto për qeverinë. Autoriteti Kontraktues ka vlerësuar pozitivisht ecurinë e kësaj kontrate koncesioni.

### 43. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Përroi i Trebishit, Bulqizë”<sup>58</sup>

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentralit Përroi i Trebishit, Bulqizë si dhe transferimi i tij nga ana e shoqërisë koncesionare tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të afatit të kontratës.

Referuar raportimeve dhe konfirmimit të Autoritetit Kontraktues, aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentrali ndodhet në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2015, pas përfundimit të investimit nga ana e shoqërisë koncesionare në periudhën 2014. Në bazë të marrëveshjes koncesionare, energjia e prodhuar nga hidrocentralet duhet të jetë 8,040,720 kWh/vit, ndërkohë ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si më poshtë:

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** SA-GLE Kompani sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 209,3 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 14 Shtator 2009
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i pakërkuar

❖ *Tabela 41: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)*

Viti	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sasia e energjisë	1,263,582	2,201,808	3,14,058	4,456,050	2,214,279	2,606,613	4,120,518

❖ **Risqet**

Raportimi në lidhje me risqet e kësaj kontrate koncesioni nuk është i plotë. Ndikimi i forcave madhore në kontratat e koncesionit për ndërtimin e veprave hidroenergjitike, justifikon palët ndaj çdo lloj përgjegjësie. Ndikimi i këtij risku në realizimin e shërbimit parashikohet në kontratat e koncesionit dhe nuk sjell kosto për qeverinë. Autoriteti Kontraktues ka vlerësuar pozitivisht ecurinë e kësaj kontrate koncesioni.

<sup>58</sup> Informacioni për ecurinë e kontratave koncesionare/PPP të sektorit të energjitikës është hartuar sipas raportimeve të Autoritetit Kontraktues bazuar në informacionin e konfirmuar të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Ujore (AKBN).

#### 44. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Vërtop”<sup>59</sup>

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentralit, si dhe transferimi i tyre nga ana e shoqërisë koncesionare tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të afatit të kontratës.

Referuar raportimeve dhe konfirmimit të Autoritetit Kontraktues, aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentrali ndodhet në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2016, pas përfundimit të investimit nga ana e shoqërisë koncesionare në periudhën 2015. Në bazë të marrëveshjes koncesionare, energjia e prodhuar nga hidrocentralet duhet të jetë 4,650,000 kWh/vit, ndërkohë ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si më poshtë:

❖ **Tabela 42: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)**

Viti	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sasia e energjisë	2,043,818	1,520,994	5,491,469	2,633,890	2,123,979	2,882,513

#### ❖ Risqet

Raportimi në lidhje me risqet e kësaj kontrate koncesioni nuk është i plotë. Ndikimi i forcave madhore në kontratat e koncesionit për ndërtimin e veprave hidroenergjitike, justifikon palët ndaj çdo lloj përgjegjësie. Ndikimi i këtij risku në realizimin e shërbimit parashikohet në kontratat e koncesionit dhe nuk sjell kosto për qeverinë. Autoriteti Kontraktues ka vlerësuar pozitivisht ecurinë e kësaj kontrate koncesioni.

#### 45. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Vlushë”<sup>60</sup>

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentralit, si dhe transferimi i tij nga ana e shoqërisë koncesionare tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të afatit të kontratës.

Referuar raportimeve dhe konfirmimit të Autoritetit Kontraktues, aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentrali ndodhet në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2014, pas përfundimit të investimit nga ana e shoqërisë koncesionare në periudhën 2011-2014 në masën 100% të investimit total. Në bazë të marrëveshjes koncesionare, energjia e prodhuar nga hidrocentralet duhet të jetë 65,000,000 kWh/vit, ndërkohë ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si më poshtë:

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** “Hydro Salillari Energy” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 283,9 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 14 Maj 2009
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i pakërkuar

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** “HEC Vlushë” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 1,7 miliardë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 19 Maj 2008
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i pakërkuar

<sup>59</sup> Informacioni për ecurinë e kontratave koncesionare/PPP të sektorit të energjitikës është hartuar sipas raportimeve të Autoritetit Kontraktues bazuar në informacionin e konfirmuar të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Ujore (AKBN).

<sup>60</sup> Informacioni për ecurinë e kontratave koncesionare/PPP të sektorit të energjitikës është hartuar sipas raportimeve të Autoritetit Kontraktues bazuar në informacionin e konfirmuar të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Ujore (AKBN).

❖ *Tabela 43: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)*

Viti	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sasia e energjisë	6,837,245	17,478,408	35,760,968	24,148,350	47,506,499	38,377,822	23,293,311	44,607,080

❖ **Risqet**

Raportimi në lidhje me risqet e kësaj kontrate koncesioni nuk është i plotë. Ndikimi i forcave madhore në kontratat e koncesionit për ndërtimin e veprave hidroenergjitike, justifikon palët ndaj çdo lloj përgjegjësie. Ndikimi i këtij risku në realizimin e shërbimit parashikohet në kontratat e koncesionit dhe nuk sjell kosto për qeverinë. Autoriteti Kontraktues ka vlerësuar pozitivisht ecurinë e kësaj kontrate koncesioni.

**46. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Truen”<sup>61</sup>**

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentralit, si dhe transferimi i tij nga ana e shoqërisë koncesionare tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të afatit të kontratës.

Referuar raportimeve dhe konfirmimit të Autoritetit Kontraktues, aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentrali ndodhet në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2015, pas përfundimit të investimit nga ana e shoqërisë koncesionare në periudhën 2013-2014.

Në bazë të marrëveshjes koncesionare, energjia e prodhuar nga hidrocentralet duhet të jetë 9,225,000 kWh/vit, ndërkohë ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si më poshtë:

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** “TRUEN” sh.p.k
- **Vlera e Investimit** : 192.5 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 19 Mars 2012
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i pakërkuar

❖ *Tabela 44: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)*

Viti	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sasia e energjisë	2,879,538	5,660,484	0	8,045,906	3,917,738	3,083,175	5,088,197

❖ **Risqet**

Raportimi në lidhje me risqet e kësaj kontrate koncesioni nuk është i plotë. Ndikimi i forcave madhore në kontratat e koncesionit për ndërtimin e veprave hidroenergjitike, justifikon palët ndaj çdo lloj përgjegjësie. Ndikimi i këtij risku në realizimin e shërbimit parashikohet në kontratat e koncesionit dhe nuk sjell kosto për qeverinë. Autoriteti Kontraktues ka vlerësuar pozitivisht ecurinë e kësaj kontrate koncesioni.

<sup>61</sup> Informacioni për ecurinë e kontratave koncesionare/PPP të sektorit të energjitikës është hartuar sipas raportimeve të Autoritetit Kontraktues bazuar në informacionin e konfirmuar të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Ujore (AKBN).

#### 47. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Steblevë”<sup>62</sup>

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit tek Autoriteti Kontraktues, konform termave dhe kushteve të kontratës.

Referuar raportimeve dhe konfirmimit të Autoritetit Kontraktues, aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentrali ndodhet në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2019. Gjatë periudhës 2016-2018 është realizuar rreth 42% e vlerës totale të investimit nga ana e shoqërisë koncesionare. Në bazë të marrëveshjes koncesionare, energjia e prodhuar nga hidrocentralet duhet të jetë 12,600,000 kWh/vit, ndërkohë ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si më poshtë:

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** “Energy Stebleva” sh.p.k
- **Vlera e Investimit** : 159.7 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 27 Mars 2008
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i pakërkuar

#### ❖ *Tabela 45: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)*

Viti	2019	2020	2021
Sasia e energjisë	1,379,639	1,918,421	2,847,320

#### ❖ **Risqet**

Raportimi në lidhje me risqet e kësaj kontrate koncesioni nuk është i plotë. Ndikimi i forcave madhore në kontratat e koncesionit për ndërtimin e veprave hidroenergjitike, justifikon palët ndaj çdo lloj përgjegjësie. Ndikimi i këtij risku në realizimin e shërbimit parashikohet në kontratat e koncesionit dhe nuk sjell kosto për qeverinë. Autoriteti Kontraktues ka vlerësuar pozitivisht ecurinë e kësaj kontrate koncesioni.

#### 48. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Shpella Poshtë II dhe Shpella Poshtë III”<sup>63</sup>

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentralit, si dhe transferimi i tij nga ana e shoqërisë koncesionare tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të afatit të kontratës.

Referuar raportimeve dhe konfirmimit të Autoritetit Kontraktues, aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentrali ndodhet në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2018.

Në bazë të marrëveshjes koncesionare, energjia e prodhuar nga hidrocentralet duhet të jetë 11,853,000 kWh/vit, ndërkohë ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si më poshtë:

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** “THORENEKS” sh.p.k
- **Vlera e Investimit** : 144.5 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 24 Maj 2013
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i pakërkuar

<sup>62</sup> Informacioni për ecurinë e kontratave koncesionare/PPP të sektorit të energjitikës është hartuar sipas raportimeve të Autoritetit Kontraktues bazuar në informacionin e konfirmuar të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Ujore (AKBN).

<sup>63</sup> Informacioni për ecurinë e kontratave koncesionare/PPP të sektorit të energjitikës është hartuar sipas raportimeve të Autoritetit Kontraktues bazuar në informacionin e konfirmuar të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Ujore (AKBN).

❖ *Tabela 46: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)*

Viti	2018	2019	2020	2021
Sasia e energjisë	3,446,455	8,884,607	7,302,038	11,567,092

❖ **Risqet**

Raportimi në lidhje me risqet e kësaj kontrate koncesioni nuk është i plotë. Ndikimi i forcave madhore në kontratat e koncesionit për ndërtimin e veprave hidroenergjitike, justifikon palët ndaj çdo lloj përgjegjësie. Ndikimi i këtij risku në realizimin e shërbimit parashikohet në kontratat e koncesionit dhe nuk sjell kosto për qeverinë. Autoriteti Kontraktues ka vlerësuar pozitivisht ecurinë e kësaj kontrate koncesioni.

#### 49. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Lumi Zalli i Okshtunit”<sup>64</sup>

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentralit, si dhe transferimi i tij nga ana e shoqërisë koncesionare tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të afatit të kontratës.

Referuar raportimeve dhe konfirmimit të Autoritetit Kontraktues, aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentrali ndodhet në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2015.

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** “DITEKO” sh.p.k
- **Vlera e Investimit** : 4.4 miliardë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 03 Qershor 2009
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i pakërkuar

Në bazë të marrëveshjes koncesionare, energjia e prodhuar nga hidrocentralet duhet të jetë 153,786,127 kWh/vit, ndërkohë ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si më poshtë:

❖ *Tabela 47: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)*

Viti	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sasia e energjisë	9,709,072	49,411,754	67,252,535	115,714,285	99,034,495	93,483,109	125,775,540

❖ **Risqet**

Raportimi në lidhje me risqet e kësaj kontrate koncesioni nuk është i plotë. Ndikimi i forcave madhore në kontratat e koncesionit për ndërtimin e veprave hidroenergjitike, justifikon palët ndaj çdo lloj përgjegjësie. Ndikimi i këtij risku në realizimin e shërbimit parashikohet në kontratat e koncesionit dhe nuk sjell kosto për qeverinë. Autoriteti Kontraktues ka vlerësuar pozitivisht ecurinë e kësaj kontrate koncesioni.

<sup>64</sup> Informacioni për ecurinë e kontratave koncesionare/PPP të sektorit të energjitikës është hartuar sipas raportimeve të Autoritetit Kontraktues bazuar në informacionin e konfirmuar të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Ujore (AKBN).

## 50. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Lumi i Treskës”<sup>65</sup>

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentralit, si dhe transferimi i tij nga ana e shoqërisë koncesionare tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të afatit të kontratës.

Referuar raportimeve dhe konfirmimit të Autoritetit Kontraktues, aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentrali ndodhet në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2015.

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** “Hec Treska” sh.p.k
- **Vlera e Investimit** : 656.5 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 21 Nëntor 2012
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i pakërkuar

Në bazë të marrëveshjes koncesionare, energjia e prodhuar nga hidrocentralet duhet të jetë 21,060,705 kWh/vit, ndërkohë ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si më poshtë:

❖ **Tabela 48: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)**

Viti	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sasia e energjisë	2,575,930	9,001,426	7,893,000	12,235,924	14,249,970	8,809,038	13,584,047

### ❖ Risqet

Raportimi në lidhje me risqet e kësaj kontrate koncesioni nuk është i plotë. Ndikimi i forcave madhore në kontratat e koncesionit për ndërtimin e veprave hidroenergjitike, justifikon palët ndaj çdo lloj përgjegjësie. Ndikimi i këtij risku në realizimin e shërbimit parashikohet në kontratat e koncesionit dhe nuk sjell kosto për qeverinë. Autoriteti Kontraktues ka vlerësuar pozitivisht ecurinë e kësaj kontrate koncesioni.

## 51. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Gostivisht, Langarica 3, Ura e Dashit”<sup>66</sup>

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentralit, si dhe transferimi i tij nga ana e shoqërisë koncesionare tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të afatit të kontratës.

Referuar raportimeve dhe konfirmimit të Autoritetit Kontraktues, aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentrali ndodhet në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2015.

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** “Idro Energia Pulita” sh.p.k
- **Vlera e Investimit** : 309,8 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 07 Shtator 2009
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i pakërkuar

Në bazë të marrëveshjes koncesionare, energjia e prodhuar nga hidrocentralet duhet të jetë 16,688,473 kWh/vit, ndërkohë ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si më poshtë:

<sup>65</sup> Informacioni për ecurinë e kontratave koncesionare/PPP të sektorit të energjitikës është hartuar sipas raportimeve të Autoritetit Kontraktues bazuar në informacionin e konfirmuar të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Ujore (AKBN).

<sup>66</sup> Informacioni për ecurinë e kontratave koncesionare/PPP të sektorit të energjitikës është hartuar sipas raportimeve të Autoritetit Kontraktues bazuar në informacionin e konfirmuar të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Ujore (AKBN).

❖ *Tabela 49: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)*

Viti	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sasia e energjisë	8,012,128	10,335,640	6,720,064	11,206,128	9,741,952	5,468,416	10,427,456

❖ **Risqet**

Raportimi në lidhje me risqet e kësaj kontrate koncesioni nuk është i plotë. Ndikimi i forcave madhore në kontratat e koncesionit për ndërtimin e veprave hidroenergjitike, justifikon palët ndaj çdo lloj përgjegjësie. Ndikimi i këtij risku në realizimin e shërbimit parashikohet në kontratat e koncesionit dhe nuk sjell kosto për qeverinë. Autoriteti Kontraktues ka vlerësuar pozitivisht ecurinë e kësaj kontrate koncesioni.

**52. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Shemri dhe Mgullë”<sup>67</sup>**

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentralit, si dhe transferimi i tij nga ana e shoqërisë koncesionare tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të afatit të kontratës.

Referuar raportimeve dhe konfirmimit të Autoritetit Kontraktues, aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentrali ndodhet në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2013. Gjatë periudhës 2011-2013 është realizuar 90 % e vlerës totale të investimit nga ana e shoqërisë koncesionare. Në bazë të marrëveshjes koncesionare, energjia e prodhuar nga hidrocentralet duhet të jetë 4,867,077 kWh/vit, ndërkohë ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si më poshtë:

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** “Erald Energjetik” sh.p.k
- **Vlera e Investimit** : 69 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 16 Qershor 2009
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i pakërkuar

❖ *Tabela 50: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)*

Viti	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sasia e energjisë	364,264	1,435,528	1,333,176	4,396,009	2,711,188	4,030,380	3,875,020	3,427,610	4,900,491

❖ **Risqet**

Raportimi në lidhje me risqet e kësaj kontrate koncesioni nuk është i plotë. Ndikimi i forcave madhore në kontratat e koncesionit për ndërtimin e veprave hidroenergjitike, justifikon palët ndaj çdo lloj përgjegjësie. Ndikimi i këtij risku në realizimin e shërbimit parashikohet në kontratat e koncesionit dhe nuk sjell kosto për qeverinë. Autoriteti Kontraktues ka vlerësuar pozitivisht ecurinë e kësaj kontrate koncesioni.

<sup>67</sup> Informacioni për ecurinë e kontratave koncesionare/PPP të sektorit të energjitikës është hartuar sipas raportimeve të Autoritetit Kontraktues bazuar në informacionin e konfirmuar të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Ujore (AKBN).

### 53. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Sllabinjë”<sup>68</sup>

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, shfrytëzimi dhe transferimi i tij nga ana e shoqërisë koncesionare tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të afatit të kontratës.

Referuar raportimeve dhe konfirmimit të Autoritetit Kontraktues, aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentrali ndodhet në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2012. Gjatë periudhës 2009-2012 është realizuar 100 % e vlerës totale të investimit nga ana e shoqërisë koncesionare. Në bazë të marrëveshjes koncesionare, energjia e prodhuar nga hidrocentralet duhet të jetë 50,000,000 kWh/vit, ndërkohë ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si më poshtë:

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** “Power Elektrik Sllabinjë” sh.p.k
- **Vlera e Investimit** : 1.29 miliardë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 11 Prill 2008
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i pakërkuar

#### ❖ Tabela 51: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)

Viti	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sasia e energjisë	24,126,000	37,654,119	32,883,815	33,050,133	44,056,174	28,992,449	35,316,409	31,225,297	25,451,453	41,069,054

#### ❖ Risqet

Raportimi në lidhje me risqet e kësaj kontrate koncesioni nuk është i plotë. Ndikimi i forcave madhore në kontratat e koncesionit për ndërtimin e veprave hidroenergjitike, justifikon palët ndaj çdo lloj përgjegjësie. Ndikimi i këtij risku në realizimin e shërbimit parashikohet në kontratat e koncesionit dhe nuk sjell kosto për qeverinë. Autoriteti Kontraktues ka vlerësuar pozitivisht ecurinë e kësaj kontrate koncesioni.

### 54. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Belesova 1 dhe 2”<sup>69</sup>

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentralit, si dhe transferimi i tij nga ana e shoqërisë koncesionare tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të afatit të kontratës.

Referuar raportimeve dhe konfirmimit të Autoritetit Kontraktues, aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentrali ndodhet në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2012.

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** “KORKIS-2009” sh.p.k
- **Vlera e Investimit** : 46.3 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 25 Mars 2009
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i pakërkuar

Në bazë të marrëveshjes koncesionare, energjia e prodhuar nga hidrocentralet duhet të jetë 1,962,700 kWh/vit, ndërkohë ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si më poshtë:

<sup>68</sup> Informacioni për ecurinë e kontratave koncesionare/PPP të sektorit të energjitikës është hartuar sipas raportimeve të Autoritetit Kontraktues bazuar në informacionin e konfirmuar të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Ujore (AKBN).

<sup>69</sup> Informacioni për ecurinë e kontratave koncesionare/PPP të sektorit të energjitikës është hartuar sipas raportimeve të Autoritetit Kontraktues bazuar në informacionin e konfirmuar të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Ujore (AKBN).

❖ *Tabela 52: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)*

Viti	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sasia e energjisë	263,000	249,240	212,940	43,200	279,720	59,680	246,660	293,880	115,980	209,940 <sup>70</sup>

❖ **Risqet**

Raportimi në lidhje me risqet e kësaj kontrate koncesioni nuk është i plotë. Ndikimi i forcave madhore në kontratat e koncesionit për ndërtimin e veprave hidroenergjitike, justifikon palët ndaj çdo lloj përgjegjësie. Ndikimi i këtij risku në realizimin e shërbimit parashikohet në kontratat e koncesionit dhe nuk sjell kosto për qeverinë. Autoriteti Kontraktues ka vlerësuar pozitivisht ecurinë e kësaj kontrate koncesioni.

**55. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Tervol”<sup>71</sup>**

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është ndërtimi, operimi dhe transferimi i tij nga ana e shoqërisë koncesionare tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të afatit të kontratës. Referuar raportimeve dhe konfirmimit të Autoritetit Kontraktues, aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentrali ndodhet në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2010.

Në bazë të marrëveshjes koncesionare, energjia e prodhuar nga hidrocentralet duhet të jetë 40,000,000 kWh/vit, ndërkohë ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si më poshtë:

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** “Ble-Klo-Ar” sh.p.k
- **Vlera e Investimit** : 325.8 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 10 Dhjetor 2007
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i pakërkuar

❖ *Tabela 53: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)*

Viti	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sasia e energjisë	35,596	21,736	35,615	39,782	33,762	30,938	39,365	25,677	42,180	31,509	23,105	34,539,460

❖ **Risqet**

Raportimi në lidhje me risqet e kësaj kontrate koncesioni nuk është i plotë. Ndikimi i forcave madhore në kontratat e koncesionit për ndërtimin e veprave hidroenergjitike, justifikon palët ndaj çdo lloj përgjegjësie. Ndikimi i këtij risku në realizimin e shërbimit parashikohet në kontratat e koncesionit dhe nuk sjell kosto për qeverinë. Autoriteti Kontraktues ka vlerësuar pozitivisht ecurinë e kësaj kontrate koncesioni.

<sup>70</sup> Sasia e energjisë së prodhur raportuar nga Autoriteti Kontraktues për periudhën e gjashtë mujorit të parë.

<sup>71</sup> Informacioni për ecurinë e kontratave koncesionare/PPP të sektorit të energjitikës është hartuar sipas raportimeve të Autoritetit Kontraktues bazuar në informacionin e konfirmuar të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Ujore (AKBN).

## SEKTORI I KONTROLLIT FISKAL

Siguria në kufi është një nga sfidat më komplekse dhe kritike që qeveritë hasin në ditët e sotme. Meqenëse mundëson hyrjen dhe daljen e njerëzve dhe mallrave, kufiri mbetet kritik për prosperitetin e shteteve. Përmirësimet në monitorimin e kufirit kanë treguar se mund të japin përfitime të ndjeshme për shtetet, jo vetëm për të rritur nivelin e sigurisë, por edhe duke krijuar një mjedis më miqësor tregtar nëpërmjet rritjes së të ardhurave doganore, duke forcuar ekonominë e shtetit. Në këtë kuadër, nga Qeveria Shqiptare është dhënë me koncesion shërbimi i skanimit të kontenerëve dhe aktualisht procesi i skanimit kryhet në Degët Doganore Kapshticë, Kakavijë, Morinë, Durrës dhe Qafë Thanë.<sup>72</sup> Më poshtë, jepet një përshkrim më i detajuar në lidhje me këtë kontratë koncesioni.

### 56. Kontrata Koncesionare/PPP “Financimi, ngritja dhe operimi i shërbimit të skanimit të konteinerëve e automjeteve të tjera në RSH”

Objekti i kësaj kontrate është financimi, ngritja dhe operimi i shërbimit të skanimit të konteinerëve e automjeteve të tjera në RSH. Kjo kontratë koncesioni është miratuar fillimisht me anë të Ligjit Nr. 123/2013 dhe është ndryshuar më pas me Ligjin Nr. 74/2015. Ndryshimet e bëra konsistojnë në ndryshimin e vlerës së tarifës së skanimit për deklaratat doganore. Nëse para ndryshimeve tarifa për çdo deklarate doganore të skanuar ishte 39 Euro, tashmë me ndryshimin ligjor tarifa e skanimit u vendos të jetë 5 Euro për deklaratat doganore nën ose të barabarta me 1000 Euro dhe 22 Euro për deklaratat doganore mbi 1000 Euro. Ndryshim tjetër konstatohet në mënyrën e pagesës. Nëse para ndryshimeve Autoriteti duhet t’i paguante shoqërisë koncesionare me baza ditore të gjitha pagesat e tarifës së shërbimit të skanimit për deklarata, që do të kishte mbledhur nga palët e treta në lidhje me shërbimet e përcaktuara, tashmë me ndryshimin ligjor Autoriteti i paguan shoqërisë koncesionare një tarifë për shërbimet e caktuara për çdo vend (Tarifa e Shërbimit të Vendit), e cila rritet çdo vit me koeficient 1.03.

- **Autoriteti Kontraktues:** Ministria e Financave dhe Ekonomisë
- **SPV:** S2 Albania sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 2.83 miliardë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** Nënshkruar 10 prilli 2013, fillimi i operimeve më datë 07.09.2015, kontrata e rinegociuar më 28 Prill 2015
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 15 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim

Aktualisht ky projekt është në fazë operimi. Për vitin 2021 financimi nga buxheti i shtetit është realizuar në masën 100% në përputhje me planin vjetor.

#### ❖ Tabela 54: Pagesat buxhetore për projektin “Skanimi i Doganave”

Viti	2018		2019		2020		2021		2022
	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan <sup>73</sup>	Fakt	Plan	Fakt	Plan
<i>Pagesat Buxhetore (në mijë Lekë)</i>	1,525,580	1,525,579	1,512,517	1,509,659	1,140,896	1,140,893	1,660,686	1,660,686	1,725,708

Tregues performance për koncesionin e Skanimit në Dogana, është raportuar disponueshmëria e skanerit (pra gatishmëria për të matur nivelin e përmbushjes së shërbimit të ofruar). Për vitin 2021 ky tregues ka qënë mesatarisht 99.91%, në krahasim me 93.7% i parashikuar për këtë vit, si rezultat i mirëmbajtjes dhe kryerjes së shërbimeve të pajisjeve. Gjatë vitit 2021 janë kryer dy shërbime të planifikuara për çdo skaner, në periudhat Maj dhe Nëntor, në të cilat acceleratori i rrezeve X (linaku) në të gjitha rastet i është bërë shërbimi nga ekspertët e fushës përkatëse të ardhur nga Mbretëria e Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pas ndërrimit të

<sup>72</sup> Shih në linkun: <http://www.dogana.gov.al/c/169/185/266/skanimi-ne-dogane>

<sup>73</sup> I ndryshuar.

pjesës vitale të kësaj pajisje, janë bërë testimet përkatëse për të garantuar që niveli i rrezatimit të jetë në parametrat e kërkuara sipas normave kombëtare dhe ndërkombëtare. Gjatë kësaj periudhe nga degët doganore, ku janë instaluar skanerat, nuk janë shprehur shqetësime në lidhje me funksionimin e tyre, duke e vlerësuar ecurinë e deritanishme të Kontratës së Koncesionarit konform parashikimeve ligjore.

Numri total i skanimeve në të gjitha pikat doganore për vitin 2021 është 256,844 të tilla. Referuar numrit të kontenierëve që skanohen në doganat Kapshticë, Morinë, Qafë Thanë dhe Kakavijë, skanohen të gjithë kontenierët që kalojnë nëpërmjet këtyre pikave kufitare, ndërsa në Doganën e Durrësit skanimi i kontenierëve bëhet mbi bazën e profileve të riskut- natyrës së mallit, origjinës etj.

Nga të dhënat e gjeneruara nga sistemi i skanimit dhe mbikëqyrur rregullisht nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave numri i skanimeve të kryera ka patur ecurinë si më poshtë:

❖ *Tabela 55: Numri i skanimeve ndër vite*

Viti	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nr.i skanimeve	14,655	169,528	226,948	272,576	266,655	244,769	256,844

Kohëzgjatja për çdo skanim është e përllogaritur në nivelet 4-6 minuta, në varësi të problematikës ose jo, të ngarkesës. Nëpërmjet këtij shërbimi janë evidentuar në kohë transportimi i lëndëve dhe substancave të ndaluara me ligj (lëndë narkotike, mbetje radioactive etj.), kontrabanda e produkteve farmaceutike, mallra kontrabandë, trafikim i njerëzve, pastrim parash etj. Për vitin 2021, nga skanimi në doganat e vendit janë evidentuar në total 167 raste të tilla, konkretisht në Durrës 82 raste; Kakavijë 19 raste; Kapshticë 61 raste; Qafë Thanë 3 raste dhe Morinë 2 raste.

❖ **Risqet**

Në lidhje me risqet e kontratës risqet e alokuara tek koncesionari janë risku i ndërtimit, risku i operimit dhe performancës dhe risku i lejeve dhe licencave, ndërsa risqet e alokuara tek pala publike janë risku i forcës madhore, risku i ndryshimeve ligjore, risku politik dhe risku financiar/kursi i këmbimit. Ndërkohë janë ndarë mes palëve risku i rinegocimit, risku i transferimit të aseteve dhe risku i ndërprerjes së kontratës koncesionare. Për vitin 2020 është aktivizuar risku i rinegocimit për shkak të Pandemisë Covid-19. Konkretisht me ligjin nr.27/2021 u miratua ndryshimi në marrëveshjen koncesionare, ku palët ranë dakort se shoqëria koncesionare do t'i lejojë Autoritetit shtyrjen me 100% të pagesës së këstit mujor të tarifës së shërbimit të secilës pikë operimi për muajt Shtator, Tetor dhe Nëntor nga tarifa vjetore e shërbimeve të pikës së operimit për vitin 2020, si dhe të shtyjnë shlyerjen e detyrimit të mbetur nga kësti i muajit Gusht për tarifën e shërbimit të një pike operimi. Pagesa e shtyrë në masën 100% dhe kësti i prapambetur i Gushtit është shlyer duke filluar nga data 1 Janar deri në 31 Dhjetor 2022.

### 57. Kontratë Koncesioni/PPP “Për shërbimin e kontrollit ligjor të instrumenteve matëse, nëpërmjet verifikimit të instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe gazit të lëngshëm”

Objekti i kësaj kontrate koncesioni/PPP është kryerja nga shoqëria koncesionare e shërbimit të kontrollit ligjor të instrumenteve matëse, nëpërmjet verifikimit të instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe gazit të lëngshëm të naftës (GLN), në të gjithë territorin e R.Sh. Shërbimi i kontrollit ligjor të instrumentave matëse nëpërmjet verifikimit të instrumentave shpërndarëse të karburantit dhe gazit të lëngshëm përfshin:

- Verifikimin fillestar;
- Verifikimin pasardhës që përfshin verifikimin periodik të detyrueshëm të një instrumenti matës, verifikimin jashtë rradhe me kërkesë të subjektit e detyruar si dhe verifikim pas riparimit;
- Verifikim pa tarife jashtë frekuencës së zakonshme.

- **Autoriteti Kontraktues:** Ministria e Financave dhe Ekonomisë
- **SPV:** Noa Inspect sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 70 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 21 Gusht 2019
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 20 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i Pakërkuar

Aktualisht kjo kontratë është në fazën e operimit. Shoqëria koncesionare ‘Noa Inspect’ sh.p.k ka realizuar 100% investimin në përputhje me grafikun e investimeve dhe specifikat teknike, investimi i cili është verifikuar dhe miratuar edhe nga ana e Autoritetit Kontraktues. Kryerja e shërbimit në terren ka filluar më datë 31 Mars 2020, pas miratimit nga ana e Autoritetit Kontraktues të investimeve të kryera. Inspektimet e shoqërisë deri më tani kanë arritur të mbulojnë gjithë territorin e Shqipërisë. Referuar raportimit të shoqërisë koncesionare për vitin 2021, përqindja e instrumenteve ligjorisht të kontrolluar jo konform rezulton 25% ose rreth 12 pikë përqindje më pak se viti 2020.

Gjatë periudhës 1 Janar-31 Dhjetor 2021 nga shoqëria koncesionare janë kryer 24,289 inspektime dhe auditime të plota instrumentash matës. Ecuria e treguesve jepet në tabelën e mëposhtme:

❖ **Tabela 56: Numri i inspektimeve të instrumentave matës**

Treguesit	Viti 2021
Inspektime fillestare	1,878
Inspektime jashtë radhe	1,371
Inspektime periodike	18,268
Audite dhe teste saktësie	2,772
<b>Total</b>	<b>24,289</b>

#### ❖ Risqet

Kjo kontratë koncesioni ka alokuar tek pala private pjesën më të madhe të risqeve konkretisht: risku i operimit dhe mirëmbajtjes, risku i implementimit dhe vënies në punë, risku i realizimit jo në kohë të projektit, risku i funksionimit, risku i kërkesës, risku i kursit të kembimit dhe risku i normës së interesit, risku i vjetërimit të aseteve. Ndërkohë Autoritetit Kontraktues i janë alokuar risku i inflacionit, risku i ndryshimit të kuadrit ligjor, risku politik. Janë ndarë mes palëve: risku i forcës madhore, risku i rinegocimit dhe risku i përfundimit të kontratës. Gjatë vitit 2021 është materializuar risku i rinegocimit të kontratës, ku si pasojë e hyrjes në fuqi të ligjit të ri të metrologjisë, shoqëria koncesionare ka paraqitur pranë Autoritetit Kontraktues kërkesën për saktësimin e kontratës në përputhje me parashikimet e këtij ligji. Nga ana e Autoritetit Kontraktues është ngritur një grup pune për shqyrtimin e kërkesave të shoqërisë dhe pas vlerësimit të tyre saktësimin ose rinegocimin e kontratës, proces i cili ende nuk është finalizuar.

## 58. Kontrata e Koncesionit/PPP “Për shërbimin e markimit dhe monitorimit të karburanteve”

Objekti i kontratës koncesionare/PPP është kryerja nga koncesionari e shërbimit të markimit dhe të monitorimit të karburanteve për qëllim të shmangies së evazionit fiskal. Ky shërbim kryhet mbi produktet e markimit dhe monitorimit, të cilat sipas kontratës, janë produktet e bardha (gazoil dhe benzen), produktet e zeza (solar dhe mazut), nafta bruto, lëndët djegëse dhe produktet e ndërmjetme.

Aktualisht kjo kontratë është në fazën e zbatimit, e cila ka filluar zbatimin me miratimin e VKM-së nr. 498 datë 30.05.2013 “Për përcaktimin e procedurave të shënjimit të naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”. Operacionet e markimit të karburanteve në terren filluan në muajin Shtator 2013, kurse operacionet e monitorimit të tregut të karburanteve të rafinuara filluan më datë 23 Qershor 2014. Kjo kontratë nuk është me mbështetje buxhetore dhe investimi financohet vetëm nga shoqëria koncesionare.

Tregues të performancës për këtë kontratë koncesioni janë sasia e karburantit të markuar në litra dhe numri i kontrolleve të shoqërisë koncesionare në terren. Sipas raportimeve, aktiviteti i koncesionarit ka vijuar normalisht edhe gjatë vitit 2021. Gjatë këtij viti, janë markuar 762.295.630 litra karburant dhe janë kontrolluar 3,448 pika në terren, prej ku 27 raste janë evidentuar me shkelje (përzierje e paligjshme/ kontrabandë).

Vlera e investimit nuk është realizuar plotësisht, për shkak të mosrealizimit ende të markimit të naftës bruto dhe mosmonitorimit të produktit solar/mazut. Procesi i markimit të naftës bruto nuk është realizuar pasi ka hasur vështirësi nga shumë shoqëri të naftës bruto, të cilat pretendojnë se nafta e tyre nuk përmbush kushtet e kërkuara të viskozitetit dhe për të mundësuar markimin, duhet të përgatisin naftën bruto, duke e kthyer në gjendje të lëngshme nëpërmjet holluesve. Kjo praktikë pretendohet të jetë shumë e kushtueshme e për pasojë, këto shoqëri do të shkonin drejt falimentimit.

### ❖ Risqet

Sipas kontratës së koncesionit është alokuar tek koncesionari risku i ndërtimit, operimit dhe performancës, risku i transferimit të aseteve, risku financiar, ndërsa tek Autoriteti Kontraktues është alokuar risku i ribalancimit të ekuilibrit financiar, risku i ndryshimeve ligjore dhe risku politik. Ndërkohë janë ndarë mes palëve risku i rinegociimit, risku i forcës madhore dhe risku i ndërprerjes së kontratës.

- **Autoriteti Kontraktues:** Ministria e Financave dhe Ekonomisë
- **SPV:** GFI Albania sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 444.9 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 27 Shkurt 2013
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 10 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i Pakërkuar

## 59. Kontratë Koncesioni/PPP “Për projektimin, financimin, dizenjimin, prodhimin dhe ngritjen e një sistemi për emetimin, shpërndarjen, gjetjen dhe monitorimin e pullave fiskale e të pullave të kontrollit të barnave”

Objekti i kësaj kontratë koncesioni/PPP është projektimi, financimi, dizenjimi, prodhimi dhe ngritja e një sistemi nga shoqëria koncesionare për emetimin, shpërndarjen, gjetjen dhe monitorimin e pullave fiskale e të pullave të kontrollit të barnave.

Pullat fiskale kanë katër nivele autentifikimi që janë tipari i sigurisë së dukshme (1), tipari gjysëm i dukshëm i sigurisë (2) dhe tipari i fshehtë i sigurisë (3). Përveç tiparit të fshehtësisë, pullat fiskale janë të dizenuara në atë mënyrë që nëse pulla fiskale ndryshohet apo falsifikohet, kopja rezultuese nuk do të mund të identifikohet si pullë fiskale e vlefshme. Në lidhje me procedurën e porositjes së pullave fiskale, sipas përcaktimeve në kontratën koncesionare si dhe udhëzimeve në fuqi, porositja e pullave nga ana e operatorëve, kryhet on-line në sistemin SICPA TRACE. Çdo porosi shqyrtohet nga strukturat e Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave të cilat miratojnë apo refuzojnë porosinë.

Shoqëria koncesionare mirëmban dhe përditëson sistemin Track & Trace. Për efekte kontrolli, koncesionari ka vënë në dispozicion të autoritetit Doganor 100 pajisje të skanimit të pullave të cilat ndihmojnë në skanimin e pullave fiskale dhe evidentimin në treg të produkteve të pafiskalizuara apo të pullave të falsifikuara. Treguesit e performancës për këtë kontratë koncesioni/PPP gjatë vitit 2021 janë realizuar në përputhje me targetin e synuar gjatë kësaj periudhe, konkretisht:

- Shpërndarja në kohë e pullave fiskale: Realizuar 100%
- Koha për riparimin e përkohshëm: Realizuar 100%
- Koha për të mbërritur: Realizuar 100%
- Cilësia e pullave fiskale: Realizuar 100%
- Lexueshmëria e pullave fiskale: Realizuar 100%
- Koha e reagimit: Realizuar 100%

Në lidhje me këtë kontratë mbetet i pa implementuar, projekti për pullat fiskale të barnave.

### ❖ Risqet

Në lidhje me risqet e kësaj kontrate koncesioni, risqet e parashikuara në kontratë dhe të alokuara tek koncesionari janë risku i ndërtimit, operimit dhe performancës, dhe risku i transferimit të aseteve, risku i Inflacionit. Ndërkohë risqet e alokuara autoritetit kontraktues janë risku material nga vendimet politike, risku i ndryshimeve ligjore. Risqet e ndara mes të dyja paleve janë risku i rinegocimit, risku i nderprerjes së kontrates dhe forca madhore, risku i kursit të këmbimit.

- **Autoriteti Kontraktues:** Ministria e Financave dhe Ekonomisë
- **SPV:** SICPA Security Solutions Albania sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 10 milionë Euro
- **Data e fillimit të kontratës:** 24 Shkurt 2011
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 10 vjet
- **Forma:** Propozim i Pakërkuar

## SEKTORI I ZHVILLIMIT URBAN DHE EKONOMIK

Në këtë sektor përfshihen katër kontrata koncesioni/PPP të cilat synojnë zhvillimin ekonomik dhe urban të vendit.

### 60. Kontratë Koncesioni/PPP “Për përmirësimin e infrastrukturës Arsimore në Bashkinë Tiranë –Loti 1” me nr. 9513 Rep., dhe Nr. 3756 Kol., datë 17.10.2018.<sup>74</sup>

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është projektimi, financimi, ndërtimi, mobilimi, mirëmbajtja, mbikqyrja, si dhe kolaudimi dhe mirëmbajtja gjatë kohëzgjatjes së koncesionit për 5 objekte arsimore (shkolla të reja), sipas tipologjisë të përshkruar në kontratë, me vendodhje në Zonën 1, Tiranë. Kjo kontratë ka të parashikuar ndërtimin e 3 shkollave 9-vjeçare, 3 Kopshte dhe 2 shkolla të arsimit të mesëm të cilat në fund të periudhës së koncesionit do t’i transferohen Bashkisë Tiranë. Kjo kontratë synon të përmirësojë infrastrukturën arsimore në Tiranë duke ndërtuar shkolla të reja në mënyrë që t’u

- **Autoriteti Kontraktues:** Bashkia Tiranë dhe Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
- **SPV:** Z.M.A sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 2.4 miliardë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 17 Shtator 2018
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 7 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim

jepet një zgjidhje përfundimtare problemeve me të cilat përballet sistemi arsimor në Tiranë, si zhvillimi i mësimin me dy turne, mbipopullimi i shkollave dhe vështirësitë e aksesit në shkollë.

Referuar raportimeve dhe konfirmimit të Autoritetit Kontraktues, aktualisht sipas raportimit ka përfunduar pjesa ndërtimore dhe pritjet zbardhja e certifikatave për secilin shesh ndërtimi. Kjo kontratë është me mbështetje buxhetore, dhe pagesat realizohen pas përfundimit të objekteve dhe marrjes në dorëzim të tyre nga ana e Autoritetit Kontraktues..

Referuar raportimit të Autoritetit Kontraktues çdo gjë po shkon sipas parashikimeve. Janë miratuar lejet përkatëse të ndërtimit me datë 23.09.2021 për sheshin 9/1, për sheshin 11/1 dhe me datë 14.12.2021 për sheshin 11/2. Sa i përket vlerës së investimit të realizuar, sipas raportimit për vitin 2021 janë realizuar 739,031,404 Lek investime.

### ❖ Risqet

Në lidhje me risqet e parashikuara në këtë kontratë koncesioni, palës private i janë alokuar risku i ndërtimit, risku i operimit dhe performancës, risku i ndryshimeve ligjore, ndërsa palës publike i janë alokuar risku i trojeve dhe risku material nga vendimet politike. Ndërkohë risqet e ndara mes palëve janë risku financiar, risku i ndërprerjes së kontratës dhe risku i forcës madhore. Nga ana e Autoritetit probabiliteti i materializimit të risqeve është vlerësuar i ulët në të mesëm.

<sup>74</sup> Informacion i hartuar në bazën e raportimeve të Autoritetit Kontraktues

## 61. Kontratë Koncesioni/PPP “Për përmirësimin e infrastrukturës Arsimore në Bashkinë Tiranë –Loti 4” me nr. 4907 Rep., dhe Nr. 1874 Kol., datë 08.09.2020.<sup>75</sup>

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është projektimi, financimi, ndërtimi, paisja me mjete shkollore si dhe mirëmbajtja gjatë kohëzgjatjes së koncesionit për 4 objekte arsimore (shkolla të reja), sipas tipologjisë të përshkruar në kontratë, me vendodhje në Zonën 1, Tiranë. Kjo kontratë ka të parashikuar ndërtimin e 2 shkollave 9-vjeçare dhe 2 shkollave të arsimit të mesëm të cilat në fund të periudhës së koncesionit do ti transferohen Bashkisë Tiranë. Kjo kontratë synon të përmirësojë infrastrukturën arsimore në Tiranë duke ndërtuar shkolla të reja në mënyrë që t’u jepet një zgjidhje përfundimtare problemeve me të cilat përballet sistemi arsimor në Tiranë, si zhvillimi i mësimin me dy turne, mbipopullimi i shkollave dhe vështirësitë e aksesit në shkollë.

- **Autoriteti Kontraktues:** Bashkia Tiranë dhe Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
- **SPV:** Shoqëria Tirana 4 sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 2.08 miliardë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 08 Shtator 2020
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 7 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Ndërtim

Sipas raportimit çdo gjë shkon sipas parashikimeve dhe në datën 17.03.2021 janë miratuar dhe lejet përkatëse të ndërtimit. Në lidhje me vlerën e investimit raportohet se në total për vitin 2021 janë realizuar 278,076,889 lekë investime.

### ❖ Risqet

Në lidhje me risqet e parashikuara në këtë kontratë koncesioni, palës private i janë alokuar risku i ndërtimit, risku i operimit dhe performancës, risku i ndryshimeve ligjore, ndërsa palës publike i janë alokuar risku i trojeve dhe risku material nga vendimet politike. Ndërkohë risqet e ndara mes palëve janë risku financiar, risku i ndërprerjes së kontratës dhe risku i forcës madhore.

## 62. Kontratë Koncesioni/PPP “Për dhënien me koncesion të aktivitetit të Regjistrimit të Barrëve Siguruese”

Objekti i kësaj kontrate koncesioni/PPP është ofrimi i shërbimit të Regjistrimit të Barreve Siguruese nga shoqëria koncesionare, i cili përfshin: regjistrimin e barreve siguruese, kërkim informacioni, ndryshim i regjistrimit (zgjatje të regjistrimit, fshirje të regjistrimit, reregjistrim i një regjistrimi që ka përfunduar apo është fshirë, transferim i të drejtës së barrëmarrësit dhe barrëdhënësit, shtim dhe fshirje e një barrëdhënësi apo barrëmarrësi, shtim dhe fshirje kolaterali etj.).

- **Autoriteti Kontraktues:** Ministria e Financave dhe Ekonomisë
- **SPV:** Regjistri i Barreve Siguruese sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 35.7 milionë Lekë riinvestim 7.1 milionë Lekë
- **Data e fillimit të kontratës:** 14 Prill 2009
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 20 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim

Aktualisht kjo kontratë është në fazën e operimit. Ky projekt nuk është me mbështetje buxhetore. Aktualisht, një pjesë e konsiderueshme e regjistrimeve të barreve siguruese në Regjistrin e Barreve Siguruese kryhen nga institucionet mikrofinanciare. Ky regjistër ka kryer funksionin e tij në shërbim dhe bashkëpunim me institucionet financiare dhe mikrofinanciare, banka të nivelit të dytë, studio ligjore dhe noteriale si dhe drejtorite rajonale të shërbimit të transportit rrugor në të gjithë vendin.

Shoqëria koncesionare gjatë vitit 2021 ka realizuar investime në drejtim të blerjes së pajisjeve dhe programeve të reja për përmirësimin e aktivitetit dhe sigurinë e Regjistrimit, si dhe gjithashtu ka kryer mirëmbajtjen e sistemit

<sup>75</sup> Informacion i hartuar në bazën e raportimeve të Autoritetit Kontraktues

të Regjistrin. Shoqëria koncesionare po punon për përgatitjen e një programi për ta kaluar plotësisht online Regjistrin për Barrët Siguruese.

Sipas raportimit të shoqërisë koncesionare gjatë vitit 2021, janë kryer 175,180 transaksione që konsistojnë në regjistrim të barreve siguruese kërkim informacioni dhe ndryshim informacioni. Referuar raportimeve të shoqërisë koncesionare, gjatë muajve Korrik- Dhjetor 2021, u vu re një rritje e numrit të këkimeve të informacionit pranë RBS ose pranë sporteleve të Drejtorive Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor në të gjithë vendin.

#### ❖ Risqet

Në lidhje me risqet e kësaj kontrate koncesioni, risqet e parashikuara në kontratë dhe të alokuara tek koncesionari janë risku i ndertimit, operimit dhe performancës, dhe risku i transferimit të aseteve. Ndërkohë risqet e alokuara autoritetit kontraktues janë risku i ribalancimit të ekuilibrit financiar, risku material nga vendimet politike, risku i ndryshimeve ligjore. Risqet e ndara mes të dyja paleve janë risku i rinegocimit, risku i ndërprerjes së kontrates dhe forca madhore, risku i kursit të kembimit.

### 63. Kontratë Koncesioni/PPP “Për dhënien me koncesion të aktivitetit të prodhimit të kripës në Nartë, Vlorë”

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është kryerja nga shoqëria koncesionare e rehabilitimit, administrimit, mirëmbajtjes e aktivitetit të prodhimit të kripës, si dhe transferim i të gjitha aseteve të luajtshme e të paluajtshme, në përfundim të kontratës.

Aktualisht kjo kontratë është në fazën e operimit. Shoqëria koncesionare ka vënë në punë Fabrikën e përpunimit të kripës në Shkurt 2011. Tarifa koncesionare është paguar rregullisht për çdo vit financiar sipas afateve të parashikuara në kontratën e koncesionit.

Deri në fund të vitit 2021 sipas raportimit, janë realizuar reth 754.7 milionë Lekë investim. Nga ana e shoqërisë koncesionare kryhet procedura e kontrollit të parametrave fizikë të kripës për sigurimin e cilësisë së këtij produkti. Shoqëria koncesionare prodhon dy lloje kripërash si, kripë deti e larë dhe kripë deti e jodizuar, e imët dhe e kokrrizuar, e amballzuar në qeska 0.5 kg, 1 kg dhe 25 kg. Krahas kushteve klimaterike, të rëndësishme janë edhe kushtet teknike që konsistojnë në rritjen e gradacionit të liqenit nga 3.5 deri në 6 gradë Be’.

Gjatë kohëzgjatjes së kontratës ka patur disa përmbytje, veçanërisht në Shkurt të vitit 2015, ç’ka u shoqëruan me dëmtime në infraskukturën fizike (vaska, argjinatura) dhe dëmtime të bazës materiale. Përmbytje të ngjashme pati dhe në Nëntor-Dhjetor 2017. Për shkak të këtyre përmbytjeve, nga ana e shoqërisë koncesionare raportohen vit pas viti investime të reja nga e para për ndërtimin e argjinaturave, kanalizimeve dhe vaskave. Nga procesi teknologjik, realizohet prodhim kripë deti të papërpunuar në tre cilësi sipas standardit SSH 1437:2005, të cilësisë parë, dytë dhe të tretë. Shoqëria koncesionare eksporton kripë si për mirëmbajtje rruge edhe për ushqim në vendet e Ballkanit, Kosovë, Mal i Zi, Maqedoni, Serbi si dhe në Austri.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë në cilësinë e Autoritetit Kontraktues në këtë kontratë koncesionare ka evidentuar nevojën për ngritjen e një strukture të përhershme monitoruese ndërinstucionale, për kryerjen e monitorimit, ecurinë e zbatimit, si dhe verifikimit të përmbushjes së detyrimeve kontraktuale në tërësi (kushte teknike, atmosferike, klimaterike dhe mjedisore që ndikojnë në sasinë dhe cilësinë e kripës).

- **Autoriteti Kontraktues:** Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
- **SPV:** “Alb-Sale Vlora” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 1.4 miliardë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 15 Qershor 2009
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim

Ky proces u finalizua me ngritjen e Njësisë së Përhershme të Monitorimit me anë të Urdhrit të Ministrit “Për ngritjen dhe funksionimin e njësisë së përhershme të monitorimit me qëllim monitorimin e zbatimit të kontratës së koncesionit “Për dhënien me koncesion të aktivitetit të prodhimit të kripës në Nartë, Vlorë””.

#### ❖ Risqet

Në lidhje me risqet e kësaj kontrate koncesioni, risqet e parashikuara në kontratë dhe të alokuara tek koncesionari janë risku i ndërtimit, i operimit dhe performancës, risku i transferimit të asetëve dhe risku i disponueshmërisë. Ndërkohë risqet e alokuara autoritetit kontraktues janë risku material nga vendimet politike, risku i ndryshimeve ligjore dhe risku i lejeve dhe licencave, risku i inflacionit dhe risku i normës së interesit. Risqet e ndara mes dy palëve janë risku i rinegocimit, risku i ndërprerjes së kontratës dhe forca madhore.

### 🌱 Sektori i Bujqësisë

#### 64. Kontratë koncesioni/PPP “Për dhënien me koncesion të sipërfaqes deri në 1000 ha, në komunat Synej, Luz i Vogël, Kryevidh dhe Gosë, Kavajë për kultivimin e ullirit”<sup>76</sup>

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është projektimi, ndërtimi, vënia në shfrytëzim, administrimi, mirëmbajtja e masivit të ullishtes, tregtimi i ullirit, si dhe transferimi i masivit të ullirit në përfundim të kontratës nga shoqëria koncesionare tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të parashikuara në këtë Kontratë.

Referuar raportimeve dhe konfirmimit të Autoritetit Kontraktues, aktualisht kjo kontratë koncesioni është në fazë hibride, pasi shoqëria koncesionare ka mbjellë një pjesë të sipërfaqes, ndërkohë pjesa tjetër e investimit është ngadalësuar për shkak të problematikave me pronësinë e tokës. Sipas raportimeve të Autoritetit Kontraktues, është kryer dorëzimi i sipërfaqes sipas parashikimeve të kontratës së nënshkruar midis palëve, por koncesionari pretendon se nuk i është dorëzuar sipërfaqja e parashikuar, duke e penguar kështu në ecurinë e projektit. Disa sipërfaqe janë në proces gjyqësor dhe pretendohen nga palë të treta, ndërkohë brenda një parcelë është dhënë një leje shfrytëzimi gurore, e cila ka shkaktuar probleme të mëdha në zhvillimin normal të aktivitetit, duke prishur strukturën e tokës.

- **Autoriteti Kontraktues:** Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
- **SPV:** “Agrotal-1” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 1.9 miliardë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 07 Janar 2009
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 99 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim dhe ndërtim
- **Forma:** Propozim i Pakërkuar

Nga ana e shoqërisë koncesionare janë realizuar investime që konsistojnë në hapjen dhe mirëmbajtjen e rrugëve që të çojnë në parcelë dhe rrugëve të brendshme; janë kryer rrethimet e parcelave; janë kryer investime të rëndësishme në mbjelljen e parcelave me ullinj si dhe janë vendosur në pjesën më të madhe impianti i ujitjes me pika dhe me kanale kulluese. Për vitin 2021, sipas raportimit nga Autoriteti Kontraktues subjekti nuk parashikon të kryejë investime të reja, dhe të operojë pa u zgjidhur me pare problematikat gjyqësore me pronësinë e tokës.

#### ❖ Risqet

Në lidhje me risqet e kontratës, sipas raportimeve të Autoritetit Kontraktues, risku i ndërtimit, risku operacional, risku i përfundimit para kohe të kontratës i janë alokuar koncesionarit dhe gjithashtu janë vlerësuar me risk të lartë për të ndodhur. Gjithashtu risku ligjor (fakti që disa parcela janë në proces gjyqësor dhe pretendohen nga palë të treta, mund të vendosin në rrezik aktivitetin e koncesionit dhe arritjen e rezultateve të parashikuara). Kjo situatë përbën problematikë pasi njëra nga këto parcela është pretenduar për tu transformuar në rezervuar uji,

<sup>76</sup> Informacion i hartuar në bazën e raportimeve të Autoritetit Kontraktues

dhe nëse kjo ndodh 50% e parcelave të koncesionit do të mbeten pa ujë dhe kjo do kishte impakt negativ në realizimin e objektivit. Një tjetër risk është risku atmosferik, i cili ndikon procesin bujqësor dhe ecurinë e kontratës së koncesionit.



## Sektori i Punëve të Brendshme

### 65. Kontratë koncesioni/PPP “Për prodhimin dhe shpërndarjen e kartave të identitetit dhe pasaportave biometrike”<sup>77</sup>

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është sigurimi i shërbimit të hartimit, përcaktimit, zhvillimit, zbatimit dhe operimit të Sistemit për furnizimin me Dokumenta identifikimi të shtetasve dhe/ose rezidentëve të Republikës së Shqipërisë.

Referuar raportimeve dhe konfirmimit të Autoritetit Kontraktues, aktualisht kjo kontratë koncesioni është në fazë operimi dhe sistemi i dokumentave të identitetit është një sistem i sigurt dhe i teknologjisë së fundit në gjeneratën biometrike dhe bazohet në sistemin e automatizuar të identifikimit biometrik Morpho duke lënë pas sistemin e bazuar në procesin njerëzor manual dhe në letër. Gjithashtu, dokumentat biometrikë shqiptarë janë dokumenta të sigurt dhe në përputhje me standartet ICAO dhe të BE-së.

- **Autoriteti Kontraktues:** Ministria e Brendshme
- **SPV:** “Aleat” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 25 milionë Euro
- **Data e fillimit të kontratës:** 15 Maj 2013
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 10 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i Pakërkuar

Autoriteti ka raportuar që në periudhën e aplikimit masiv u instaluan mbi 505 poste aplikimi dhe shpërndarje në 356 zyra aplikimi online me qendrën e personalizimit në të gjithë Shqipërinë. Në vazhdim janë funksionale dhe online me qendrën e personalizimit afro 200 zyra aplikimi dhe shpërndarje. Aplikimi për dokumente identiteti është online dhe ka burim të vetëm të të dhënave të shtetasve (përbërësve të gjendjes civile) RKGJC, i cili konsultohet nëpërmjet ndërfaqes së aplikimit nga sistemi i dokumenteve të identitetit.

Autorizimi dhe certifikimi i aplikimeve për dokumente identiteti (letërnjoftimi dhe pasaportat biometrike) realizohet nga punonjësi i shërbimit të gjendjes civile dhe nga strukturat përkatëse të komisariteve të policisë. Infrastruktura e sistemit garanton identifikimin, regjistrimin, kontrollin (me bazën e të dhënave të Personave në kërkim, me databazat përkatëse të sistemit të dokumenteve të identitetit), prodhimin dhe lëshimin e sigurt dhe sipas standarteve të kërkuara të këtyre dokumenteve.

Referuar raportimeve të Autoritetit Kontraktues në lidhje me përfitueshmërinë e kësaj kontrate, përveç taksave (tatim-fitim), TVSH, punësimi, etj) një përfitim të veçantë për shtetin shqiptar është tarifa e koncesionit (5% e shitjeve), e kombinuar edhe me kompensimin nga kursi i këmbimit, vlera totale për vitin 2021 përbëhet nga:

Tarifa e koncesionit (5% e shitjeve)	318,458,597 Lek
Kompensimi nga kursi i këmbimit aktual (7,54% e shitjeve)	492,620,073 Lek

Në lidhje me treguesit e performancës sipas raportimit të Autoritetit Kontraktues, për gjithë vitin 2021 janë prodhuar dhe shpërndarë 554,457 Karta ID dhe 575,529 Pasaporta Biometrike.

<sup>77</sup> Informacion i hartuar në bazën e raportimeve të Autoritetit Kontraktues

## ❖ Risqet

Në lidhje me risqet e kontratës, sipas raportimeve të Autoritetit Kontraktues, risku i ndërtimit, risku operacional risku i përfundimit para kohe të kontratës, janë vlerësuar si risqe me probabilitet të ulët për tu materializuar ndërsa për riskun financiar AK është shprehur se ka probabilitet të ulët për tu materializuar dhe se në bazë të kontratës Autoriteti do të kompensojë koncesionarin në rastet kur kusi i këmbimit ALL/EUR rritet mbi 147 ALL/EUR. Në të kundërt, për kursin e këmbimit nën 133 ALL/EUR Koncesionari do të rimbursojë Autoritetin. Në të dyja rastet rimbursimi kryhet sipas një formule të përcaktuar në kontratën e amenduar të vitit 2013. Risku i veprimeve negative të qeverisë (MAGA) dhe risku i ndryshimit të ligjit, risku i rinegocimit dhe risqe të tjera janë vlerësuar si risqe të mesme për tu materializuar nga ana e Autoritetit Kontraktues. Risku i forcës madhore është vlerësuar i lartë dhe Autoriteti ka argumentuar që në marrëveshje me koncesionerin mund t'i rimbursojë kostot e Forcës Madhore Koncesionerit në monedhë, apo të kompensojë koncesionerin për të tilla kosto me anë të shtrirjes së përshtatshme të Periudhës së Koncesionit.

### 3. Lista e Kontratave të Koncesionit për vitin 2021

Tabela e mëposhtme paraqet numrin e koncesioneve në total të miratuara deri në fund të vitit 2021, sipas Regjistrit të Koncesioneve të disponueshme nga Agjencia e Trajtimit të Koncesioneve.

❖ *Tabela 57: Kontrata të Koncesionit/PPP të nënshkruara deri në fund të vitit 2021.*

Objekti i Kontratës	Vlera e investimit Lekë
Per dhenien me koncesion/PPP të portit turistik dhe të shërbimeve Marina Limion	1,374,984,000
Për përmirësimin e infrastrukturës Arsimore në Bashkinë e Tiranës për katër objektet arsimore në zonën Tirana 4	1,738,456,242
Per projektimin, ndertimin dhe mirembajtjen e segmentit rrugor Milot-Balldren	17,737,025,000
Per projektimin, ndertimin dhe mirembajtjen e rruges Porti i Jahteve-Bypass Orikum-Dukat (Ura e Shën Lizës)	5,817,298,748
Shërbimi i kontrollit ligjor të instrumentave mates, nepermjet instrumentave shperndares të karburantit dhe gazit të lengshem	70,000,000
Për rehabilitimin, operimin transferimin e Aeroportit të Kukësit	987,925,036
Për ofrimin e shërbimit laboratorik të spitaleve universitare, rajonale dhe atyre bashkiake të Sarandës dhe Lushnjës.	1,315,310,000
Për përmirësimin e infrastrukturës Arsimore në Bashkinë Tiranë	1,600,861,766
Për dhënien me koncesion të shërbimit të pastrimit, grumbullimit, transportimit dhe seleksionimit të mbetjeve urbane për Qytetin Kamëz.	1,350,000,000
Për ndertimin, operimin dhe transferimin e Hec Kukur	304,603,895
Për ndertimin, operimin dhe transferimin e Hidrocentralit Bushtrica 3	559,309,182
Për përmirësimin, ndertimin, operimin dhe mirëmbajtjen e Rrugës së Arbrit	26,504,000,000
Për ndërtimin e Hidrocentraleve mbi Lumin Shalë	11,239,204,263
Për ndertimin e Hidrocentralit Veleshicë	927,928,003
Për ndërtimin e Hidrocentralit Kalivaç	16,913,853,000
Për paketën e shërbimeve të kontrollit mjekësor bazë për grupmoshat 40-65 vjeç	172,020,000
Për dhënien me koncesion të disa shërbimeve detare	238,374,000
Per ndertim landfillit inceneratorit dhe rehabilitimin e venddepozimeve ekzistuese Tirane dhe prodhimin e energjise elektrike.	17,121,152,055
Ndërtimi, operimi dhe transferimi Hidrocentraleve mbi Lumin Devoll, Infrastruktura zëvendësuese	7,000,000,000
Projektimi, financimi ndertimin, operimi, mirembajtja dhe transferimi i Hidrocentralit ne Lumin Devoll	130,000,000,000
Ndertimin, operimin dhe transferimin e Hidrocentralit Stojan	124,333,623
Ndërtimin, operimin, transferimin e Hidrocentralit Guri i Bardhë	800,908,292
Për dhënien me koncesion të prodhimit të kripës Nartë, Vlorë	1,400,000,000
Për Dhënien me Koncesion të Rregjistrit të Barreve Siguruese	35,691,880
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Lunik	786,900,000
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Bushtrica 1	506,147,190
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve mbi lumin Shushicë	2,433,789,054

Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Grabovë 2	1,486,571,351
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Shutri 1, Shutri 2	136,783,700
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve të Lusës	621,368,362
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Përroin Sheja e Librazhdit	492,775,800
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Malla	176,321,017
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Blaç	44,000,032
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Malind	294,085,200
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Selca 2, Mesmal	269,981,177
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Batra 1, Batra 2, Batra 3	369,786,250
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Zalli i Qarishtes	5,273,943,244
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Truen	192,560,000
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Gojan, Gjogjan, Peshqesh, Ura e Fanit, Fangu	16,322,955,740
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Zall Xhuxhe 1, Zhall Xhuxhe 2	85,780,000
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Sekë	1,177,887,502
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve mbi lumin Gostimë, Egnatia Shushicë	7,806,058,026
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Stavec	870,315,194
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Rapun 1, Rapun 2	749,448,400
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Darsi 1, Darsi 2, Darsi 3, Darsi 4	1,230,440,516
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve ne lumin e Shalës	18,915,950,757
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Valbona	274,205,000
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve në Rrjedhën e lumit Shkumbin, Qukës	6,249,092,892
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve mbi përroin Zalli i Lunikut Librazhd	1,702,149,000
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Topçias	128,221,000
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Gjoni, Blishta, Klosi, Domi, Luçi, Shoshaj, Zenishti, Burreli	4,069,596,314
Ndërtim, operim, transferim e 5 Hidrocentraleve në rrjedhën e lumit Shkumbin	847,000,000
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve mbi lumin Valbonë rrethi Tropojë.	7,327,423,467
Për ndërtimin e administrimin e Impjantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë	3,727,189,322
Për ndërtimin, operim dhe transferim të Hidrocentraleve Veleshica 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sllove dhe Bjeshke	3,254,323,134
Për ndërtimin operimin dhe transferimin e Hidrocentralit Peshku	188,055,946
Ndërtim, shfrytëzim dhe transferim të Hidrocentraleve Lura 1, 2 dhe 3	1,300,177,500
Ndërtimin, operimin dhe transferimin e Hidrocentraleve Kaskada e Luses	743,776,400
Ndërtim, operim dhe transferim të Hidrocentraleve në Kaskadën e Osunit	32,377,517,340
Ndërtim, operim dhe transferim Hec Holta Kabash dhe Holta Porocan	500,000,000

Ndërtim, operim dhe transferim i Hidrocentralit Dragobia	2,404,858,492
Ndërtimin, operimin dhe transferimin e Hidrocentralit Begaj	2,794,366,000
Ndërtimin, pronësinë, shfrytëzimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e Hidrocentralit të ri në Ashta	19,520,000,000
Ndërtimi, përmirësimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e Autostradës Milot-Morinë	5,348,534,084
Prodhimi dhe shpërndarja e kartave të identitetit dhe pasaportave elektronike.	-
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Cangonj	62,650,250
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Iballe 1, 2, Sapaç 1, 2, Berisha dhe Liqeni, Rrethi Pukë	1,572,169,360
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Arrez 1, Arrez 2, Arrez 3 dhe Arrez 4	295,860,000
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Kasollet e Selcës	526,318,254
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Steblevë	159,680,320
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Suha 2	360,000,000
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Bënçë dhe Tepelenë	675,221,200
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Meshanik dhe Guvë	216,152,500
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Çaje, Reke, Livadhe, Shkinak, Lapaj 2, Bushtrica 1, Bushtrica 2 dhe Bushtrica 3	3,673,402,000
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve në Pellgun Ujëmbledhës të Zallit të Bulqizes/Vajkal- Rrethi Bulqize	587,563,575
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Myhejani 1, Myhejani 2, Myhejani 3	577,625,340
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Backa 1, Backa 2, Backa A, Backa B, Backa C	1,156,808,769
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Lefter 1, Lefter 2A, Lefter 2B, Lefter 3 (Zgjidhur me marrëveshjen me nr 2357 Rep nr 1173/3 Kol datë 06.11.2018)	208,659,212
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Ballenjë	138,314,960
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Kaçinar	315,219,168
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Lumzi	1,725,593,333
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Plepi, në Përroin e Plepit, Komuna Okshtun, Rrethi Diber	86,818,382
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Vendresh, në Pellgun ujëmbledhës Përroi Vendreshes, Komuna Vendresh, Rrethi Skrapar	37,250,000
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve mbi Lumin Gjader	1,592,690,975
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Kaskada e Hec-eve të Hotolishtit	567,859,875
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Dobrenje-Tomorrice, në Përroin e Hijes, Skrapar	106,780,000
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Potam	291,900,000
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Guri I Kuq 1/1 dhe Guri I Kuq 1/2	136,963,790
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Denas	936,000,000
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Vokopola 1, Vokopola 2 dhe Vokopola 3	497,257,690
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Shengjon, Komuna Fan, Rrethi Mirditë	101,242,260
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Skatinë	129,541,704
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Shkopet 2 dhe Shkopet 3	2,273,383,994

Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Bregu i Madh	128,136,000
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Gavran1 dhe Gavran	164,333,245
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Bershi-Klos	250,548,894
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Shengjun	349,864,502
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Bigas dhe Veleshnje	42,420,000
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Nishan	212,520,000
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Quku 1 dhe Quku 2	150,894,676
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Shutri	139,666,667
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Vernik 1, Vernik 2, Vernik 3 dhe Vernik 4	971,365,040
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Lajthia, Kolesjan, Domaj	123,761,020
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Kryezi 3, Kryezi 4 dhe Kryezi 5	131,064,360
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Shpella Poshtë II dhe Shpella Poshtë III	144,560,000
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentralit Tuçep 2	166,000,000
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentraleve mbi Lumin Curraj, Rrethi Tropojë	13,728,387,330
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentralit Suha-1	3,181,563,000
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentralit Spathare	80,070,750
Ndërtim, operim, trenasferim i hidrocentralit Labinot Fushë	347,706,122
Ndërtim, operim dhe transferim, i Hidrocentraleve, Prishta1, Prishta 2,	329,256,843
Ndërtimin, operimin dhe transferimin e Hidrocentraleve në Pellgun Ujëmbledhës të Shmilit dhe Zallit të Gjurait, Rrethi Librazhd	1,165,964,018
Ndërtimin, operimin dhe transferimin e Hidrocentralit Lingjaca	149,524,860
Ndërtimin, operimin dhe transferimin e Hidrocentraleve Gjuraj, Kashec, Ragam dhe Lepurushe	780,000,000
Ndërtimin, operimin dhe transferimin e Hidrocentraleve, Cemerica 1, Cemerica 2 dhe Cemerica 3	300,673,715
Ndërtimin, operimin dhe transferimin e Hidrocentralit Egnatia	321,956,600
Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentraleve VRANISHT, STROPAN, GRAPSH-ZICISHT dhe HOCISHT	92,548,781
Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentralit VILIQ	199,260,305
Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentralit KALIVAR	465,326,140
Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentralit ARSTI	225,125,130
Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentralit QYTEZË	27,700,000
Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentraleve mbi Përroin Ujëmbledhës të Përroit të Zhejës	61,916,210
Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentraleve mbi Lumin SETA	1,400,805,550
Ndërtim, operim dhe transferim I hidrocentraleve FLETI 1, FLETI 2, FLETI A dhe FLETI B	815,963,996
Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentralit RUNJA	351,244,805
Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentraleve GERMANI 1, 2, 3, 4 dhe 5	348,238,001

Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentraleve PRELLE 1 dhe PRELLE 2	1,512,585,536
Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentralit LLËNGË	252,559,542
Ndërtim, operim dhe transferim e hidrocentraleve SHEBA 1, SHEBA 2, SHEBA 3 dhe SHEBA 4	416,000,000
Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentraleve të Lashkizës	322,691,040
Ndërtim, operim dhe transferimin e hidrocentraleve ZAJE, TUJAN, XHAFERAJ, KOLLOVOZ, NOVOSEJË, MËSHTEKËN	223,087,239
Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentraleve RAPUN 3, RAPUN 3A dhe RAPUN 4	790,361,250
Rehabilitimin, operimin dhe transferimin e hidrocentralit DOMAJ, Has	12,369,610
Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentraleve mbi Lumin Kardhiq	1,041,453,039
Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentraleve TREBINJA 1, TREBINJA 2, POTGOZHAN, KALIVAÇ dhe DUNICE	175,585,602
Ndërtim, operim dhe transferimin e hidrocentralit ZEREC	120,311,959
Ndërtim, operim dhe transferim i hidrocentraleve ARRËZ, SHËNDELLI, SOTIRE, PODE, MESARE, URA, RAJAN 2, RADON, DEDOVE, PESHTAN, OSNATI DHE GRADISHT	837,404,386
Ndërtim, operim dhe transferim i hidrocentraleve KUKUR 1, 2, 3, 4 dhe 5	4,547,551,449
Ndërtimi operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Sotirë, Sotirë 2	144,554,509
Ndërtimi operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Gur Shpat1, Gur Shpat 2	176,738,773
Ndërtimi operimi dhe transferimi i hidrocentralit Mollaj	79,700,000
Ndërtimi operimi dhe transferimi i hidrocentralit Lapaj	1,453,500,000
Ndërtimi operimi mirëmbajtja dhe transferimi i hidrocentraleve të kaskadës së lumit Dardhë.	907,956,000
Ndërtimi operimi mirëmbajtja dhe transferimi i hidrocentralit Lena 1, Lena 2, Lena 2-A	311,332,059
Ndërtimi operimi mirëmbajtja dhe transferimi i hidrocentraleve Lenie, Shalës, Strelcë	354,282,240
Ndërtimi operimi mirëmbajtja dhe transferimi i hidrocentralit Picar 1	35,455,750
Ndërtimi operimi mirëmbajtja dhe transferimi i hidrocentralit Qafëzezë	51,955,070
Ndërtimi operimi mirëmbajtja dhe transferimi i hidrocentralit Verbë - Selcë.	285,214,050
Ndërtimi operimi mirëmbajtja dhe transferim të hidrocentraleve Murdhar 1 dhe Murdhar 2	501,411,750
"Dhënie me Koncesion/Partneritet Publik Privat të Shërbimit të Sistemit dhe Menaxhimit të Parkimit në Qytetin e Vlorës	-
Ndërtimi, Operimi, Transferim i parkimit nëntokësor në parkun "Rinia", Tiranë	1,937,932,800
Ndërtim, Operim, Transferim i hidrocentralit Poçem	14,134,724,113
Kontratë Koncesioni për kultivimin e ullirit deri në 1000 ha, Kavajë	1,906,500,000
Menaxhimi dhe zhvillimi teknologjik i prodhimit të fidanëve pyjor/arror në Fidanishten Shtetërore të Cërrikut, Elbasan	49,660,000
Ndërtimi dhe administrimi i impiantit të përpunimit të mbetjeve urbane të qarkut Elbasan	3,028,104,000
Shfrytëzimi i Burimit ujor "Sasaj, Bunec", Sarandë	503,712,646
Ndërtim, Shfrytëzim dhe Transferim në pronësi të shtetit, të Portit të Jahteve Shëngjin	730,338,000
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Nishova 1, 2	986,526,398
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Vlushë	1,718,835,000

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Përroi i Trebishit, Bulqizë	209,336,441
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Çekrezë 1, 2	123,858,465
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Radovë	188,000,000
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Hurdhasi 1, 2, 3	200,000,000
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Stravaj	503,529,364
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Shutinë	115,000,000
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Kacni	133,121,000
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Strelca 1, Strelca 2, Strelca 3	1,084,000,000
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Progonat, Lekdush - Bënçë e Sipërme (Zgjidhur më 02.03.2018).	929,146,830
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Peqin	521,573,382
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Nicë	49,800,000
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Vërtop	283,950,430
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Shtika 1,2,3,4	87,570,000
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Koxheraj	102,963,375
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Perrollaj	51,434,808
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Driza	151,000,000
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Lumi Zalli i Okshtunit	4,443,351,400
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Qarr Kaltanaj	273,892,660
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Lumi Treskës	656,545,309
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Kozel, Helmes 1 dhe Helmes 2	108,000,000
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Ujanik 2	134,550,000
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Bisak	50,617,908
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Bistrica 3 dhe 4	756,400,000
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Lengarica 1 dhe 2	1,980,904,000
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Gostivisht, Langarica3, Ura e Dashit	309,815,533
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Ostren i Vogël	46,870,792
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Shemri dhe Mguille	69,026,908
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Kryezi dhe Kryezi i Epërm	50,419,481
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Sllabinjë	1,290,117,487
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Martanesh	857,861,985
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Belesova 1 dhe 2	46,315,030
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Borje, Oreshkë, Cernalevë, Cernalevë 1	830,097,322
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit koka 1	392,862,289

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Klos	96,422,100
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Bishnica 1 dhe 2	250,000,000
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Pobreg	995,034,550
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Selishtë	120,000,000
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Orgjost i Ri; Bele 1, 2; Topojan 1,2	3,565,744,707
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Dobjot i Madh, Arrëz, Miras, Menkulas, Bracen, Kuç.	124,254,000
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Liqenet, Maja e Madhe, Zanore, Dragostunjë, Frari, Hotolisht, Ura	424,080,723
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Zerec 1,2	199,921,096
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Gomsiqe 1,2,3,4 (Zgjidhur me marrëveshjen me nr 242 Rep, nr 1186/1 Kol datë 16.11.2018)	2,149,411,466
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Thanë, Mollas	1,042,888,000
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Kabash 1 dhe 2	671,000,000
Infrastruktura Hekurudhore Fier-Ballsh, Fier-Vlorë	2,431,918,164
Projektim, financim, rehabilitim, testim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje të Qendrave të Kontrollit Teknik të mjeteve.	561,003,000
Menaxhimi, Operimi, Mirëmbajtja, Përmirësimi teknik dhe Adaptimi i terminalit të trageteve dhe krocerave Durrës.	581,387,190
Kryerja e shërbimit të rimorkimit të anijeve, Shërbimi i Transportit, Transportimi i Ekuipazheve të anijeve, Operacionet e ngarkim-shkarkimit.	1,200,000,000
Operimi, Ndërtimi, Mirëmbajtja, Përmirësimi Teknik dhe Adaptimi i Terminalit Lindor Durrës.	2,069,371,737
Ndërtimi, Shfrytëzimi dhe Transferimi të portit të tipit MBM, Porto Romano, Durrës	1,280,814,000
Financimi, Projektimi, Ndërtimi, Vënia në Punë, Administrimi, Mirëmbajtja dhe Transferimi e Hidrocentraleve "Shkallë", "Cerrujë", "Plesha", "Bejni1", "Bejni2", "Klos".	1,465,039,743
Rehabilitimi, Operimi dhe Transferimi i Hidrocentralit "Labinot-Mal"	12,500,000
Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Fterre dhe Fterre 1.	650,565,750
Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Tervol	325,800,167
Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Faqekuq 1 dhe 2	587,975,273
Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Dishnicë	15,300,000
Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Lubonjë	39,000,000
Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Çarshovë	83,500,000
Shërbimi i Hemodializës	1,177,420,000
Shërbimi i markimit dhe monitorimit të karburanteve	444,939,000
Financimi, ngritja dhe operimi i shërbimit të skanimi të konteinerve e automjeteve të tjera në Republikën e Shqipërisë.	2,836,560,000
Krijimi dhe funksionimi i sistemit të kontrollit të pullave fiskale.	1,263,507,600
Ndërtimi, Operimi dhe Transferimi i Aeroportit "Nënë Tereza"	9,114,560,000
Ndërtimi, shfrytëzimi i portit të jahteve në qytetit e Durrësit. (BOT)	1,356,144,750
Ndërtimi i portit të jahteve në Kalanë e Turrës, Komuna Synej, Kavajë.	4,450,000,000
Menaxhimi, operimi, mirëmbajtja dhe përmirësimi teknik i terminalit të konteinerve në portin e Durrësit	3,191,825,000

Ofrimi i setit të personalizuar të instrumenteve kirurgjikale, material mjekësor steril njëpërdorimësh në sallat kirurgjikale, trajtimi i mbetjeve biologjike dhe dezinfektimi i sallave kirurgjikale.	1,503,282,620
Dhënia me Koncesion/PPP të një porti turistik në qytetin e Vlorës "Marina Vlorë"	2,822,865,665
Për projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e Aeroportit ndërkombetar të Vlorës	1,374,984,000

## Aneks 1 - Koncepte dhe Kuadri Ligjor

### 1.1 Koncepti i Koncesioneve dhe Partneritetit Publik Privat

Koncesioni është një formë partneriteti midis palës publike dhe asaj private në ofrimin e punëve dhe shërbimeve publike.

Sipas Ligjit nr.125/2013 “Për koncesionet/PPP në R.Sh” i ndryshuar, përkufizimi i koncesioneve jepet në këtë mënyrë:

*“Koncesioni është një marrëveshje me interes financiar, e lidhur me shkrim ndërmjet autoritetit kontraktues dhe një ose më shumë operatorëve ekonomikë, objekti i së cilës është kryerja e punimeve, ku shpërblimi për punimet/shërbimet që duhet të kryhen përbëhet nga e drejta për të shfrytëzuar veprat/shërbimet që janë objekt i kontratës ose nga kjo e drejtë së bashku me pagesën”,*

ndërsa Partneriteti Publik Privat përcaktohet si:

*“...Kontratë e punëve publike apo kontratë e shërbimit publik, që plotëson kushtet, të cilat e përcaktojnë atë si një partneritet publik privat, sikurse është rregulluar në këtë ligj dhe që nënshkruhet ndërmjet autoritetit kontraktues në njërën anë dhe operatorit ekonomik të zgjedhur si ofertuesi më i suksesshëm.”*

Për vlerësimin sistematik të implikimeve të mundshme makrofiskale nga projektet me koncesion/PPP, është zhvilluar modeli PFRAM nga FMN dhe Grupi i Bankës Botërore. Ky model gjithashtu siguron një kornizë për identifikimin e risqeve fiskale të lidhura me një projekt PPP, vlerësimin e tyre dhe diskutimin e masave përkatëse zbutëse. Më poshtë është paraqitur një përmbledhje e risqeve kryesore që përfshihen tek matrica e risqeve sipas modelit PFRAM, si dhe merren parasysh në vlerësimin e analizës së risqeve për projektet që paraqiten për miratim në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë.

### **Risqet Kryesore të Kontratave Koncesionare/PPP**

*Risku i projektimit dhe ndërtimit:* Lidhet me situatat ku ndërtimi zgjat më shumë ose kushton më shumë se sa pritej, ose që cilësia e projektimit apo e ndërtimit nënkupton se aset nuk është i mjaftueshëm për të përmbushur kërkesat e projektit

*Risku i lejeve dhe licencave:* Kostot që mund të vijnë nga vonesat e marrjes apo dhënies së lejeve që lidhen me projektimin ndërtimin, operimin apo mirëmbajtjen e projektit.

*Risku i kërkesës:* Ky risk lidhet me situatat ku përdorimi i objektit/shërbimit është i ndryshëm nga sa pritej ose të ardhurat nuk janë aq sa priten.

*Risku i operimit dhe performancës:* Mosofrimi i punëve, shërbimeve apo veprave të koncesionit/PPP me cilësi, efikasitet dhe efikasitet.

*Risku Financiar:* Risk që lidhet me luhatjet në normën e interesit, normën e kursit të këmbimit, normën e inflacionit dhe kushtet e tjera financiare

*Forca Madhore:* Risqet që lidhen me ngjarjet përtej kontrollit të palëve në kontratë, të tilla si: fatkeqësitë natyrore, luftëra ose trazira civile, që ndikojnë mbi projektin.

*Risku material nga vendimet politike:* Kanë të bëjnë me riskun që lind si pasojë e vendimeve të dobëta politike të bërjes së procesit, stabiliteti qeveritar, kundërshtimi politik dhe shpronësimi.

*Risku i ndryshimeve ligjore:* Risku që një ndryshim në ligjin ose në rregullat e përgjithshme ndikon negativisht mbi projektin, të tilla si: ndryshimet në tatimet e përgjithshme të korporatave ose në rregullat që rregullojnë këmbimin e monedhës, ose riatdhesimin e fitimeve;

*Risku i rinegociimit:* Risk që lidhet me ndryshimet në kontratë që implikojnë kosto fiskale në buxhetin e shtetit.

*Risku transferimit të asetëve:* Risqet që lidhen me pronësinë e asetëve, duke përfshirë riskun që teknologjia vjetërohet ose, që vlera e asetëve në fund të kontratës është e ndryshme nga sa pritej si dhe riskun e transferimit të ndonjë detyrimi të marrë përsipër mbi asetin gjatë kohëzgjatjes së kontratës.

*Risku i ndërprerjes së kontratës:* Risk që rrjedh nga ndërprerja e kontratës dhe implikon kosto fiskale për buxhetin e shtetit.

Përsa i përket vendeve në zhvillim, koncesionet/PPP kanë një rëndësi të madhe në financimin e investimeve për ndërtimin e infrastrukturës publike, përcaktuese për rritjen dhe zhvillimin ekonomik të këtyre vendeve<sup>78</sup>. Përvoja aktuale shqiptare në përdorimin e projekteve koncesionare/PPP-ve ka ardhur duke u përmirësuar, megjithatë ka akoma nevojë për përmirësime dhe për sigurimin e një plani strategjik kombëtar për implementimin e këtyre projekteve.

Prandaj në këtë raport është synuar të jepet një pamje e përgjithshme e situatës aktuale të kontratave koncesionare/PPP aktive në vend, ku janë evidentuar të dhënat kryesore në lidhje me projektin, risqet që implikojnë, materializimin e tyre dhe impaktin që kanë pasur.

<sup>78</sup> OECD (2008), “Public-Private Partnerships: In Pursuit of Risk Sharing and Value for Money, Working Party on Regulatory Management and Reform”

## 1.2 Kuadri Ligjor i Koncesioneve/PPP në Republikën e Shqipërisë

Legjislacioni shqiptar fillimisht i ka trajtuar koncesionet me anë të ligjit nr.7973, datë 26.7.1995 “Për koncesionet dhe pjesëmarrjen e sektorit privat në shërbimet publike dhe infrastrukturë”, i cili më pas është zëvendësuar nga Ligji Nr. 9663, datë 18.12.2006, “Për Koncesionet”. Përgjatë viteve të fundit, bazuar edhe në praktikat e biznesit si edhe në përshtatje të legjislacionit dhe qasjes ndërkombëtare mbi koncesionet dhe partneritetin publik privat është miratuar një koncept më i gjerë i koncesioneve duke futur edhe përkufizimin e partneritetit publik privat, i përcaktuar tashmë edhe në dispozitat ligjore të ligjit aktual që rregullon këtë fushë, përkatësisht Ligji Nr. 125/2013, “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”,<sup>79</sup> i ndryshuar.

Veç ndryshimeve të mëparshme, ky ligj ka pësuar disa ndryshime nëpërmjet Ligjit Nr.50 datë 18.07.2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 125/2013 “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat” i botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 126 datë 13.09.2019.

### **Kuadri ligjor aktual i koncesioneve dhe PPP në R.Sh mbështetet kryesisht në legjislacionin e mëposhtëm:**

- Ligji nr. 50/2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin 125/013: Për Koncesionet dhe Partneritetin Publik Privat”, i ndryshuar.
- VKM nr. 575, datë 10.07.2013 “Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien me Koncesion/Partneritet Publik Privat”, i ndryshuar.

Në parashikimet e reja është përforcuar roli i Ministrisë përgjegjëse për financat nëpërmjet miratimit përfundimtar përpara nënshkrimit të draft-kontratës së negociuar, kontrollit të ecurisë dhe zbatimit të të gjitha kontratave koncesionare në Republikën e Shqipërisë, me qëllim monitorimin e vazhdueshëm të risqeve që mund t’i vijnë buxhetit të shtetit nga këto kontrata. Gjithashtu, në këto ndryshime është parashikuar se Autoritetet Kontraktuese i paraqesin sa herë që kërkohet, por jo më pak se tri herë në vit, Ministrit përgjegjës për financat, raporte të përmbledhura të monitorimit të zbatimit të kontratave të koncesionit/PPP me argumentet dhe shpjegimet përkatëse. Ministria përgjegjëse për Financat mund t’iu rekomandojë autoriteteve kontraktuese marrjen e masave për përmirësimin e performancës në ofrimin e shërbimeve dhe punëve publike, objekt i këtyre kontratave, si dhe për minimizimin apo eliminimin e risqeve të drejtpërdrejta e të tërthorta që ndikojnë në buxhetin e shtetit.

Legjislacioni mbi koncesionet dhe partneritetin publik privat, zbatohet së pari nga autoritetet kontraktuese, të cilat konsiderohen ato organe të cilave legjislacioni u jep kompetencën për të ndërmarrë dhe zbatuar procedura për dhënien e koncesioneve dhe partneriteteve publike private. Në bazë të kuadrit ligjor ekzistues, autoritetet kontraktuese konsiderohen ministritë e linjës të qeverisjes qendrore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore.

<sup>79</sup> ATRAKO (2019), “Manuali për Përdoruesit” URL: [http://www.atrako.gov.al/?page\\_id=973](http://www.atrako.gov.al/?page_id=973).
